



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име:	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад
Седиште:	Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност:	71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање
Матични број:	08761809
ПИБ:	102094162
ЈББК:	80995
Надлежни секретаријат:	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Нови Сад, јун 2020. године

САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	1
1.2 УПРАВЉАЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	1
1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	2
1.4 ЉУДСКИ РЕСУРСИ	4
1.5 ИМОВИНА.....	5
1.6 ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА.....	5
1.7 ФИНАНСИРАЊЕ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6
2. ПРОГРАМИ РАДОВА У 2019. ГОДИНИ.....	7
2.1 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	13
2.2 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД	16
2.3 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА.....	18
2.3.1 РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА.....	18
2.3.2 РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ	19
2.4 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА	19
2.4.1 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ.....	20
2.4.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА	21
2.5 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА	22
2.6 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ	23
2.6.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА	23
2.6.2 ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА.....	25
2.6.3 СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ – ПРОГРАМ АБУ ДАБИ ФОНД	26
2.7 ЗАШТИТА ВОДА.....	27
2.8 ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И КАТАСТАР ВОДНИХ ОБЈЕКТА	28
2.9 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА.....	30
2.10 УПРАВЉАЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА	32
2.10.1 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА	32
2.10.2 РИБАРСТВО.....	33
2.10.3 ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ	34
3. РАЗВОЈ	35
3.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА	35
3.2 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА СУФИНАНСИРАНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ ДОНАЦИЈА ЕУ ..	35
3.3 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ.....	37
4. ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ.....	39
4.1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ	39
4.2 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ ПРЕДУЗЕЋА	40
4.3. ОПШТИ ПОСЛОВИ.....	41
4.4. ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	43
4.4.1 ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	43
4.4.2 ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“	44
4.4.3 УПИС ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКТА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	44
5. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ	45
5.1 ПРИХОДИ	45
5.1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	46
5.1.2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	49
5.1.3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ	49
5.2 РАСХОДИ	51
5.2.1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	52
5.2.2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	52
5.2.3 ОСТАЛИ РАСХОДИ	53
5.2.4 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ.....	53
5.3 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ - ТРОШКОВИ И УЛАГАЊА	56
5.3.1 ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА И УКУПНА УЛАГАЊА У ОПРЕМУ, МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОСТЛА ДОБРА НЕОПХОДНА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ	56

5.3.2	УКУПНИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	57
5.4	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА.....	58
5.5	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	59
6.	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	64
7.	ЈАВНЕ НАБАВКЕ	65
8.	ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И ПРОТОКОЛ.....	69
8.1	ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ	69
8.2	ОДНОСИ С КОРИСНИЦИМА	70
9.	ПРИЛОЗИ	71

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП „Воде Војводине“) основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 7/2002 и 2/2010).

Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду, бр. I Фи. 2146/2002 од 11.06.2002. године, а преведено у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године.

Правни положај и статус ЈВП „Воде Војводине“ регулисан је Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019) и Статутом ЈВП „Воде Војводине“ од 10.01.2017. године, са изменом овог статута од 27.03.2019. године.

Аутономна покрајина Војводина је оснивач ЈВП „Воде Војводине“ са уделом у основном капиталу од 100%.

ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата на страни 3 Извештаја.

ЈВП „Воде Војводине“ има статус правног лица које обавља делатност од општег интереса, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈВП „Воде Војводине“ послује у форми јавног предузећа.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ је:

- Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- Уређење и коришћење вода;
- Заштита вода од загађивања.

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ према Уредби о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/2010) је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром делатности: 71.12.

ЈВП „Воде Војводине“ обавља и делатност шумарства и сече дрвећа, рибарства и аквакултуре, техничког одржавања и развоја државних водних путева на територији АП Војводине, инвеститорске послове, научна истраживања и развој, под условом да то не омета извршавање горе наведених делатности.

1.2 УПРАВЉАЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Органи управљања у ЈВП „Воде Војводине“ су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП „Воде Војводине“.

Чланове Надзорног одбора именovala је Покрајинска влада, у следећем саставу:

- Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја, именован је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;
- Члан – Андреј Константиновић, дипломирани инжењер пољопривреде (представник запослених), именован је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;
- Члан - Гордана Ћук, дипломирани економиста – мастер, именована је Решењем бр. 023-21/2017 од 22.03.2017. године.

Славко Врнџић, дипломирани инжењер грађевине, именован је за директора решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године.

Александар Николић, дипломирани инжењер грађевине, обавља од 01.07.2018. године послове Извршног директора за област технике, развоја и хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, по основу Анекса уговора о раду.

1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ У ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова.

Послове из своје делатности ЈВП „Воде Војводине“ обавља кроз рад организационих делова. Организациони делови су образовани према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Основни организациони делови ЈВП „Воде Војводине“ су сектори. У оквиру сектора образоване су службе и радне јединице, у оквиру служби одељења, а у оквиру радних јединица секције, као унутрашњи организациони делови.


Ради организовања и руковођења процесом рада у организационим деловима ЈВП „Воде Војводине“, утврђују се следећи руководећи послови:

1. Извршни директор за област технике, развоја и хидросистема Дунав–Тиса–Дунав;
2. Помоћник директора за техничке послове;
3. Помоћник директора за развој;
4. Помоћник директора за хидросистем Дунав-Тиса-Дунав;
5. Помоћник директора за економске и финансијске послове;
6. Помоћник директора за правне и опште послове;
7. Руководилац службе;
8. Шеф радне јединице;
9. Руководилац одељења.

Руководећим пословима сматрају се и послови:

1. Саветника директора;
2. Извршног координатора у сектору.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

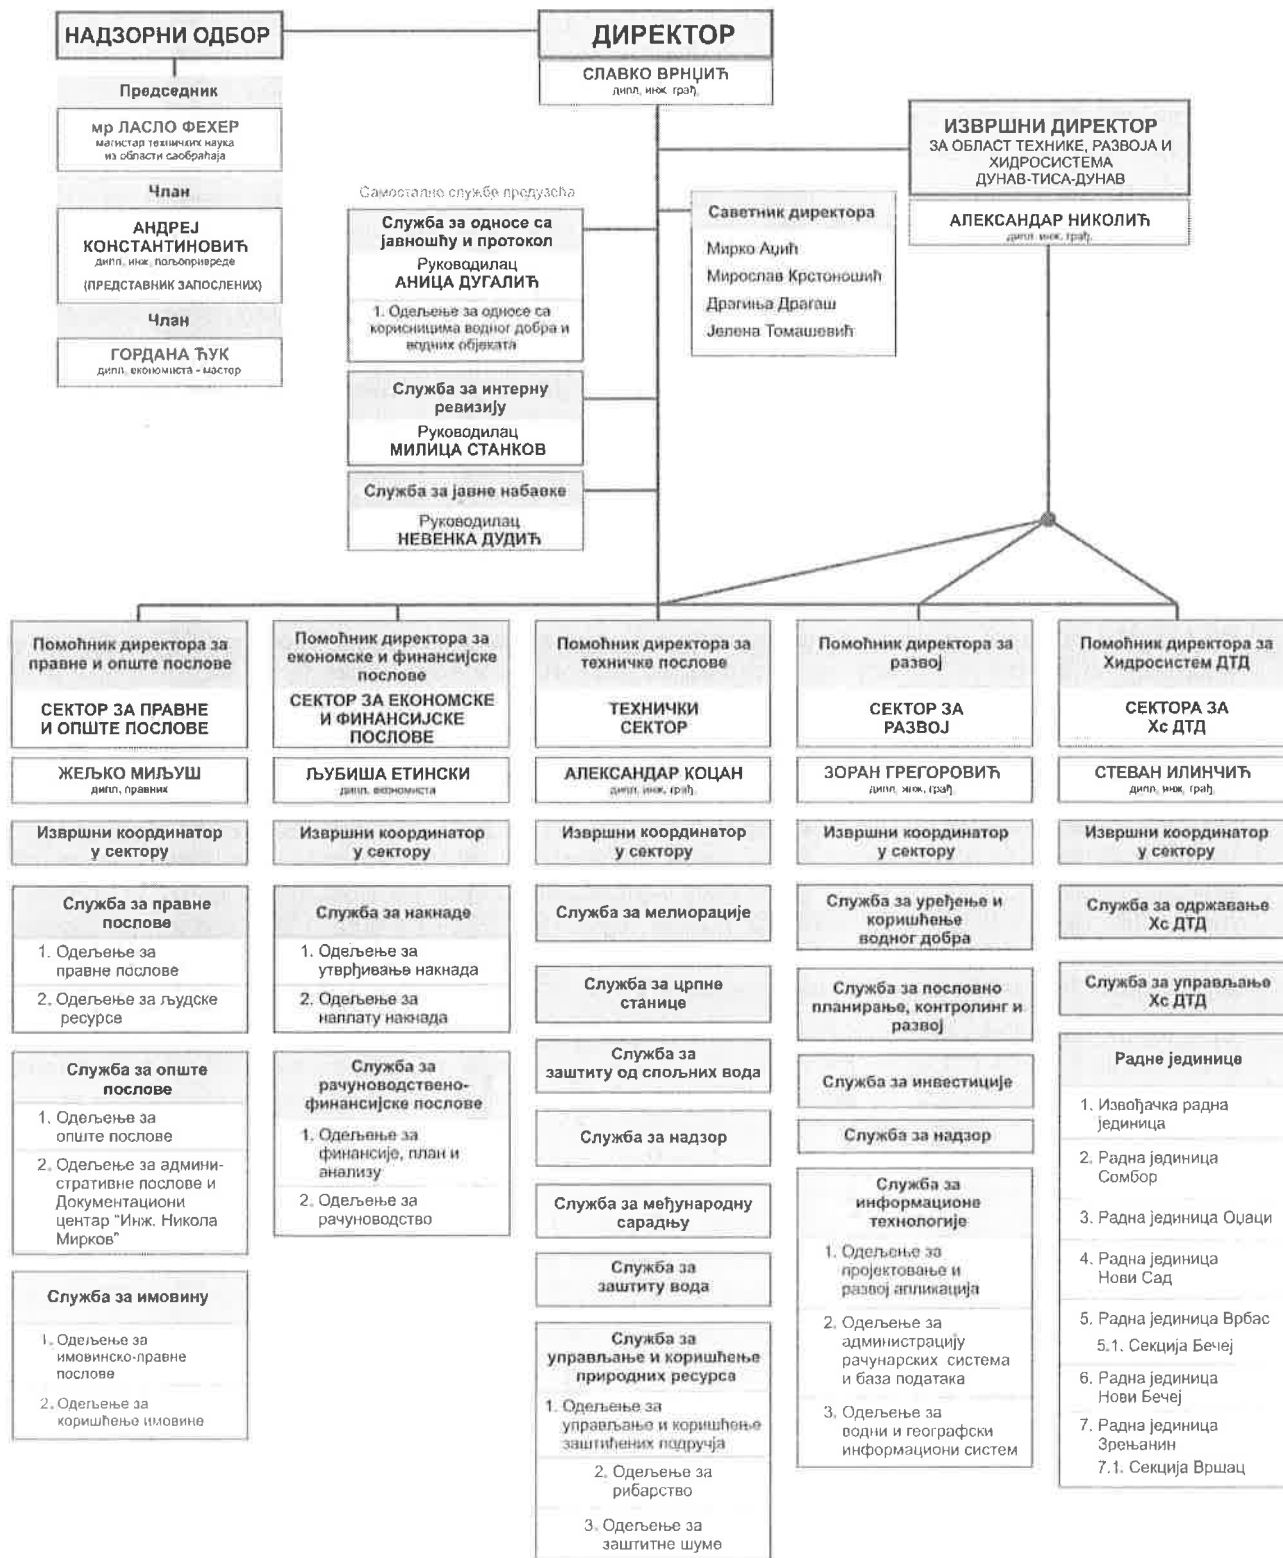

Слика бр. 1: Организациона шема ЈВП „Воде Војводине“

1.4 ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 60/2018) и Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28, 56/2018, 7/2019, 19/2019 и 30/2019).

На дан 01.01.2019. године укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ износио је 473, што је за 13 мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2019. годину.

Од укупног броја запослених на дан 01.01.2019. године било је 438 запослених на неодређено време, а 35 запослених на одређено време.

Од укупно 438 запослених на неодређено време, на дан 01.01.2019. године 436 је било у активном радном односу, а 2 запослена у статусу мировања (по основу обављања јавне функције).

Стањем од 35 запослених на одређено време на дан 01.01.2019. године обухваћени су директор ЈВП „Воде Војводине“ (на ову функцију именован решењем Покрајинске владе бр. 023-36/2017 од 14.09.2017. године), 30 запослених по основу привремено повећаног обима посла и 2 запослена, као замена до повратка 2 привремено одсутна запослена.

Током новембра 2019. године, Покрајинском уредбом о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему АПВ за 2017. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 49/2019 од 20.11.2019. године) за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен је максималан број од 447 запослених на неодређено време (у односу на дотадашње дозвољених 446), чиме је уједно повећан и укупан број запослених са првобитно планираних 486, на 487 запослених.

На дан 31.12.2019. године укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ износио је 484, што је за 3 мање у односу на укупно планираних и одобрених 487 запослених за 2019. годину.

Са 447 запослених на неодређено време, на дан 31.12.2019. године ЈВП „Воде Војводине“ је на нивоу максимално дозвољеног броја ових запослених, који је утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2017, 10/28 56/2018, 7/2019, 19/2019, 30/2019 и 49/2019). Наведеним бројем ових запослених обухваћена су и 4 запослена у мировању радног односа (3 по основу обављања јавне функције, а 1 по основу неплаћеног одсуства).

Број од 37 запослених на одређено време на дан 31.12.2019. године, за 3 је мањи од дозвољеног максималног броја (40) ових запослених, који је планиран и одобрен за 2019. годину. Наведени број обухвата директора ЈВП „Воде Војводине“, 35 запослених по основу привремено повећаног обима посла, као и 1 запосленог који је замена до повратка на рад привремено одсутне запослене (на породилском одсуству и одсуству ради неге детета). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), на замену привремено одсутног запосленог, не односи се ограничење у погледу укупног броја запослених на одређено време (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 447 запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У периоду од 01.01-31.12.2019. године радни однос је престао за укупно 38 запослених, од чега је 17 запослених радило на неодређено време (10 отишло у пензију, 6 споразумно раскинуло радни однос и 1 преминуо), а 21 запослени на одређено време (10 престанака овог радног односа због заснивања радног односа на неодређено време по добијеној сагласности Републичке комисије, 10 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла и 1 споразумни престанак радног односа).

У истом периоду, радни однос на неодређено време је засновало је 27 запослених (21 по добијеној сагласности Републичке комисије, а 6 по споразуму у смислу члана 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање ...).

Без заснивања радног односа, у периоду од 01.01–31.12.2019. године, 6 лица је ангажовано путем уговора, од чега је 5 лица било једнократно ангажовано у периоду од 22.06. до 30.06.2019. године, за потребе одржавања Регате „Воде Војводине 2019.“ (3 по уговору о ауторском делу и 2 по уговору о делу), док је 1 лице ангажовано по уговору о стручном оспособљавању, без накнаде, у својству приправника волонтера, у трајању од 12 месеци.

1.5 ИМОВИНА

Према Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, имовину Предузећа чине право својине на покретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ЈВП „Воде Војводине“ у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Право својине на покретним стварима које користи у свом пословању, ЈВП „Воде Војводине“ је стекло ступањем на снагу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/2013 и 105/2014), 06.10.2011. године.

Влада АП Војводине, која врши оснивачка права, одлучила је 2015. године да у капитал ЈВП „Воде Војводине“ не улаже непокретну имовину на којој је до ступања на снагу Закона о јавној својини право коришћења имало ово јавно предузеће (пословне зграде и друге непокретности које нису добра од општег интереса), као и да се на овој непокретној имовини Предузећа упише јавна својина Покрајине.

С тим у вези, дописом Управе за имовину АПВ, бр. 135-46-418/2015 од 08.06.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ је обавештено да је потребно да све објекте на којима је АП Војводина стекла право јавне својине, искњижи из својих пословних књига, ради увођења истих објеката у пословне књиге које води надлежни орган Покрајине. Тим поводом, Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ донео је 27.07.2017. године Одлуку о искњижењу објеката, и то 11 објеката који се воде у пословној евиденцији овог јавног предузећа, а које исто користи у оквиру свог пословања (пословне зграде радних јединица Оџаци, Бечеј, Сомбор и помоћне зграде Радне јединице Зрењанин – Секције Вршац, као и помоћни објекти у Бечеју и Бачком Моноштору).

ЈВП „Воде Војводине“ је наставило да користи наведене објекте на основу Уговора о коришћењу непокретности под бр. 46-644/2017 од 01.06.2018. године, који је закључило са надлежним органом Покрајине, а у складу са чланом 19. Закона о јавној својини.

ЈВП „Воде Војводине“ у складу са Законом о водама управља водним објектима и водним земљиштем у јавној својини, који према Закону о јавној својини, не улазе у капитал овог јавног водопривредног предузећа (члан 42. став 4. Закона).

Оснивачки акт ЈВП „Воде Војводине“ није усклађен са Законом о јавној својини, па су и у 2019. години водни објекти на којима Предузеће има право управљања, исказани као основни капитал Предузећа.

1.6 ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП „Воде Војводине“, које је основано за обављање водне делатности на територији АП Војводине, управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању. Предузеће управља и бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање који су у јавној својини, осим објектима које су правна лица изградила за своје потребе.

ЈВП „Воде Војводине“ својом делатношћу покрива територију АП Војводине настањену са око 2 милиона становника и површином од 21.506 km².

Близу 46% површине АП Војводине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1,84 милиона ha или 85% површине угрожено је површинским и подземним водама.

Око 1,0 милион ha плодног земљишта, 260 насеља и 1,2 милиона становника угрожени су од 1% велике воде. Процурењем и ерозијом је угрожено око 100 локалитета. Укупна дужина одбрамбених насипа износи 1.432,75 km.

1.7 ФИНАНСИРАЊЕ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Према Закону о водама, водна делатност је делатност од општег интереса, која обухвата уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања (послови изградње, одржавања и управљања регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и наводњавање у јавној својини, спровођење одбране од поплава и остали послови од општег интереса).

Средства за финансирање водне делатности односно послова од општег интереса, обезбеђују се из:

- буџета Републике Србије;
- буџета Аутономне Покрајине;
- накнада за воде;
- концесионе накнаде;
- осталих извора.

Накнаде за воде су јавни приход и чине их:

1. накнаде за коришћење вода;
2. накнада за извађени речни нанос;
3. накнаде за одводњавање;
4. накнаде за коришћење водних објеката и водних система;
5. накнаде за испуштене воде.

Финансирање радова и активности по Програму пословања ЈВП за 2019. годину, вршило се из:

- буџета АПВ;
- буџета Републике Србије;
- буџета јединица локалних самоуправа;
- средстава донација ЕУ кроз ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне и транснационалне сарадње;
- сопствених средстава.

Средства из буџета АП Војводине обезбеђују се од:

- а. Наплаћених накнада које се евидентирају у Буџетском фонду за воде АПВ, а распоређују се по основу Годишњег програма коришћења средстава. Вредност радова и појединачне позиције утврђени су Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- б. Давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини која се користе на основу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, са циљем реализације радова на одводњавању посебно угрожених подручја и радова на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су у функцији одбране од поплава.

Средства из буџета Републике Србије обезбеђују се за финансирање послова међународне сарадње.

Средства из буџета јединица локалних самоуправа, као учешће у заједничком финансирању, коришћена су за радове на побољшању функционалности система за одводњавање.

Средства донација ЕУ, коришћена су за суфинансирање (85%) реализације пројеката из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне и транснационалне сарадње.

Средства добијена на Конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2019. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, су искоришћена за суфинансирање активности у оквиру пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Сопствена средства чине наплаћена средства од накнада која закључно са 2010. годином, чине приход ЈВП „Воде Војводине“ према раније важећем Закону о водама („Сл. гласник РС“ бр. 46/91, 53/93 и 54/96).

2. ПРОГРАМИ РАДОВА У 2019. ГОДИНИ

Активности ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години одвијале су се у складу с Годишњим програмом пословања за 2019. годину, а на основу закључених уговора са Оснивачем, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

Динамику уговарања послова и степен реализације планираних активности диктирали су, првенствено темпо и обим прилива средстава Буџетског фонда за воде АПВ, Буџета АПВ, РС и општина, као и фондова ЕУ.

У наставку је дат преглед реализације планираних активности:

- Одржавање система за одводњавање:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирано је да се изведу радови у вредности од 1,135 милијарди динара, чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. Уговори са извођачима радова су закључени у априлу 2019. године, а рок за завршетак посла је март 2020. године. Изменама и допунама Годишњег програма пословања од 14.11.2019. године, износ средстава за одржавање и функционисање система за одводњавање је увећан за 165,95 милиона динара, након чега Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2019. годину износи 1,28 милијарди динара. Изведени су радови у вредности од 1,23 милијарди динара, од чега 965,11 милиона динара по уговору за 2019. годину, а 269,81 милиона динара по уговору за 2018. годину. Из каналске мреже за одводњавање уклоњено је 363.830 m³ муља и 36.171.984 m² биљне вегетације.
- Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по Конкурсу за 2019. годину:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирано је да се изведу радови у вредности 440 милиона динара, чија реализација се финансира средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурс је завршен у другом кварталу 2019. године, а уговорени су радови у вредности у вредности 345,43 милиона динара. У реализацији Програма учествују 27 општина/градова. Рок за завршетак радова је 30.04.2020. године. До 31.12.2019. изведени су радови у вредности од 337,18 милиона динара и уређено је 1.129 km каналске мреже.
- Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по Конкурсу за 2018. (пренете обавезе):** Конкурс за доделу средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, је окончан у трећем кварталу 2018. године. Уговорено је извођење радова у вредности 480 милиона динара. До краја 2018. извршени су радови у вредности од 357,71 милиона динара. У 2019. години изведени су радови у вредности 122 милиона динара, чиме су уговори реализовани у целости. Уређено је 1.474 km каналске мреже.
- Општине које на Конкурсу за 2019. годину за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења и заштите нису добиле средства, удружиле су са ЈВП „Воде Војводине“ средства у циљу реализације приоритетних радова на уређењу каналске мреже на њиховој територији. Изведени су радови у вредности од 59,5 милиона динара и уређено је 56 km каналске мреже.
- Крајем 2018. године уговорени су радови за уређење каналске мреже, чија је реализација суфинансирана средствима буџета општина (Сомбор, Бечеј и Сремска Митровица) у вредности 22,48 милиона динара и средствима ЈВП у вредности 26 милиона динара. До 31.12.2019. године изведени су радови у вредности од 40 милиона динара.
- Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирано је да се у оквиру ове позиције изведу радови у вредности 370 милиона динара, а чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. До 31.12.2019. изведени су радови у вредности 368,14 милиона динара.
- Радови на побољшању функционисања заштитних објеката:** Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину („Службени лист АПВ“ бр. 47/2019 од 06.11.2019.) планирана су додатна средства у висини од 66,64 милиона динара за радове на побољшању функционисања заштитних објеката. Вредност

извршених радова до 31.12.2019. године износи 35,69 милиона динара. Рок за реализацију уговора је 30.04.2020. године.

8. **Одбрана од поплава:** Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2019. годину за одбрану од поплава планирана су средства у износу 37 милиона динара, а затим су Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину („Службени лист АПВ“ бр. 40/2019. од 18.09.2019.) планирана додатна средства у износу 32,7 (обухваћено Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2019. годину од 14.11.2019.), што значи да је ЈВП „Воде Војводине“ за ову намену у 2019. години имало на располагању 69,7 милиона динара.
Током 2019. године због метеоролошке ситуације и хидролошких прилика, било је на снази спровођење одбране од поплава од спољних вода, за чију реализацију су утрошена средства у износу од 2,73 милиона динара. Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода у 2019. износе 58,86 милиона динара.
9. **Радови на репродукцији шума:** За ову намену годишњим програмом пословања за 2019. годину планирана су средства у износу од 24 милиона динара. У току 2019. године изведени су радови у вредности 16,35 милиона динара. Поред тога су извршени радови на мерама неге на младим засадима. Уз појас канала Хс ДТД извршено је пошумљавање на површини од 86,7 ха ради подизања ветрозаштитних шума.
10. **Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирана су средства у износу од 10 милиона динара. Вредност реализованих радова и активности у току 2019. године на реконструкцији шумско-заштитног појаса износи 3,93 милиона динара, пошумљено је укупно 5,90 ха. Поред пошумљавања је извршено и попуњавање на површини од 1,00 ха.
11. **Радови на одржавању и функционисању Хс ДТД:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да се изведу радови у вредности 463,75 милиона динара. Степен реализације Програма радова и активности на одржавању и функционисању Хс ДТД износи 104,46%, односно 484,44 милиона динара.
Уклоњено је 299.220 m³ муља (257.220 m³ пловном механизацијом и 42.000 m³ сувоземном механизацијом) и 4.423.000 m² вегетације из канала.
12. **Регулационо-санациони радови:** За ову намену Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирана су средства од 59 милиона динара. Вредност уговорених радова износи 58,84 милиона динара, док је вредност реализованих радова 57,52 милиона динара. Од пренетих обавеза из 2018. године у износу од 40,39 милиона динара, у 2019. години изведени су радови у укупној вредности од 37,95 милиона динара.
13. **Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана:** Годишњим програмом пословања за 2019. годину планирано је да се изведу радови у вредности 68 милиона динара, чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ. Уговори са извођачима радова су закључени у априлу 2019. године, а рок за завршетак радова је март 2020. До 31.12.2019. реализовани су радови у вредности од 52,75 милиона динара. По уговору из 2018. реализовани су радови у вредности од 3,79 милиона динара.
14. **Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система:** Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-31.12.2019. године износи 114,84 милиона динара.
15. **Системи за наводњавање –** У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 14,04 милиона евра.
16. **Хаваријска загађења:** У 2019. години није било интервенција на санацији хаваријских загађења.
17. **Активности у међудржавној сарадњи:** Послови и задаци из области међународне сарадње који су уговором за 2019. годину поверени ЈВП „Воде Војводине“ од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, а тичу се билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом и дела мултилатералне сарадње реализовани, а који су уговорени у вредности 20 милиона динара, реализовани су вредности од 19,3 милиона динара.

18. **Заштићена природна добра:** У извештајном периоду реализоване су активности на чишћењу и уништавању инвазивних врста у границама заштићеног подручја Парка природе Јегричка, које је суфинансиране средствима буџета општина Темерин и Врбас (по 300 хиљада динара). Риболовно подручје Парка природе Јегричка је порибљено са 100 kg шаранске млађи, а риболовно подручје Парка природе Бељанска Бара са 400 kg шаранске млађи у укупној вредности од 228,9 хиљада динара.
19. **Рибарство:** Продато је 8.075 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 25 дозвола за привредни риболов, од чега је остварен приход у износу 38,04 милиона динара. Извршено је порибљавање са 13 t рибље млађи, чија је вредност 6,56 милиона динара, на деловима рибарских подручја „Срем“, „Банат“ и „Бачка“. Рибочуварска служба остварила је 2.400 контрола. Контролисано је укупно 8.000 лица. Заплењено је 63.000 m мрежа и већа количина импровизованог алата (150 комада). Поднето је 14 захтева за покретање поступка за недозвољени риболов и већи део је реализован.
20. **Пројекти прекограничне и транснационалне сарадње:** Кроз ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње у периоду 01.01-31.12.2019. године изведени су радови у вредности 279,66 милиона динара, и то:
- Програм Мађарска-Србија:** радови на преводници Бездан и устави и преводници Шебешфок у вредности 194,83 милиона динара, што заједно са радовима изведеним у току 2018. године (106,22 милиона динара) износи 301,85 милиона динара и представља 91% уговорене вредности (330,59 милиона динара); радови на измуљењу Јегричке, у вредности 26,64 милиона динара чиме је заједно са радовима изведеним у току 2018. године (32,36 милиона динара) уговорени посао реализован у целости; радови на изградњи инспекционо-шетне стазе у вредности 3,53 милиона динара.

Програм Румунија-Србија: радови на уређењу обале и монтажи плутајућег дока у Зрењанину у вредности 54,66 милиона динара.

Приказ реализације програма радова и активности ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години дат је у табели у наставку.



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела бр. 2.1: Преглед радова и активности ЈВП „Воде Војводине“ реализованих у 2019. години

	СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ 2019.			ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОДОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА АПВ			ДРУГИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			ОСТАЛИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (РС, НИВОИ ЛОК. САМОУПРАВЕ,			СВЕ УКУПНО ПЛАНИРАНО 2019.		
	ПЛАНИ- РАНО	РЕАЛИ- ЗОВАНО	%	ПЛАНИ- РАНО	РЕАЛИ- ЗОВАНО	%	ПЛАНИ- РАНО	РЕАЛИ- ЗОВАНО	%	ПЛАНИ- РАНО	РЕАЛИ- ЗОВАНО	%	ПЛАНИ- РАНО	РЕАЛИ- ЗОВАНО	%
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10	11	12=11/10	13	14	15=14/13
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА															
одржавање система за одводњавање	1.314.217.388	1.257.669.161	95,70%	110.000.000	107.289.204	97,54%	0	0	0	460.000.000	265.590.316	57,74%	1.884.217.388	1.630.548.681	86,54%
одржавање система за одводњавање	1.283.928.476	1.234.929.837	96,16%										1.283.928.476	1.234.929.837	96,18%
- посебни радови и црпне станице													0	0	#DIV/0!
- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2018. год.				110.000.000	107.289.204	97,54%				330.000.000	229.890.316	69,66%	440.000.000	337.179.520	76,63%
- суфинансирање са општинама и осталим субјектима	30.288.912	22.739.324	75,07%							70.000.000	35.700.000	51,00%	100.288.912	58.439.324	58,27%
- хитни радови на санацији објеката за заштиту од вода, оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019.										60.000.000		0,00%	60.000.000	0	0,00%
Одржавање заштитних објеката	506.350.611	474.373.403	93,68%	0	0	0,00%	1.500.000	0	0,00%	24.000.000	16.350.000	68,13%	531.850.611	490.723.403	92,27%
- редовно и интервентно одржавање и одржавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода	436.650.611	412.365.735	94,44%							436.650.611			436.650.611	412.365.735	94,44%
- одбрана од поплава	69.700.000	62.007.667	88,96%							24.000.000	16.350.000	68,13%	24.000.000	16.350.000	68,13%
- радови на репродукцији шума							1.500.000		0,00%				1.500.000	0	0,00%
- радови на подизању и унапређењу шума															
Одржавање Хс ДТД	105.300.000	114.578.459	108,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	23.000.000	12.000.000	52,17%	128.300.000	126.578.459	98,66%
- трошкови одржавања и функционисања (енергенти, материјали и остали трошкови)	29.760.000	47.177.786	159,53%							29.760.000			29.760.000	47.177.786	158,53%
- ангажовање трећих лица	75.540.000	67.400.673	89,23%										75.540.000	67.400.673	89,23%
- суфинансирање са општинама										23.000.000	12.000.000	52,17%	23.000.000	12.000.000	52,17%
УКУПНО	1.925.867.999	1.846.621.022	95,89%	110.000.000	107.289.204	97,54%	1.500.000	0	0,00%	507.000.000	293.940.316	57,98%	2.544.367.999	2.247.850.542	88,35%
ИНВЕСТИЦИОНИ И ДРУГИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ															
- регулационо санациони радови	59.000.000	57.525.756	97,50%										59.000.000	57.525.756	97,50%
- радови на реконструкцији и одржавању шумско-заштитног појаса	10.000.000	3.933.201	39,33%										10.000.000	3.933.201	39,33%
- инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана	68.000.000	53.107.245	78,10%										68.000.000	53.107.245	78,10%
- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката	86.732.000	71.229.560	82,13%										86.732.000	71.229.560	82,13%
- системи за наводњавање (програм Абу Дабил фонд)										2.558.211.901	1.656.795.284	64,76%	2.558.211.901	1.656.795.284	64,76%
- изградња и капитално одржавање водних објеката	31.140.860	31.140.860	100,00%										31.140.860	31.140.860	100,00%
УКУПНО	254.872.860	216.936.621	85,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.558.211.901	1.656.795.284	64,76%	2.813.084.761	1.873.731.905	66,61%
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ															
- програм пројекта документације и еколошко-истраживачки БДВ 2019.	55.000.000	36.977.227	67,23%										55.000.000	36.977.227	67,23%
- хаваријска заграђања	0	0											0	0	#DIV/0!

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ



	СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ 2019.			ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА АПВ			ДРУГИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИЗ АПВ			ОСТАЛИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (РС, НИВОЛ ПОК, САОУПРАВЕ, СОПСТ. СР, ЕУ)			СВЕ УКУПНО ПЛАНИРАНО 2019.		
	ПЛАНИ- РАНО 1	РЕАЛИ- ЗОВАНО 2	% 3=2/1	ПЛАНИ- РАНО 4	РЕАЛИ- ЗОВАНО 5	% 6=4/4	ПЛАНИ- РАНО 7	РЕАЛИ- ЗОВАНО 8	% 9=8/7	ПЛАНИ- РАНО 10	РЕАЛИ- ЗОВАНО 11	% 12=11/10	ПЛАНИ- РАНО 13	РЕАЛИ- ЗОВАНО 14	% 15=14/13
12 - ИНТЕРРЕГ ИПА пројекти прекограничне и трансационалне сарадње															
12.1 - ИНТЕРРЕГ ИПА пројекти прекограничне и трансационалне сарадње (донација ЕУ)															
12.2 - ИНТЕРРЕГ ИПА пројекти прекограничне и трансационалне сарадње (ЈВП)															
13 - активности у међудржавној сарадњи															
14 - заштитена природна добра															
15 - рибарство															
16 - Трошкови експропријације за потребе изградње водних објеката на територији АПВ	56.500.001	44.167.706	78,17%												
17 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП	1.112.223.000	1.080.508.843	97,15%												
17.1 трошкови зарада	725.890.000	671.428.492	92,50%												
17.2 трошкови издавања водних решења за физичка лица	50.000.000	72.120.982	144,24%												
17.3 трошкови и улагања у функционисање	336.333.000	336.959.369	100,19%												
УКУПНО	1.223.723.001	1.161.653.776	94,93%	0	0	0	0	0	0	898.874.469	424.715.450	47,26%	2.122.397.470	1.586.369.226	74,74%
СВЕГА ПЛАНИРАНО ЗА 2019.	3.404.463.860	3.225.211.419	94,73%	110.000.000	107.289.204	97,54%	1.500.000	0	0,00%	3.953.886.370	2.375.451.050	59,93%	7.479.850.230	5.707.951.674	76,31%

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела бр. 2.2: Реализација преузетих обавеза из претходних година у 2019. години

	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ ДО 2018. ГОДИНЕ			ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА АПВ			ДРУГИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИЗ АПВ			ОСТАЛИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (РС, НИВОИ ЛОК. САМОУПРАВЕ, СОПСТ. СР., ЕУ)		
		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	%
1	Двојно суфинансирање са општинама (пренос из 2018. године)										12.454.016	8.641.122	69,38%
2	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2016. год.)	0,00	0,00		15.917.040	12.471.587	78,35%	0	0	0,00%	789.157		0,00%
3	-суфинансирање ИПА пројеката (пренос из 2019. године)							2.886.311	0	0,00%			
4	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2016. године)	33.406.422,00	5.273.826,60	15,79%									
5	- израда техничке документације за потребе изградње система за наводњавање на подручју Војводине и даљу реализацију програма финансирања ових радова преко АДО (пренос из 2017. године)	89.533.350,00	40.322.575,56	45,04%									
6	- подизање нових шума и уређење расадничке производње Бујетски фонд за шуму (пренос из 2018. године)				4.680.000	3.144.000	67,18%	1.514.268	1.514.268	100,00%			
7	- израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2016. године)												
8	- израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014. године)				720.000	720.000	100,00%						
9	- израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2013. године)				4.361.040	1.419.600	32,55%						
10	- трошкови функционисања ЈВП (пренос из 2016.)	13.302.773,06	9.541.039,82	71,72%									
11	- одбрана од поплава (пренос из 2016.)	11.281.239,11	6.584.966,02	58,37%									
12	- редовно одржавање и функционисање система за одводњавање (пренос из 2018)	259.323.165,96	259.323.165,96	100,00%									
13	- одржавање Хс ДТД (пренос из 2018.)	24.378.629,86	24.378.629,86	100,00%									
14	- радови на одржавању шумског заштитног појаса (пренос из 2018.)	9.311.320,63	8.897.216,47	95,55%									
15	- регулационо санациони радови (пренос из 2018. године)	40.388.082,46	37.946.736,09	93,96%									
16	- инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана (пренос из 2018. године)	3.794.914,09	3.794.914,09	100,00%									
17	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2018. године)	7.170.984,00	7.170.984,00	100,00%									
18	- трошкови функционисања ЈВП (пренос из 2018.)	26.436.690,51	26.436.690,51	100,00%									
19	- изградња и капитално одржавање водних објеката (уговор 600 мил. из 2018.)	60.592.859,04	60.592.859,04	100,00%									
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА		578.920.436,72	490.263.606,02	84,69%	25.678.080,26	17.755.186,77	69,15%	4.400.579,00	1.514.268,00	34,41%	13.243.173,44	8.641.121,76	65,25%

2.1 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Програм радова за 2019. годину утврђен је на основу процењене наплате накнаде за одводњавање у износу од 1,135 милијарди динара, што представља 29% износа потребног обима радова на редовном одржавању на годишњем нивоу (100% износи 3,69 милијарди динара) и није довољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и других добара на водном подручју.

Изменама и допунама Годишњег програма пословања од 30.05.2019. године, овај износ је умањен за 17,02 милиона динара (у делу посебних радова). Предметна средства су преусмерена на радове на уређењу каналске мреже који се суфинансирају средствима буџета општина, како би се извршили неопходни радови у општинама које нису добиле средства на Конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта.

Изменама и допунама Годишњег програма пословања од 14.11.2019. године, износ средстава за одржавање и функционисање система за одводњавање је увећан за 165,95 милиона динара, након чега Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2019. годину износи 1,28 милијарди динара.

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање, с обзиром на недовољност средства, обухвата приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, ради обезбеђивања функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање штетне биљне вегетације тарупирањем и редовно одржавање и санацију мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи).

Приоритет су и даље радови на чишћењу биљне вегетације (кошење, тарупирање, изношење трске из канала специјализованом механизацијом), а на деловима система за одводњавање на којима су изведени предметни радови постигнут је бољи ефекат одводњавања. Такође, остварен је и задовољавајући ефекат на сузбијању биљне вегетације третирањем хемијским средствима након тарупирања, а избор средстава и механизације је извршен у сарадњи са стручњацима Пољопривредног факултета у Новом Саду.

У циљу омогућавања корисницима да воду из двонаменских канала (канални чија је сврха првенствено одводњавање, али у сушним периодима могу да се користе и за довод воде за наводњавање), користе за наводњавање, извршено је њихово измуљивање и уклањање биљне вегетације.

У периоду 01.01-31.12.2019. године из каналске мреже система за одводњавање уклоњено је 363.830 m³ муља и 36.171.984 m² вегетације.

РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ИЗ ПРОГРАМА ХМО (ПРИЈЕМНИЦИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У КАНАЛСКУ МРЕЖУ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ)

У оквиру Програма ХМО, изведени су радови у вредности 49,7 милиона динара, што представља 92% од планираних 54 милиона динара. Програм у пуном износу биће реализован до марта 2020. године.

Због испуштања употребљених вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача потребно је радити њихово појачано одржавање ради одржавања каналске мреже у функционалном стању. Највећи део радова је изведен на планским водопривредним подручјима „Шидина“, „Средњи Банат“, „Шајкашка“ и „Бачка“.

У табели у наставку дат је преглед планираних, уговорених и извршених радова на одржавању и функционисању система за одводњавање у 2019. години.

Потрошња електричне енергије је премашила планирану за 3% због појачаног ангажовања пумпи у току одбране од поплава од унутрашњих вода.

Табела бр. 2.1.1: Реализација Програма одржавања и функционисања система за одводњавање у периоду I – XII 2019.

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН	УГОВОРЕНО ДО 31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2019.	% 4 : 2
1	2	3	4	5	6
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем и Х. И.)	1.125.528.476	1.105.732.280	1.077.611.668	96%
2	ХМО	54.000.000	54.000.000	49.744.545	92%
3	Електрична енергија за ЦС станице	104.400.000	104.400.000	107.573.623	103%
	Σ	1.283.928.476	1.264.132.280	1.234.929.836	96%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели Прилог бр. 1, на странама 72 и 73 Извештаја.

РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА АПВ И ОПШТИНА

У 2018. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је спровео Конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. У сврху реализације Програма, ЈВП „Воде Војводине“ је спровело поступке за избор извођача радова. По окончаним процедурама јавних набавки уговорени су радови у вредности од 480 милиона динара. У реализацији Програма учествовало је 33 општине/градова.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2018. године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. износи 122 милиона динара, чиме су заједно са радовима извршеним у 2018. у вредности 357,71 милиона динара, у потпуности реализовани уговорени радови.

Табела бр. 2.1.2: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2018.

Р. Б.	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ - КОНКУРС АПВ 2018. СУФИНАНСИРАЊЕ СА ОПШТИНАМА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ	УЧЕШЋЕ АПВ	УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ 2018.	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ 2019.	% (5+6):2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бачка	199.210.834	51.486.911	147.723.923	165.836.991	33.016.699	100%
2	Банат	216.290.177	56.617.054	159.673.123	166.647.554	49.642.624	100%
3	Срем	64.571.308	16.988.743	47.582.565	25.226.191	39.345.117	100%
	Σ	480.072.319	125.092.708	354.979.611	357.710.736	122.004.440	100%

До 31.12.2019. уређено је укупно 1.474 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 2.1.3: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2018. године

Р. Б.	ПОДРУЧЈЕ	ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ (km)	РЕАЛИЗОВАНО УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ДО 31.12.2018. (km)	% 3:2
1	2	3	4	5
1	Бачка	669	669	100%
2	Банат	713	713	100%
3	Срем	92	92	100%
	Σ	1.474	1.474	100%

И у 2019. години Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је расписао Конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача радова. У реализацији Програма учествују 27 општина/градова.

Уговорени су радови у вредности 345,4 милиона динара, а рок за њихову реализацију је продужен до 31.12.2019. године. Кроз овај конкурс планирано је уређење 1.144 km каналске мреже.

Вредност извршених радова по Конкурсу из 2019. године до 31.12.2019. износи 337,18 милиона динара или 98% од уговорених радова.

Табела бр. 2.1.4: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2019.

Р. Б.	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ - КОНКУРС АПВ 2019. СУФИНАНСИРАЊЕ СА ОПШТИНАМА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ	УЧЕШЋЕ АПВ	УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ 2019.	% 5:2
1	2	3	4	5	6	
1	Бачка	178.713.623	58.523.556	120.190.067	178.713.623	100%
2	Банат	138.493.748	42.205.524	96.288.224	138.493.748	100%
3	Срем	28.225.105	9.270.920	18.954.185	19.972.150	71%
	Σ	345.432.476	110.000.000	235.432.476	337.179.521	98%

Уговорено је уређење каналске мреже у дужини од 1.144 km. До 31.12.2019. уређено је укупно 1.129 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 2.1.5: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2019. године

Р. Б.	ПОДРУЧЈЕ	ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ (km)	РЕАЛИЗОВАНО УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ДО 31.12.2018. (km)	% 3:2
1	2	3	4	
1	Бачка	574	574	100%
2	Банат	517	517	100%
3	Срем	53	38	30%
	Σ	1.144	1.129	99%

Општине које на Конкурсу за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину нису добиле средства, обратиле су се ЈВП „Воде Војводине“ са намером да удруже средства у циљу реализације приоритетних радова на уређењу каналске мреже на њиховој територији. Како би изашло у сусрет иницијативи општина, ЈВП „Воде Војводине“ је извршило измене у Годишњем програму пословања за 2019. годину којима је преусмерио средства у износу 30,29 милиона динара у суфинансирање предметних радова и на тај начин омогућило њихову реализацију.

Општине Врбас, Сечањ, Нова Црња, град Зрењанин, Вршац, Инђија, Сремска Митровица и 33 „Граничар“ обезбедили су средства у висини 86 милиона динара за учешће у суфинансирању радова на уређењу каналске мреже. Уговори су закључени почетком септембра, а до 31.12.2019. изведени су радови у вредности 59,52 милиона динара.

Табела бр. 2: Суфинансирање општине – ЈВП „Воде Војводине“ 2019. година

Р. Б.	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОПШТИНА/ ГРАД	УГОВОРЕНО	СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ	СУФИНАНСИРАЊЕ ЈВП	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„Бачка“ - Врбас	Град Врбас	5.258.265	4.000.000	1.258.265		0%
2		Сечањ	19.718.492	15.000.000	4.718.492	10.182.077	52%
3	„Средњи Банат“ - Зрењанин	Нова Црња	6.572.831	5.000.000	1.572.831	3.394.026	52%
4		град Зрењанин	31.291.323	25.000.000	6.291.323	18.791.323	60%
5	„Јужни Банат“ - Вршац	Вршац	13.145.661	10.000.000	3.145.661	13.145.661	100%
6	„Источни Срем“ - Земун	Инђија	26.291.323	20.000.000	6.291.323		0%
7	„Босут“ - Сремска Митровица	Сремска Митровица	5.677.686	4.000.000	1.677.686	5.677.686	100%
8	ВП „Шидина“ - Шид	33 Граничар Шид	8.333.333	3.000.000	5.333.333	8.333.333	100%
	УКУПНО		116.288.914	86.000.000	30.288.914	59.524.106	51%

Крајем 2018. године уговорено је извођење радова на уређењу каналске мреже, чија реализација је суфинансирана средствима буџета општина (Сомбор, Бечеј и Сремска Митровица), у вредности 22,48 милиона динара и средствима ЈВП у вредности 26 милиона динара. До 31.12.2019. изведени су радови у вредности 40 милиона динара, односно 83%.

Табела бр. 2.1.6: Реализација радова на уређењу каналске мреже – суфинансирање општине – ЈВП 2018. година

Р. Б.	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	ОПШТИНА/ ГРАД	УГОВОРЕНО	СУФИНАНСИ-РАЊЕ ОПШТИНЕ	СУФИНАНСИ-РАЊЕ ЈВП	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ	% 7 : 4
1	„Западна Бачка“ Сомбор	Град Сомбор	25.327.248	11.327.248	14.000.000	16.855.770	67
2	„Средња Бачка“ Бечеј	Бечеј	14.150.000	6.650.000	7.500.000	14.150.000	100
3	„Босут“ Сремска Митровица	Сремска Митровица	9.000.000	4.500.000	4.500.000	9.000.000	100
УКУПНО:			48.477.248	22.477.248	26.000.000	40.005.770	83

2.2 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2019. годину износи 463,75 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–XII 2019. износи 484,44 милиона динара, што представља 104,46% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 153,03 милиона динара. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објекта у периоду I–XII су реализовани у вредности 198,79 милиона динара. Извршени су следећи радови:

- измуљење канала пловном механизацијом,
- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно,
- равнање инспекционе стазе,
- кошење подводног растиња и трске помоћу пловних косачица и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

У 2019. години из канала Хс ДТД уклоњено је 299.220 m³ муља (257.220 m³ пловном механизацијом и 42.000 m³ сувоземном механизацијом) и 4.423.0000 m² вегетације.

Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду реализовани су у вредности 128,76 милиона динара, а односе се на:

- Послове започете у претходној години, чија реализација у 2019. години износи 61,36 милиона динара:
 - Грађевински радови на објектима у радној јединици Озаци (уговорена вредност 5,76 милиона динара);
 - Уређење командних, моторних и уставарских кућица на хидрочвору Нови Сад (уговорена вредност 3,26 милиона динара);
 - Одржавање хидромашинске и хидрауличне опреме трећег поља на устави „Брана на Тиси“ (уговорена вредност 14,95 милиона динара);
 - Обнављање електроопреме два поља уставе и кранова на објекту „Брана на Тиси“ (уговорена вредност 10,51 милиона динара);
 - Санација стубова узводног предпришта на Брани на Тиси (уговорена вредност 40,28 милиона динара - финансирано сопственим средствима ЈВП);
- Послове по Програму за 2019. годину чија реализација износи 67,4 милиона динара:
 - Уређење обале канала Врбас–Бездан кроз насеље Врбас (уговорена вредност 1,64 милиона динара);
 - Радови на уређењу обала канала Врбас–Бездан у Црвенки (уговорена вредност 6 милиона динара);
 - Радови на измуљењу и уређењу Кикиндског канала (уговорена вредност 24 милиона динара), а који су суфинансирани са градом Кикинда;
 - Грађевински радови на објекту визиторског центра Јегричка у Темерину (уговорена вредност 450 хиљада динара);
 - Постављање пијезометара и истражних бунара на каналу Пловни Бегеј (уговорена вредност 3,58 милиона динара);

- Грађевински радови санације дилатационих спојница Бране на Тиси (уговорена вредност 3,94 милиона динара);
- Грађевински радови на санацији чуварнице у Кисачу (уговорена вредност 900 хиљада динара);
- Грађевински радови на објекту старог млина у Малом Стапару (уговорена вредност 5,2 милиона динара);
- Обнављање електроопреме 1. и 2. поља Бране на Тиси (уговорена вредност од 6,59 милиона динара);
- Машинско кошење вегетације са обала канала на територији радних јединица Сомбор, Врбас и Нови Сад (уговорена вредност 8,4 милиона динара).

У току су следећи радови:

- Завршни радови на уређењу обала канала Бачки Петровац-Каравуково код Бачког Петровца (уговорена вредност 3 милиона динара);
- Уређење и измуљење канала Бачки Петровац-Каравуково код цс Маглић (уговорена вредност 11,4 милиона динара);
- Ремонт хидрауличног система клапне 4 поља уставе Бране на Тиси (уговорена вредност 740 хиљада динара) и антикорозионој заштити помоћних затварача за уставу Томашевац (уговорена вредност 3,62 милиона динара).

У оквиру програма АП Војводине за изградњу и капитално одржавање водних објеката из 2018. године завршени су радови на реконструкцији једног агрегата на црпној станици Бездан 2 укупне вредности 72,76 милиона динара (радови изведени у 2018. години 41,48 милиона динара и 31,14 милиона динара радови изведени у 2019. години).

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), реализовани су радови на уређењу обале Бегеја у Зрењанину и поставке плутајућег дока укупне вредности 54,67 милиона динара, и уговорени радови на санацији објеката у Клеку и Српском Итебеју у вредности 1,91 милиона евра.

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Мађарском (пројекат BABECA – Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан), реализовани су радови на реконструкцији и санацији објеката у Бездану и Шебешфоку у вредности 301,05 милиона динара (од тога 106,22 милиона динара у 2018.). Ови радови ће бити окончани до половине 2020. године. Уговорена вредност радова износи 330,59 милиона динара.

Вредности извршених радова на одржавању и функционисању Хс ДТД по позицијама приказане су у табели у наставку.

Детаљан аналитички преглед извршених радова са количинама и вредностима дат је у Прилогу бр. 2 на странама 74 и 75 Извештаја.

Табела бр. 2.2.1: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2019. години

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗВРШЕЊЕ I – XII 2019.	% ИЗВРШЕЊА
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	55.057.633,92	55.657.038,95	101,09%
А.2. ПОГОН	87.811.160,96	97.381.607,67	110,90%
СВЕГА А.	142.868.794,88	153.038.646,62	107,12%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	158.446.433,91	154.666.702,19	97,61%
Б.2. ОБЈЕКТИ	50.491.208,44	39.760.424,67	78,75%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.360.930,00	4.363.380,38	59,28%
СВЕГА Б.	216.298.572,35	198.790.507,24	91,91%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	21.736.000,00	32.419.447,38	149,15%
В.2. ОБЈЕКТИ	28.404.000,00	83.631.320,71	294,44%
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	0	0	0
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.400.000,00	710.400,00	29,60%
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	23.000.000,00	12.000.000,00	52,17%
СВЕГА В.	75.540.000,00	128.761.168,09	170,45%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	9.840.000,00	1.380.000,00	14,02%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	19.200.000,00	2.472.000,00	12,88%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	463.747.367,23	484.442.321,95	104,46%

2.3 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

На територији АПВ у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2019. години планирано је извођење радова на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката, одбрани од поплава, регулационо–санационих и инвестиционих радова на заштитним објектима (детаљан приказ реализације дат је у Прилозима бр. 3, 4, 5, на страницама 76 до 78 Извештаја). Програм радова је дефинисан у складу са потребама водопривреде на подручју АПВ, према техничким критеријумима и нормативима.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенамени хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје АПВ.

Програмом су обухваћени радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката, изградња, реконструкција и регулационо-санациони радови на заштитним водним објектима.

2.3.1 РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава. За реализацију Програма у 2019. години планирана су средства у износу од 370 милиона динара из Програма Буџетског фонда за воде АПВ.

Уговорени су радови у вредности 370 милиона динара, од чега је до краја 2019. године изведено 368,14 милиона динара, односно 99,5% уговорене вредности.

Преглед извршених радова дат је у Прилогу бр. 3. на страни 76 и 77 Извештаја.

Према важећим нормативима и стандардима за редовно одржавање заштитних водних објеката у 2019. години била су потребна средства у износу од 650 милиона динара.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водних објеката, а ради њиховог поузданог функционисања, АПВ би морала да за ову позицију обезбеди годишњи износ средстава у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

2.3.1.1. РАДОВИ НА ПОБОЉШАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКТА

Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину („Службени лист АПВ“ бр. 47/2019 од 06.11.2019.), планирана су додатна средства у износу 66,64 милиона динара за радове на интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката и заштити од штетног дејства вода.

Вредност извршених радова до 31.12.2019. године је 35,69 милиона динара, односно 53,55% уговорене вредности. Рок за реализацију уговорених радова на побољшању функционисања заштитних објеката је 30.04.2020. године.

Табела бр. 2.3.1.1.1: Преглед радова на побољшању функционисања заштитних објеката

Р. Б.	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	ИЗВРШЕНО 2019. ГОД.	% 3 : 4
1	2	3	4	
1	„Западна Бачка“ Сомбор	4.214.385,48	4.214.385,48	100,00%
2	„Дунав“ Бачка Паланка	5.999.404,42	0,00	
3	Сента“ Сента	4.539.074,76	0,00	
4	„Средња Бачка“ Бечеј	2.306.579,16	0,00	
5	„Шајкашка“ Нови Сад	5.791.640,16	5.388.908,16	93,05%
6	„Горњи Банат“ Кикинда	6.571.214,48	6.571.214,48	100,00%
7	„Средњи Банат“ Зрењанин	11.662.340,06	0,00	
8	„Јужни Банат“ Вршац	6.859.999,58	6.859.999,58	100,00%
9	„Тамиш – Дунав“ Панчево	3.258.623,38	1.626.323,08	
10	„Подунавље“ Ковин	2.728.208,47	0,00	
11	„Дунав и Тиса“ Сомбор	3.249.950,04	3.249.950,04	100,00%
12	„Ушће“ Бела Црква	1.037.732,24	1.037.732,24	100,00%
13	„Галовица“ Земун	762.363,74	0,00	
14	„Сава“ Сремска Митровица	4.175.847,41	4.175.847,41	100,00%
15	„Сава“ Шабац	1.391.561,45	670.658,40	48,19%
16	„Регулације“ Сремска Митровица	1.120.434,68	920.800,39	82,18%
17	„Хидросрем“ Сремска Митровица	972.103,44	972.103,44	100,00%
	УКУПНО:	66.641.161,96	35.687.922,70	53,55%

2.3.2 РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ

Регулационо-санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. за ову намену опредељена су средства у износу од 59 милиона динара.

Уговорени су радови у вредности 58,84 милиона динара. Вредност изведених радова у периоду од 01.01-31.12.2019. године износи 57,53 милиона динара, односно 98% од вредности уговорених радова.

Од пренетих средстава из 2018. године, у износу 40,39 милиона динара, у 2019. години изведени су радови у вредности од 37,95 милиона динара.

У Прилозима бр. 5 и 5.1 на страни 78 Извештаја у форми табела дат је детаљан преглед уговорених и реализованих регулационо-санационих радова.

2.4 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Годишњим програмом пословања за 2019. годину, за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 37 милиона динара, а затим су Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину („Службени лист АПВ“ бр. 40/2019 од 18.09.2019.), планирана додатна средства у висини од 32,7 милиона динара (обухваћено Изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2019. годину од 14.11.2019.), што значи да је ЈВП „Воде Војводине“ за ову намену у 2019. години имало на располагању средства у износу 69,7 милиона динара, од чега за спровођење одбране од поплава и леда 64,7 милиона динара, за набавку материјала и алата за одбрану од поплава 3 милиона динара и 2 милиона динара за набавку опреме за одбрану од поплава.

2.4.1 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ

Одбрана од поплава од спољних вода спроводила се у два периода од 02.05. до 22.05. (20 дана) и од 31.05 до 20.06.2019. године (20 дана). Одбрана се спроводила на укупно 378,97 km одбрамбене линије и трајала је укупно 40 дана.

У периоду од 02.05. до 22.05.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава у зони Кусића, 02.05. и 03.05. два дана на укупно 3,85 km.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.05. до 16.05., 13 дана.
- Дана 04.05. спроводила се редовна одбрана од поплава на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева на 8,62 km, услед појаве повећане количине наплавина и плутајућег наноса.
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 6 дана, од 16.05 до 22.05. у зони Кленка на укупно 3,88 km.

У периоду од 31.05. до 20.06.2019. године одбрана се спроводила на следећим водотоцима:

- На Дунаву се спроводила редовна одбрана од поплава од 31.05. до 20.06. (20 дана) на укупно 126,60 km одбрамбене линије :
 - На сектору Д.10. Нови Сад на десној обали Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца на 13,13 km одбрана се спроводила 20 дана од 31.05. до 20.06 и на левој обали у зони Гардиноваца на 11,92 km од 05.06. до 17.06. (12 дана).
 - На сектору Д.12. Сомбор на левој обали Дунава од државне границе до „Кучке“ на 19,59 km одбрана се спроводила од 03.06. до 07.06. (4 дана).
 - На сектору Д.8. Панчево и Ковин на левој обали Дунава од ушћа Наделе до Скореновца на 11,33 km и од Скореновца до Дубовца на 41,02 km, од 05.06 до 17.06. укупно 12 дана.
 - На сектору Д.7. Банатска Паланка на левој обали Дунава од ушћа канала ДТД до ушћа Нере на 1,44 km од 06.06. до 10.06. (4 дана).
- На Тиси се спроводила редовна одбрана од поплава од 03.06. до 17.06. (14 дана) на укупно 125,55 km одбрамбене линије:
 - На сектору Д.15. Чуруг на десној обали Тисе од Мошорина до Чуруга и у зони Титела на укупно 43,23 km од 03.06. до 17.06. (14 дана)
 - На сектору Д.17. Зрењанин спроводила се редовна одбрана на левој обали Тисе од ушћа у Дунав до ЦС „Кумане“ на укупно 51,12 km од 03.06. до 17.06. (14 дана)
 - На сектору Д.16. Кикинда на левој обали Тисе од државне границе до ЦС „Вок“ на 24,99 km и на „Ђалинском“ насипу на 6,21 km од 07.06. до 13.06. (6 дана).
- На Сави се спроводила одбрана од поплава 5 дана, од 05.06. до 11.06. на укупно 10,22 km, од Прогара до Купинова и код Кленка.
- На Тамишу се спроводила редовна одбрана од поплава, од државне границе до Томашевца на укупно 61,64 km, од 03.06. до 17. 06. (14 дана).
- На Брзави се спроводила одбрана од поплава 03.06. и 04.06. (2 дана) на 36,37 km.
- На Карашцу се спроводила редовна одбрана од поплава на 3,53 km, од 03.06. до 17. 06., 14 дана.
- На Нери се спроводила редовна одбрана од поплава од Врачевог Гаја до ушћа у Дунав од 06.06. и 10.06. (4 дана) на укупно 7,18 km.
- На Надели се спроводила одбрана од поплава на 2,3 km од 05.06 до 17.06. укупно 12 дана.
- На ХС ДТД се спроводила редовна одбрана од поплава од Кајтасова до ушћа у Дунав од 06.06. и 10.06. (4 дана) на укупно 12,03 km .

Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава од спољних вода у 2019. години износи 2,73 милиона динара.

Табела бр. 2.4.1.1: Трошкови одбране од поплава у 2019. години

Р. Б.	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (02.05. -22.05.2019.)	ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (31.05. -20.06.2019.)	УКУПНО
1.	„Западна Бачка“ Сомбор		54.127,99	54.127,99
2.	„Шајкашка“ Нови Сад		661.550,15	661.550,15
3.	„Горњи Банат“ Кикинда		104.967,94	104.967,94
4.	„Средњи Банат“ Зрењанин	404.550,43	647.035,87	1.051.586,30
5.	„Тамиш-Дунав“ Панчево		175.389,31	175.389,31
6.	„Подунавље“ Ковин		290.246,99	290.246,99
7.	„Ушће“ Бела Црква		76.630,56	76.630,56
8.	„Галовица“ Земун		317.878,18	317.878,18
	УКУПНО:	404.550,43	2.327.826,99	2.732.377,42

У 2019. години извршена је набавка опреме за одбрану од поплава у вредности од 411,81 хиљада динара. Набављени су палетни регали за централни магацин за смештање опреме, материјала и алата за одбрану од поплава.

2.4.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

У периоду јануар-децембар 2019. године на хидромелиорационим системима за одводњавање на којима су се стекли услови, у складу са Републичким оперативним планом за одбрану од поплава за 2019. годину, спроводила се одбрана од поплава од унутрашњих вода.

У ноћи 19.05. на 20.05.2019. године на подручју АПВ дошло је до појава кише великог интензитета у временском интервалу од неколико сати и то: Кикинда 66 l/m², Зрењанин 58 l/m², Палић 36 l/m², Банатски Карловац 28 l/m² и Нови Сад 26 l/m², у осталим деловима пало је између 10-16 l/m² што је изазвало превлаживања, а у депресијама и задржавање воде на пољопривредном земљишту. У насељеним местима са недовољно уређеном атмосферском канализацијом дошло је до краткотрајног задржавање воде. Падавине које су пале 21.05.2019. биле су неравномерно распоређене са пљусковима који су имали локални карактер, те их већина метеоролошких станица није ни забележила, али су на одређеним деловима биле значајне.

Такође, 22. и 23. 06. 2019. године забележене су падавине локалног карактера које су захватиле делове Тисе код Титела и Книћанина где је забележено од 92-120 l/m², док је на Дунаву-Карашцу код Ченте пало 134 l/m² кише.

С обзиром на екстремне падавине које су биле неравномерно распоређене, у појединим хидромелиорационим системима дошло је превлаживања и плављења депресија и најнижих делова пољопривредног земљишта, због чега је проглашена одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Редовна и ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода спроведена је на појединим хидромелиорационим системима у складу са критеријумима из Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину у три периода:

- од 21.05-19.06.2019. на водним јединицама „Шајкашка-Нови Сад“, „Источни Срем“, „Подунавље-Ковин“, „Средњи Банат-Зрењанин“, „Дунав-Бачка Паланка“, „Босут-Сремска Митровица“ и „Сава-Мачванска Митровица“.
- од 24.06-17.07.2019. на водним јединицама „Шајкашка-Нови Сад“, „Средњи Банат-Зрењанин“, „Тамиш-Дунав-Панчево“ и „Горњи Банат-Кикинда“.
- од 29.11-20.12.2019. на водној јединици „Сента-Сента“ (одбрана од поплава је проглашена јер делови каналске мреже хидромелиорационих система привремено нису били у функцији услед извођења радова на постављању међународног гасовода).

За време одбране од поплава у водопривредним предузећима организована су дежурства теренских екипа за контролу стања објеката и система, а на терену се интервенисало по потреби. Механизација је интервенисала ради уклањања биљне вегетације из корита канала, отклањања чепова и уских грла у каналима и пропустима, а по потреби су ангажовани и мобилни агрегати.

Хидромелиорациони системи нису димензионисани да у кратком временском периоду приме и одведу велике количине падавина.

Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода износе 58,86 милиона динара (Прилог бр. 4.).

Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода у 2019. години, на подручју за које је задужено ЈВП „Воде Војводине“, износи 61,59 милиона динара (Прилог бр. 4 на страни 77 Извештаја).

2.5 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, која су за 2019. годину предвиђена у износу од 68 милиона динара.

До 31.12.2019. извршени су радови у вредности 52,75 милиона динара. Преостали радови (до уговорених износа), биће реализовани до априла 2020. године.

Табела бр. 2.5.1: Преглед извршених радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. Б.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОДНА ЈЕДИНИЦА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	ИЗВРШЕНО	% 4 : 2
1	2	3	4	5	
1	Регионални подсистем Тиса-Палић и Црпна станица „Калоча“	Северна Бачка	13.100.000	13.091.803	100%
2	Регионални подсистем Кикинда	Горњи Банат	11.000.000	11.000.000	100%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	Средњи Банат	7.500.000	1.924.351	26%
4	Регионални подсистем Надела	Тамиш Дунав	11.000.000	7.065.882	64%
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	Бачка	7.000.000	3.196.181	46%
6	Регионални подсистем Плазовић	Западна Бачка	1.500.000	1.499.544	100%
7	Регионални подсистем Ада	Сента	5.000.000	3.431.030	69%
8	Црпна станица „Песир“	Горњи Банат	5.800.000	5.798.454	100%
9	Црпна станица „Јегричка“	Дунав	6.100.000	6.100.000	100%
УКУПНО:			68.000.000	53.107.245	78%

2.6 ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ

Вредност извршених радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација је финансирана средствима Буџета АПВ, у периоду 01.01-31.12.2019. године износи 114,84 милиона динара, и то:

- 71,23 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката, чија реализација је финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину;
- 31,14 милиона динара радови на изградњи и капиталном одржавању водних објеката, чиме је заједно са реализацијом из 2018. године (550,12 милиона динара), у потпуности реализован програм изградње и капиталног одржавања водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину;
- 12,47 милиона динара радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката у периоду, чија реализација је финансирана средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за 2016. годину). У претходном периоду су реализовани радови у вредности 147,32 милиона динара и то: 65,48 милиона динара у 2018. години, 44,82 милиона динара у 2017. години и 37,02 милиона динара у 2016. години.

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд) извршени су радови у вредности 14,04 милиона евра.

2.6.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

И Уговором бр. 104-401-170/2019-08 од 31.01.2019. године између АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 86,73 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће се финансирати средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину.

До 31.12.2019. потписани су уговори са ЕПС за изградњу далековода за прикључење нових црпних станица и уговор за санацију пропуста испод пута Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово и уређење и решавање проблематике канала Делта I-64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200.

Уговор за радове на санацији бране Манђелос потписан је 06.11.2019., а радови ће бити изведени током 2020. године.

Табела бр. 2.6.1.1: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ – 2019.

УГОВОР СА АПВ	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (СА ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ ДО 31.12.2019. (СА ПДВ-ом)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104- 401/170/201 9-08 31.01.2019 РОК за реализациј у 31.12.2019.	86.732.000	Далековод 20 kV за ЦС Крстур	Нови Кнежевац	19.806.000	19.805.315	19.805.315	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Манђелос 3	Сремска Митровица	4.959.000	4.958.392	4.958.392	аванс 100%
		Далековод 20 kV за ЦС Песир по анексу уговора	Падеј	367.000	366.199	366.199	100%
		Санација пропуста испод пута Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово	Банатско Аранђелово	9.600.000	9.542.174	9.540.012	100%
		Санација бране Манђелос (Врањаш)	Сремска Митровица	15.000.000	14.993.703		
		Уређење и решавање проблематике канала Делта I- 64 (реципијената отпадних вода) од km 8+272 до km 15+200	Врбас	37.000.000	36.559.641	36.559.641	100%
				86.732.000	86.231.424	71.229.560	

II Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 16.01.2017. године између АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 165 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства треба да се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. Поступци јавних набавки за 2 пројекта који се понављају су у завршној фази. Рок за реализацију уговора је 30.06.2019. године.

До 31.12.2019. године закључени су уговори у укупној вредности од 161,08 милиона динара, а вредност извршених радова износи 159,79 милиона динара (од тога 147,32 милиона динара су радови изведени у 2018. години).

Табела бр. 2.6.1.2: Преглед радова финансираних средствима Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ОМ)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (СА ПДВ-ОМ)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ОМ)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ ДО 31.12.2019. (СА ПДВ-ОМ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.06.2019.	163.234.133	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање ЦС Панонија	38.000.000	10.800.000	10.789.310	10.389.356
		поправке и ремонти електро мотора за све ЦС - годишњи уговор	6.000.000	6.000.000	5.992.020	100%
		Упуштач на ЦС Бисерно острво	2.600.000	2.352.000	2.352.000	100%
		ЦС Модран II - пумпа	16.800.000	16.452.186	16.452.186	100%
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22.000.000			
		Тиса - Палић		2.700.000	2.700.000	100%
		Киkinда		6.000.000	6.000.000	100%
		Нова Црња-Житиште		2.700.000	2.700.000	100%
		Надела		6.000.000	6.000.000	100%
		Кула - Мали Иђош		2.700.000	2.699.661	100%
		Плазовић		1.900.000	1.900.000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105.000.000			
		хитна интервенција по налогу инспекције-санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад -Бегеч km 44+065 до km 48+045	17.047.671	17.047.671	16.798.204	100%
		темељи за стубове мобилне опреме у „Лука Нови Сад“	17.100.000	14.319.858 Додатни радови 1.092.118	15.411.702	100%
		суфинансирање са Општином Бечеј (30.000.000 Општина 52.000.000 Воде Војводине)	77.375.058 део 52.000.000	52.000.000	75.994.554 део 51.368.542	100%
		Новокнежевачки наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4	17.904.159	17.904.159	17.904.159	100%
		Новокнежевачки наставак: табласте уставе Т1 и Т2	1.120.406	1.120.406	1.120.406	100%
			163.234.133	160.827.649	159.787.719	

2.6.2 ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

Уговором бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су новчана средства у износу од 600 милиона динара за изградњу и капитално одржавање водних објеката из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину. Ова средства су обезбеђена из примања из домаћег задуживања, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину број: 401-43/2018-01.

До 31.12.2019. године уговорени су радови у вредности 582,61 милиона динара, а вредност извршених радова износи 581,26 милиона динара (од тога 550,12 милиона динара радови изведени у 2018. години, а 31,14 милиона динара радови изведени у периоду 01.01-30.06.2019.).

Табела бр. 2.6.2.1: Изградња и капитално одржавање водних објеката

УГОВОР СА АПВ	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ОМ)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (СА ПДВ-ОМ)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (СА ПДВ-ОМ)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ ДО 31.12.2018. (СА ПДВ-ОМ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ - 2018. бр. 104-401-5383/2018-08 од 17.07.2018. Рок за реализацију 31.12.2018.	600.000.000	Санација критичног места на л. о. реке Саве од km 120+947 до km 121+277 у зони Гомолаве - обалоутврда	Сремска Митровица	242.000.000	241.918.268	240.705.602	100%
		Санација критичног места на л. о. Дунава на локалитету цс Лабудњача	Оџаци	159.000.000	158.986.830	158.986.830	100%
		Реконструкција ЦС Бездан 2	ХсДТД	90.000.000	72.759.876	72.616.904	100%
		Ревитализација канала Врбас-Бездан (Велики Бачки канал) од km 35+000 до km 47+000	ХсДТД	109.000.000	108.948.889	108.948.889	100%
					600.000.000	582.613.863	581.258.225

2.6.3 СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ – ПРОГРАМ АБУ ДАБИ ФОНД

Током 2017. спроведене су процедуре јавних набавки и изабрани извођачи радова из имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд АБУ ДАБИ ФОНД), за 11 пројеката (локација).

Извођачи су уведени у посао у пуном обиму после уплате аванса од стране АДФ у октобру 2017. године. Рокови за завршетак пројеката су до краја 2018. године, осим за радове на ЦС Јегричка, ЦС Песир и регионални подсистем Кикинда, чији је рок за завршетак 15.04.2019.

До 31.12.2019. укупни степен реализације програма је 100% (10.979.625 ЕУР).

У току су радови на главном каналу подсистема Кула-Мали Иђош од km 10+320 до km 15+300. Рок за завршетак посла је 01.03.2020. године.

Степен готовости на дан 31.12.2019. године износи 85%,

Табела бр. 2.6.3.1: Преглед радова финансираних из средстава АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ЕУР (без ПДВ)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ДО 31.12.2019. ЕУР (без ПДВ)	СТЕПЕН ГОТОВОСТИ
1	Двонаменски систем Међа	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	141.917	129.015	100%
2	Двонаменски систем Итебеј	Житиште	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	280.457	260.911	100%
3	Двонаменски систем Јанков Мост I и II	Зрењанин	ВП Средњи Банат, Зрењанин 20.07.2017.	312.948	284.498	100%
4	Двонаменски систем Речеј	Црвенка, Кула	ВП Бачка, Врбас 20.07.2017.	186.986	186.413	100%
5	ЦС Јегричка	Лалић, Озаци	конзорцијум ВП Хидросрем, ВП Регулације, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	707.970	707.840	100%
6	ЦС Песир	Падеј, Кикинда	конзорцијум ВП Регулације, ВП Хидросрем, Ср. Митровица Еко инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	510.125	506.618	100%
7	ЦС Калоча - подсистем Ада	Ада	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Раско Тамп, Сента Еко Инжењеринг, Нови Сад 03.08.2017.	906.624	906.624	100%
8	Подсистем Тиса - Палић	Биково, Суботица	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Дубрава, Бајмок Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 03.08.2017.	4.748.042	4.748.042	100%
9	Подсистем Нова Црња - Житиште	Нова Црња	ВП Средњи Банат, Зрењанин 03.08.2017.	430.360	407.492	100%
10	Подсистем Кикинда - ЦС Мокринска II	Мокрин, Кикинда	конзорцијум ВП Горњи Банат, Кикинда Технобор, Кикинда Бин-Инг, Београд Еко Инжењеринг, Нови Сад 12.10.2017.	1.799.515	1.798.438	100%
11	Подсистем Мали Иђош	Кула, Мали Иђош	конзорцијум ВП Северна Бачка, Суботица Екстра Аутотранспорт, Кула ЦМТ, Београд 12.10.2017.	1.044.287	1.033.549	100%
			ЕУР	11.069.232	10.979.625	100%
12	Подсистем Мали Иђош од km 10+310 до km 15+300 (коначна фаза)	Мали Иђош	конзорцијум Екстра Аутотранспорт, Кула ВП Северна Бачка, Суботица 26.10.2018.	3.621.021	3.061.013	85%
			ЕУР	14.690.254	14.040.638	

2.7 ЗАШТИТА ВОДА

Квалитет и заштита вода на територији АПВ представљају изузетно комплексно и хетерогено питање због великог броја и разноликости загађивача на водотоцима различитих хидролошких карактеристика – од природних водотока са великим протицајима до система канала изузетно мале проточности.

У области заштите вода, у периоду 01.01-31.12.2019. године, реализоване су следеће активности:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања у складу са ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Вредност извршених радова је 4,14 милиона динара. Закључени су уговори са ПМФ Нови Сад за услуге испитивања стања квалитета воде и седимента каналске мреже које је ван програма Агенције у 2019. години, а вредност реализованих послова износи 4,8 милиона динара.

2. Преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде, поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Чепарево, прати се директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са предузећем „Индас“ извршен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима. Оспособљавање није у потпуности реализовано због проблема са мобилним оператером. Вредност извршених послова износи 341,4 хиљада динара.

3. У извештајном периоду, у делу пословања који се односи на издавање водних докумената (услови, сагласности, дозволе), обрађено је 385 предмета (захтева), од тога се 313 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 72 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола.

4. Настављена је попуна Катастра загађивача, редовно се ажурирају резултати хемијских анализа отпадних вода и подаци о количинама захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 3.995 хемијских анализа и 4.458 података о количини захваћене и испуштене воде.

5. Коначни обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2018. годину и аконтација за 2019. годину урађен је у складу са Методологијом и Законом о висини накнада. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе), неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима и то:

а. 148 подлога за коначни обрачун накнаде за прихватање употребљених вода за 2018. годину у износу од 280,6 милиона динара.

б. 13 подлога за коначни обрачун накнаде за захватање вода за 2018. годину у износу од 6,97 милиона динара и аконтације за 2019. годину у износу од 5,99 милиона динара.

Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнада за заштиту вода и коришћење вода. У том делу издате су:

а. 248 подлога за коначни обрачун накнаде за испуштену отпадну воду у 2018. години у износу од 90,07 милиона динара и 253 подлоге за аконтацију за 2019. годину у износу од 182,09 милиона динара.

б. 382 подлога за коначни обрачун накнаде за захватање вода индустрије из површинских водотока и бунара у 2018. години у износу од 450,54 милиона динара и 413 подлога за аконтацију за 2019. годину у износу од 469,56 милиона динара.

Обрађено је 49 жалби на издата коначна ређења за 2018. годину и аконтативна решења за 2019. годину.

6. У оквиру активности везано за управљање отпадом извршена су испитивања врста и количине отпада који се генерише у Предузећу. Добављач за предметну услугу је Институт за заштиту на раду а.д. из Новог Сада. извршено је узорковање и испитивање отпада на следећим локацијама:

- Нови Сад – зграда – електронски и електрични отпад;
- Нови Сад- Радна јединица НС - отпадно уље;
- Преводница Бездан- отпадно гвожђе;
- Зрењанин - магацин ВДП «Средњи Банат» - конденз. батерије које садрже ПЦБ;
- Ковин - Црпна станица Скореновац - конденз. батерије које садрже ПЦБ.

Испоручено је и продато 60 t отпадног гвожђа, насталог заменом капије на преводници Бездан.

7. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала ХС ДТД Бечеј-Богојево нису се одвијале предвиђеном динамиком, првенствено се мисли на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици «Витал» из Врбаса.

8. У 2019. години десило се више хаваријских загађења на водотоцима у надлежности ЈВП «Воде Војводине».

а. Хаваријско загађење канала Хс ДТД Бечеј-Богојево - хаварија је трајала неколико дана уз појаву масовног помора рибе. Запослени ЈВП «Воде Војводине» су свакодневно портабл инструментима радили хемијске анализе на лицу места и пратили ток загађења.

б. Хаваријско загађење Старог Бегеја на румунској граници које се протегло дуж канала Хс ДТД према Банатској Паланци. Ово загађење се одразило на квалитет воде Наделе, па је у сарадњи са ВП «Тамиш-Дунав» Панчево, до проласка таласа заустављено наводњавање на подручју Панчева.

с. У више наврата десило се загађење водотока Криваја на целом току.

У свим наведеним случајевима обавештени су надлежни органи, Покрајинска водна инспекција и Покрајинска инспекција за заштиту животне средине, а ангажована је и акредитована лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде. У случају Старог Бегеја и канала Бечеј-Богојево ангажована је и Републичка агенција за заштиту животне средине.

9. У 2019. години није било радова на санацији хаваријских загађења вода ангажовањем трећих лица.

2.8 ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И КАТАСТАР ВОДНИХ ОБЈЕКТА

У извештајном периоду активности у области уређења и коришћења водног добра, одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова за изградњу или реконструкцију објекта, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола сходно Закону о водама и другим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објекта и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

У области израде водних аката, током извештајног периода, примљено је укупно 1.117 нова захтева, и то:

- 522 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 493 захтева у редовном поступку,
- 102 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта.

Обрађено је укупно 1.348 захтева:

- 502 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре,
- 316 захтева у редовном поступку,
- 123 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објекта,
- 407 захтева из претходног периода.

Такође, припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа подручним водопривредним предузећима, другим организационим деловима унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуна према водопривредним предузећима и др.)

Табела бр. 2.8.1: Преглед обрађених и издатих докумената

Укупно запримљених предмета	1.117
У обједињеној процедури	522
У редовном поступку	493
Озакоњење	102
Врста захтева, документа – укупно завршено	1.348
Мишљења у поступку издавања водних услова	168
Водни услови	408
Решење водне сагласности	32
Решење о водној дозволи	66
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	12
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	13
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	21
Акт о ненадлежности	1
Остало (озакоњење, дописи, ...)	627
Подлога за решавање имовинских правних односа	91
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	96
Издатих подлога за обрачун ВП	142

У извештајном периоду године, наплаћена су средства за трошкове пружених услуга из предметне области у износу од 32,45 милиона динара.

2.9 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Послови у области међународне сарадње, као послови од општег интереса финансирани су средствима буџета Републике Србије, а у ЈВП „Воде Војводине“ реализују се у Служби за међународну сарадњу и кроз активно учешће стручњака из других организационих делова.

ЈВП „Воде Војводине“ је закључило уговор са Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Републичком дирекцијом за воде о обављању послова међународне сарадње 07.06.2019. на период од годину дана.

Претходно је донета Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2019. („Службени гласник РС“, број 12/19) и испуњене су све законске процедуре пре закључивања уговора (Закључак Владе Републике Србије).

Уговор закључен 2018. године важио је до 16.05.2019. године.

Најзначајнији послови у области међународне сарадње реализовани у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности свих учесника у реализацији послова међународне сарадње - ЈВП „Воде Војводине“, Агенција за заштиту животне средине, РХМЗ Београд, надлежна водопривредна друштва и др. Праћење реализације преузетих обавеза, које су претходно биле договорене на састанцима радних група, поткомисија или кроз редовну кореспонденцију секретара или председника билатералних комисија;
- Закључење уговора са подизвођачима за специфичне послове (превођење, праћење радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском, израда стручних елемената за потребе међународне сарадње) и анекса основног уговора са водопривредним друштвима;
- Учесће у анализи и припреми текста новог билатералног Споразума у области управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса са Мађарском. Одржан је четврти оперативни састанак (22-24.01.2019.) на нивоу експертских тимова на којем је усаглашен предлог текста новог Споразума. Министри за водопривреду Републике Србије и Мађарске 15.04.2019. у Суботици и министри за водопривреду Републике Србије и Румуније 05.06.2019. у Букурешту, потписали су нове споразуме у области управљања прекограничним водама, после чега су у државама започете процедуре за ратификацију;
- Одржавање састанака и извршење преузетих обавеза у оквиру рада Српско-мађарске комисије за водопривреду, до термина одржавања XLII заседања реализовано је према усаглашеној динамици. XLII заседање Српско-мађарске комисије за водопривреду је одржано на Златибору у периоду 08-10.04.2019. године. На Заседању је разматран рад поткомисија и степен извршења закључака Комисије у периоду од септембра 2015. до марта 2019. године и усаглашене су обавезе за наредни период. Владе Републике Србије и Мађарске одобриле су Записник са заседања у целости. После одобрења Записника са заседања извршене су припреме и одржани сви планирани састанци;
- У оквиру рада Српско-румунске хидротехничке комисије одржани су редовни заједнички прегледи објеката за одбрану од поплава и леда на обе територије, ради оцене стања и спремности за евентуалну одбрану од поплава. Анализирана је документација и допуна документације која се односи на повећање капацитета ретензије Гертениш (налази се у заједничком правилнику за одбрану од поплава), на реци Брзави на територији Румуније. Надлежне поткомисије за одбрану од поплава и газдовање водама и РХМЗ су израдиле своја мишљења у вези достављених документација. Крајем октобра одржан је и састанак стручњака обе стране у вези планираних радова на ретензији Гертениш после чега је дата сагласност румунској Страни за извођење радова;
- 29.11.2019. године у Букурешту је одржан састанак представника надлежних институција Републике Србије и Румуније у области одрживог управљања прекограничним водама. Најважнији резултат састанка је договор да се у првој половини 2020. године одрже састанци свих поткомисија као припрема за наставак и унапређење билатералне сарадње после ступања на снагу новог међудржавног Споразума.
- Оперативни послови мониторинга квалитета и квантитета вода са Румунијом и Мађарском реализовани су у договореним терминима.

2. У области **трилатералне и мултилатералне сарадње:**

- У оквиру трилатералне сарадње Србије, Мађарске и Хрватске у вези одбране од леда на Дунаву, 29-30.01.2019. одржан је састанак председника Српско-мађарске комисије за водопривреду и председника Сталне мађарско-хрватске комисије за водопривреду. На састанку су разматрана и утврђена основна начела сарадње на пољу одбране од леда на Сектору Дунава од заједничког интереса од Дунавфелдвара (rkm 1.560) до Вуковара (rkm 1.333). Српско-мађарска комисија за водопривреду је на XLII заседању одобрила начела за реализацију;
- У интересу интегралног спровођења евентуалне одбране од ледених поплава на сектору Дунава од заједничког интереса за зиму 2019/2020. одржан је редовни обилазак бродом Дунава на Сектору од заједничког трилатералног интереса и редовни припремни састанак централних и локалних органа за везу и стручњака Србије, Мађарске и Хрватске.
- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“, по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских/радних група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Међународна комисија за заштиту слива Саве - Савске комисије. У септембру је одржан састанак координатора из институција које учествују у реализацији обавеза, на којем су предложени принципи за будући рад и учешће стручњака из Републике Србије у обе комисије. У складу са раније договореним састављен је иновирани списак стручњака који ће наставити рад у наведеним међународним комисијама;
- Стручна припрема свих састанака, израда предлога за преговоре, исховање решења, израда извештаја са састанака и о стању реализације обавеза, дистрибуција материјала, обезбеђење превозилаца у циљу одржавања билатералних састанака, итд. реализовани су у континуитету.
- Израђена су три захтева ЈВП „Воде Војводине“ и упућена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде, како би се наплатили послови реализовани по уговору за 2018. и 2019. годину. Захтев за пренос средстава за реализоване послове за период од 01.12.2018. до 16.05.2019, односно до датума истека уговора закљученог 2018. године, испостављен је на износ од 3,8 милиона динара. Вредност укупно извршених и наплаћених послова по уговору за 2019. годину, закључно са новембром, износи 15,5 милиона динара. Реализовани, а ненаплаћени послови из децембра 2019. биће обрачунати и достављени на исплату ресорном Министарству у 2020. години на основу важећег уговора.

Послови и задаци из области међународне сарадње који су поверени ЈВП „Воде Војводине“ од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, а тичу се билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом, трилатералне и дела мултилатералне сарадње, реализовани су у пуном обиму и у складу с предвиђеном динамиком.

2.10 УПРАВЉАЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

ЈВП „Воде Војводине“ управља и брине о заштићеним и рибарским подручјима.

ЈВП „Воде Војводине“ брине о три заштићена подручја, и то:

- Парк природе Јегричка,
- Парк природе Бељанска бара и
- Споменик природе Храст лужњак.

ЈВП „Воде Војводине“ су добиле на коришћење следеће делове рибарских подручја:

1. Део рибарског подручја „Срем“ и то риболовне воде: Дунав од Бачке Паланке до Бешке (од km 1.297 до km 1.233), осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
2. Део рибарског подручја „Банат“ и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа, Бегеј, Златица и Караш, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
3. Део рибарског подручја „Бачка“ и то риболовне воде: Основна и детаљна каналска мрежа и акумулација „Чонопља“, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја;
4. Река Криваја.

2.10.1 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

У оквиру реализације пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области“ - ЕСОWAM из ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у извештајном периоду реализоване су следеће активности:

- Радови на измуљивању и разастирању седимента из водотока Јегричка, на стационажама од km 29+588 - km 37+892 и km 44+015 - km 46+673 у вредности 59 милиона динара (од тога 32,36 милиона динара изведено у 2018. и 26,64 милиона динара у 2019. години).
- Радови на изградњи инспекционе и шетне стазе на десној обали Јегричке у Сиригу дужине 1.500 m у вредности 30 хиљада евра (3,53 милиона динара).
- Набављена је мултифункционална амфибијска машина за кошење акватичне вегетације, чија је вредност 109,8 хиљада евра (12,94 милиона динара).
- Екстерни надзор пројектних активности у вредности 290 хиљада динара.

Закључени су уговори са општинама Темерин и Врбас о обезбеђењу средстава за чишћење и уништавање инвазивних врста у Парку природе „Јегричка“. Извршени су радови у вредности 600 хиљада динара без ПДВ-а (300 хиљада динара општина Темерин и 300 хиљада динара општина Врбас).

У кругу Информативног центра „Јегричка“, извршени су неопходни радови на одржавању и поправкама постојећег заливног система у вредности од 197 хиљада динара без ПДВ-а (средства ЈВП).

У циљу побољшања и очувања рибљег фонда, риболовног подручја Парка природе „Јегричка“, реализовано је порибљавање са 100 kg шаранске млађи у вредности од 45,9 хиљада динара и риболовног подручја Парка природе „Бељанска бара“ са 400 kg шаранске млађи у вредности 183 хиљаде динара. Ове активности су финансиране сопственим средствима ЈВП „Воде Војводине“.

Од продаје годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, остварен је приход у износу од 1,03 милиона динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарских подручја у износу од 140 хиљада динара и ПДВ у износу од 234 хиљаде динара.

Од продатих улазница, едукативних часова и вожње катамараном и чамцима остварени су приходи у износу од 260,21 хиљада динара.

2.10.2 РИБАРСТВО

У области рибарства ЈВП „Воде Војводине” бави се пословима:

- управљања уступљеним рибарским подручјем;
- организовања и предузимања мера за очување и заштиту рибљег фонда;
- порибљавања рибарског подручја;
- организовања чувања рибарског подручја;
- издавања дозвола за риболов;
- предузимања мера за унапређење риболовних активности и риболовног туризма на рибарском подручју;
- мониторинга рибарског подручја;
- организовања едукације рекреативних риболоваца;
- прикупљања и обраде података од значаја за управљање и коришћење рибарског подручја и достављањем истих надлежним органима;
- прикупљања података потребних за подношење пријава за привредни преступ и захтева за покретање прекршајног поступка и
- осталим активностима и обавезама проистеклим из Програма управљања и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

Надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји: Извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2019. годину, Извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за први, други и трећи квартал 2019. године и Извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима за 2018. годину.

До 31.12.2019. године продато је 8.075 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 25 дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 38,04 милиона динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 9,95 милиона динара и ПДВ у износу од 6,34 милиона динара. Остатак средства је искоришћен за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

За потребе реализације Програма у области рибарства реализоване су следеће активности:

- Набављено је пет нових ванбродских мотора у вредности 2,50 милиона динара, два пластична и један алуминијумски чамац у вредности 960 хиљада динара, универзална самоходна машина за уклањање вегетације у вредности 8,64 милиона динара, опрема за рибочуварску службу у вредности 1,2 милиона динара, техничка опрема за рибочуварску службу у вредности од 2,3 милиона динара, путнички и теренски аутомобил у вредности 3,6 милиона динара, приколица за чамце у вредности 475 хиљада динара, обележја риболовног подручја у вредности 624 хиљада динара. Све вредности су дате са ПДВ-ом.
- Извршене су услуге праћења (мониторинга) стања рибљег фонда у вредности 5,66 милиона динара, израда риболовних места у вредности 2,35 милиона динара, праћење здравственог стања рибе у вредности 77,14 хиљада динара. Све вредности су дате са ПДВ-ом.
- Набављена је опрема у вредности 274,4 хиљаде динара (обележја и алат за привредни риболов у вредности 59,4 хиљаде динара и опрема за пловне објекте у вредности 215 хиљада динара).
- Уговорене услуге физичко-техничко обезбеђење рибарског подручја у вредности 18,32 милиона динара,
- Извршено порибљавање са 13 t рибље млађи, чија је вредност 6,56 милиона динара.

Добијена је сагласност на и Годишњи програм управљања рибарским подручја „Срем”, „Банат” и „Бачка” за 2020. годину и Годишњи програм управљања рибарским подручјем риболовне воде реке Криваје за 2020. годину

Током 2019. године остварено је више од 2.400 контрола риболовног подручја под ингеренцијом ЈВП „Воде Војводине” и преконтролисано више од 8.000 риболоваца. Приликом контрола заплењено је више од 63 километара нелегално постављених мрежа и 150 комада другог недозвољеног алата за риболов. Против 14 особа поднете су прекршајне пријаве због нелегалног риболова.

2.10.3 ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-децембар 2019. године изведени су радови на пошумљавању – реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума. Услед специфичности радова на пошумљавању, који могу да се изводе само у време ванвегетационог периода, део радова ће бити изведен у првом кварталу 2020. године.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а до сада су, поред ангажовања референата за шумарство, вршени радови на припреми терена за пошумљавање и пошумљавање које је извршено на површини од 5,91 ha и попуњавање на 1 ha. Укупна вредност изведених радова износи 3,93 милиона динара.

У оквиру радова на репродукцији шума, поред радова на пошумљавању, мерама неге и радова на припреми терена за пошумљавање, извршено је и попуњавање садница. Укупна вредност изведених радова износи 16,34 милиона динара.

Санитан је ветролом у ГЈ „Хртковци-Јамена“ ГЈ „Тамиш-Тиса“ Зрењанин и ГЈ „Дунав“.

У Радној јединици „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оџаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин, ГЈ ОКМ Вршац извршени су радови на пошумљавању и то: евроамеричком тополом, багреном и сибирским брестом. Укупно је извршено пошумљавање на 86,65 ha, чија вредност износи 8,31 милиона динара, као и радови на припреми терена, на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова за период јануар-децембар 31,74 милиона динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 2,47 милиона динара на подизању, нези, наводњавању и заштити нових садница.

У претходном периоду је завршена Основа за ГЈ „Дунав“ и потребно је још исходovati Решење о сагласности на од стране Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У потпуности су завршене Основе за газдовање шумама за ГЈ „Посавље“ Шабац и ГЈ „Шидина“ Шид. У току је припрема извода истих ради усвајања од стране надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, након чега ће и за ове основе бити исходована Решења о сагласности од стране покрајинског секретаријата.

3. РАЗВОЈ

3.1 РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Учешће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, и израда студијско-истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности - у оквиру израде Плана управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије за период 2021-2027, радна група за израду елемената за планове управљања водним подручјима је током 2019. године наставила активности по појединим областима:

- прикупљање, ситематизовање и обрада података;
- анализа свих релевантних података који се односе на хидроморфолошке и друге притиске и утицаје на водотоке и подземне воде у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније;
- карактеризација планског подручја за површинске и подземне воде;
- анализа постојећег и планирање будућег мониторинга вода;
- утврђивање значајних притисака на површинске и подземне воде са оценом статуса и проценом ризика;
- економска анализа коришћења вода са значајним питањима управљања водама;
- утврђивање циљева животне средине, као и програм мера;
- учешће јавности у доношењу и спровођењу планова управљања.

С тим у вези настављене су активности на **Развоју и одржавању Web-GIS апликације и изради модула за имплементацију и вођење Водног информационог система**. Уз сарадњу са фирмом GDi GISData, настављене су следеће активности на имплементацији водног информационог система у ЈВП „Воде Војводине“:

- Настављен је рад на Web-GIS апликацији. Унос података за радове на детаљној каналској мрежи је омогућен преко апликације са директним прегледом на карти за све кориснике Web-GIS апликације и директним пуњењем базе ЈВП „Воде Војводине“. Приступа се фази припреме за директан унос елемената из елабората радова Водопривредних предузећа.
- Омогућено је повезивање са Oracle базом података и размена података са ЈВП „Србијаводе“.

Током јуна 2019. године реализовано је и прво студијско путовање у оквиру твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ у коме је учествовало 6 представника радне групе за ПУВ.

Крајем 2019. године започете су активности на изради Акционог плана за спровођење стратегије управљања водама на територији републике Србије до 2034. године. С тим у вези формирана је радна група састављена од запослених у Дирекцији за воде, ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“, која ће периодично извештавати Републички секретаријат за јавне политике о начину и степену реализације планираних активности у оквиру Акционог плана.

3.2 УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА СУФИНАНСИРАНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ ДОНАЦИЈА ЕУ

ЈВП реализује пет пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње (од чега два стратешка) и један пројекат ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње.

1. Пројекти из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње:
 - 1.1 Комплексно унапређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA);
 - 1.2 Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.3 Унапређење мониторинга суша и сувишних унутрашњих вода за подршку управљања водама и смањење ризика везаних за екстремне временске услове (WATERatRISK);
 - 1.4 Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM).
 - 1.5 WetlandRestore - Обнова мочварних подручја у средњем Подунављу.
2. Пројекат из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма транснационалне сарадње - Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе (JOINTISZA);

3. Један пројекат из програма ERASMUS+ - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана (SWARM).

У извештајном периоду у оквиру имплементације наведених пројеката извршена су плаћања у износу од 337,73 милиона динара добављачима:

- За опрему – 36,2 милиона динара;
- За услуге – 21,86 милиона динара;
- За радове – 179,66 милиона динара.

Табела бр. 3.2.1: Преглед реализације набавки у оквиру пројеката ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње

РЕД. БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	НАЗИВ (АКРОНИМ) ПРОЈЕКТА	УГОВОРНА ВРЕДНОСТ	ПЛАЋЕНО ДО 31.12.2018.	ПЛАЋЕНО ДО 31.12.2019.	СВЕГА ПЛАЋЕНО 4+5
1	2	3	4	5	6	7
1	Теренска возила	BABECA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
2	Пловна косачица	BEGA	15.110.366	0	6.040.410	6.040.410
2	Теренска возила	BEGA	3.858.000	3.858.000		3.858.000
3	Хидрографска мерна опрема	BEGA	16.340.000	0	16.340.000	16.340.000
3	ИТ опрема	BEGA	886.020	0	886.020	886.020
3	Ласерски дистомат	BABECA	199.974	199.974		199.974
4	Беспилотна летелица са дозволом	WATER@RISK	4.700.000	4.700.000		4.700.000
5	Кишомер	WATER@RISK				
6	Теренски лап топ	WATER@RISK	1.535.980	1.535.980		1.535.980
7	Радна станица	WATER@RISK				
8	Мултифункционална амфибијска машина	ECOWAM	12.936.329	0	12.936.329	12.936.329
	УКУПНО ДОБРА:		60.266.668	14.993.954	36.202.758	51.196.712
1	Припрема пројектне документације за измуљење и ремедијацију канала Бегеј	BEGA	34.860.000	11.155.200	6.274.800	17.430.000
2	Израда пројектне документације за реконструкцију хидро чворова Клек и Српски Итебеј	BEGA	4.700.000	4.700.000		4.700.000
3	Израда пројектне документације за изградњу радно-инспекционе/бициклистичке стазе	BEGA	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000
4	Израда пројектне документације за изградњу дока и привеза у Зрењанину	BEGA	2.350.000	2.350.000		2.350.000
5	Преводилачке услуге	BABECA	557.377	473.770	83.607	557.377
		BEGA	948.994	106.762	438.245	545.007
6	Екстерни менаџмент пројекта	BEGA	7.092.000	2.127.600	2.127.600	4.255.200
7	Спољни надзор радова	BABECA	10.040.000	2.510.000	6.024.000	8.534.000
		BEGA	6.957.669		1.158.768	1.158.768
8	Експерт за набавке по PraG-u	BABECA	2.050.000	1.537.500		1.537.500
		WATER@RISK	290.000		290.000	290.000
9	Организација догађаја и промоција пројекта	WATER@RISK	765.035	0	764.192	764.192
	УКУПНО УСЛУГЕ:		75.311.075	24.960.832	21.861.211	46.822.044
1	Преводница Шебешфок - поправка, надоградња и адаптација чуварнице	BABECA	330.589.280	106.218.335	194.833.277	301.051.612
2	Преводница Бездан - реконструкција и поправка	BABECA				
3	Уређење обале и изградња плутајућег привеза у Зрењанину	BEGA	68.887.086		54.665.376	54.665.376
4	Измуљење Јегричке	ECOWAM	59.002.650	32.362.954	26.639.696	59.002.650
5	Изградња радно-инспекционе/шетне стазе	ECOWAM	3.525.763	0	3.525.763	3.525.763
	УКУПНО РАДОВИ:		462.004.778	138.581.289	279.664.111	418.245.400
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		597.582.522	178.536.075	337.728.081	516.264.156

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу аванса и рефундација трошкова пројектних активности у укупном износу 1,97 милиона евра, и то:

- BEGA – 252,3 хиљада евра;
- BABECA – 1,38 милиона евра;
- ECOWAM – 232,11 хиљада евра;
- WATER@RISK – 54,45 хиљада евра;
- JOINTISZA – 23,45 хиљада евра;
- SWARM – 3,8 хиљада евра;
- WetlandRestore – 20,36 хиљада евра.

Додатни прилив у износу од 4 милиона динара је остварен по основу средстава из Конкурса Покрајинског секретаријата за финансије за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова ЕУ, за пројекат BEGA (Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј) из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија.

3.3 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације, која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање постојећих апликативних решења у информационом систему Предузећа.
- Централизовано управљање свим клијентима на мрежи, било да су то сервери или рачунари, коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- У првом кварталу је реализована набавка сензора за даљинско праћење температуре, влаге и поплаве у Дата центру Предузећа. На овај начин у случају одступања од прописаних вредности систем инжењери се обавештавају путем и мејла и СМС-а, чиме је сигурност информационог система подигнута на виши ниво.
- На УПС уређајима у оквиру Дата центра Предузећа замењене су батерије које су повећале аутономију рада целог система у случају нестанка електричне енергије.
- Имплементирана је security полиса на Домен контролерима која обезбеђује ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- Имплементација модула у оквиру апликације за потребе накнаде за одводњавање физичких лица који покрива пословни процес формирања решења на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта, као и дефинисање и спровођење процедуре како би се обезбедила штампа и дистрибуција решења преко ЈП „Пошта Србије“. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и правна лица на основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима. У оквиру модула омогућено је аутоматско књижење уплата на основу извода рачуна.
- У другом кварталу 2019. године учитани су нови подаци од РГЗ како би се омогућило аутоматско решавање прикупљених жалби на основу достављених решења за три квартала 2018. године. Учитани подаци од РГЗ-а омогућили су проверу да ли су исте површине земљишта које су се налазиле у издатим решењима на које су се обвезници жалили. У зависности од тога да ли је дошло до промена површина апликација је омогућила генерисање нових решења која су за резултат имала измену, поништај или одбијање старих решења.
- Урађена је имплементација модула у оквиру апликација за потребе накнаде за одводњавање физичких и правних лица како би се обезбедио обрачун накнаде по методологији која је дефинисана у новом Закону о накнадама. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и правна лица на основу података о земљишту које се налази у власништву физичких и правних лица према преузетим подацима РГЗ-а и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима.
- У оквиру апликација за потребе накнаде за одводњавање физичких и правних лица урађене су измене у делу обрачуна накнаде по основу Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта према новом Закону о накнадама. У извештајном периоду генерисана су Решења за накнаду за одводњавање за физичка и правна лица на основу података из Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта према подацима

преузетим од Управе за пољопривредно земљиште и реализовано је њихово штампање и дистрибуција обвезницима.

Табела бр. 3.3.1: Преглед реализације у области информационог система

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019.		%
		БЕЗ ПДВ	СА ПДВ	БЕЗ ПДВ	СА ПДВ	
1	Набавке рачунара и рачунарске опреме	9.350.000,00	11.220.000,00	6.396.390,00	7.675.668,00	68,41
2	Набавке софтвера	400.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Одржавање и поправке ИТ опреме	900.000,00	1.080.000,00	900.000,00	1.080.000,00	100,00
4	Лиценцирање софтвера	5.050.000,00	6.060.000,00	2.818.654,00	3.382.384,80	55,81
5	Рачунарске услуге	3.100.000,00	3.720.000,00	1.951.200,00	2.341.440,00	62,94
6	Стручно усавршавање	480.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Набавке за потребе унапређења рада других организационих делова	16.550.000,00	19.835.000,00	15.805.241,47	18.950.817,95	95,50
8	Набавке за потребе ГИС-а	8.560.000,00	10.272.000,00	7.039.118,00	8.446.941,60	82,23
Укупно:		44.390.000,00	53.243.000,00	34.910.603,47	41.877.252,35	78,65

4. ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

Пословање ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години карактеришу бројне активности у домену правних, општих послова и послова у вези са имовином Предузећа.

4.1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ

1. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ ЗАПОШЉАВАЊА

Извршење планираног запошљавања дато је на страни 4 Извештаја.

2. ПРИПРЕМА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Припремљен је и правно обрађен материјал за 13 седница које је у 2019. години одржао Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, а на којима је донета 51 одлука.

3. СУДСКИ ПОСТУПЦИ

Учешће ЈВП „Воде Војводине“ у парничним поступцима дато је у табелама у Прилогу бр. 6: Преглед парничних поступака за 2019. годину, на страни 79 до 83 Извештаја.

- Покренуто је 10 нових поступака извршења ради наплате накнада које су закључно са 2010. годином биле приход ЈВП „Воде Војводине“;
- Поднето је 18 пријава потраживања у стечајним поступцима и 3 пријаве у ликвидационим поступцима покренутим над обвезницима накнада, односно дужницима ЈВП-а, док је у истом периоду окончано 20 стечајних предмета. Са стањем на дан 31.12.2019. године, у раду је 281 предмет стечаја и 35 предмета ликвидације.

4. НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ

Припремљен је предлог Одлуке о измени Статута ЈВП „Воде Војводине“ због обавезе усклађивања овог акта са Покрајинском скупштинском одлуком и измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 8/2019), у остављеном року од 90 дана. Наведеном покрајинском скупштинском одлуком смањен је основни неновчани капитал у пословним књигама овог јавног предузећа за вредност непокретности (пословне зграде и друге непокретности које нису добра од општег интереса) које је Предузеће искњижило из пословних књига, због уписа права јавне својине Покрајине на тим непокретностима. Одлуку о измени Статута ЈВП „Воде Војводине“ Надзорни одбор овог предузећа донео је 27.03.2019. године, а Покрајинска влада је на исту дала сагласност решењем бр. 022-310/2019.

У оквиру покренутог поступка преговарања ради закључивања измена колективног уговора за ЈВП „Воде Војводине“ од 01.06.2018. године, припремљен је предлог анекса овог колективног уговора који су директор ЈВП „Воде Војводине, овлашћени представници репрезентативних синдиката у овом предузећу и овлашћени представник Оснивача, закључили 24.12.2019. године.

5. ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА

- Уговор о осигурању водних објеката, имовине и запослених у ЈВП „Воде Војводине“ за 2019. годину закључен је са ДДОР-ом Нови Сад, са годишњом премијом осигурања од 17,85 милиона динара (са порезом);
- Штете су уредно пријављиване и наплаћене;
- У 2019. години наплаћено је 6,73 милиона динара на основу штетних догађаја и учешћа у позитивном техничком резултату.

6. ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

- Извршени су редовни лекарски прегледи запослених и обезбеђена лична заштитна средства, у складу са Актом о процени ризика и Правилником о безбедности и здрављу на раду;
- Спроведене су обуке запослених за безбедности и здравље на раду, као и основна обука запослених за заштиту од пожара, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од пожара;

- Извршени су редовни сервиси на противпожарним апаратима, хидрантској мрежи и стабилним инсталацијама за дојаву пожара;
- У 2019. години евидентирано је укупно 8 (осам) повреда на раду, при чему су све оквалификоване као лаке повреде на раду. Повреда на раду са смртним исходом није било;
- У току 2019. године није било пожара на објектима и на отвореном простору.

4.2 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ ПРЕДУЗЕЋА

1. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

- У 2019. години спроведени су поступци давања у закуп водног земљишта у јавној својини у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) за вађење речног наноса и у пољопривредне сврхе.
- Током 2019. године закључено је 25 уговора, што чини укупан број од 369 важећих уговора о закупу водног земљишта у јавној својини у 2019. години (намена - вађење речног наноса, сенокос, сенокос и испаша, постављање плутајућих објеката, пољопривредне сврхе, сетва детелине);
- У 2019. години закључено је укупно 75 уговора о установљавању права стварне службености на водном земљишту и водном објекту;
- Донета су подзаконска акта Закона о водама – Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп („Сл. гласник РС“, бр. 40/2019) и Уредба о давању у закуп водног земљишта у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 50/2019), којима је ближе уређено давање у закуп водног земљишта у јавној својини, у смислу предвиђеног поступка и почетне висине закупнине.
- Са лицима која су водно земљиште користила по основу фактичког стања, у 2019. години закључено је 700 уговора у форми вансудског поравнања, у циљу наплате закупнине за коришћење водног земљишта за 2018. и 2019. годину.

2. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ПРЕНОСОМ ВОДНИХ ОБЈЕКТА НА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Закључно са 31.12.2019. године укупно 18 водопривредних предузећа донело је одлуке (са елаборатима) о преносу водних објеката на ЈВП „Воде Војводине“, а ЈВП је донело одлуке о преузимању ових објеката у складу са чланом 219. Закона о водама. Ове одлуке су биле основ за искњижење водних објеката из пословних књига водопривредних предузећа и њихово евидентирање у пословним књигама ЈВП „Воде Војводине“.

На основу одлука о преносу водних објеката на ЈВП „Воде Војводине“ није било могуће брисање водопривредних предузећа из катастра непокретности као корисника, јер надлежне службе траже сагласност Републичке дирекције за имовину РС. Тражену сагласност није могуће прибавити имајући у виду одредбу члана 108. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 101/2016) којом је предвиђено да ће водопривредна предузећа правним послом пренети водне објекте у јавну својину Републике Србије, након чега ће управљање на водним објектима који се налазе на територији АП Војводине, преузети ЈВП „Воде Војводине“. Наведена одредба је у супротности са чланом 219. Закона о водама.

3 ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА УПИСОМ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА КАНАЛИМА КОЈИ НИСУ ДЕО ПЛОВНИХ ПУТЕВА

Закључком Покрајинске владе од 31.12.2014. године ЈВП „Воде Војводине“ је задужено да у име и за рачун АП Војводине, у сарадњи са Управом за имовину, спроведе поступак уписа јавне својине у корист АП Војводине на каналској мрежи на територији Покрајине, која није део пловних путева.

Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018) који је ступио на снагу 16.12.2018. године, упис јавне својине Аутономне покрајине више није условљен прибављањем потврда чије је издавање било у надлежности Републичке дирекције за имовину РС.

У периоду јануар–март 2019. године, ЈВП „Воде Војводине“ прибавило је од Агенције за реституцију потврду да за каналску мрежу на територији Покрајине, која није део пловних путева, није поднет захтев за враћање одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, за сва водопривредна подручја.

До средине априла 2019. године ЈВП „Воде Војводине“ је свим службама за катастар непокретности на територији аутономне покрајине доставило допуне захтева за упис јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине на предметној каналској мрежи, у којима је приложило наведене потврде Агенције за реституцију.

Током 2019. године, на основу допуњених захтева, надлежне службе за катастар непокретности донеле су решења о упису права јавне својине у корист АП Војводине на каналима који не представљају део пловних путева, а који се налазе у к.о. Бођани, к.о. Црепаја, к.о. Уздин, к.о. Дебелача, к.о. Ковачица, к.о. Идвор, к.о. Велики Гај, к.о. Пландиште, к.о. Неузина, к.о. Конак, к.о. Шурјан, к.о. Сечањ, к.о. Крајишник, к.о. Јаша Томић, к.о. Јарковац, к.о. Бока, к.о. Сутјеска, к.о. Банатска Дубица, к.о. Ковин, к.о. Банатска Топола, к.о. Мокрин, к.о. Кикинда, к.о. Иђош, к.о. Руско Село, к.о. Нови Козарци, к.о. Банатско Велико Село, к.о. Наково, к.о. Башаид, к.о. Сајан, к.о. Бочар, к.о. Нови Бечеј, к.о. Кумане и к.о. Ново Милошево.

4. ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ОЗАКОЊЕЊЕМ ВОДНИХ ОБЈЕКТА КОЈИМА УПРАВЉА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), 2010. године поднето је 409 захтева за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе. Поступак озакоњења водних објеката поново је активиран 2018. године у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 и 83/2018). Закључно са 2019. годином прецизирано је 320 захтева.

У току 2019. године повучени су захтеви за озакоњење Система за одводњавање „Слив V - Барице“ и Система за одводњавање „Пландиште IV - Ројга“, из разлога што су ови системи изграђени у складу са прописима по којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и исти системи су уписани у катастру непокретности.

Послато је 140 захтева за издавање листова непокретности, у циљу прибављања и достављања доказа о одговарајућем праву на земљишту или објекту.

5. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ

- Учешће у поступцима комасације (у току су поступци комасације за к.о. Купусина, Ботош, Вршац, Јазак Село, Баранда, Банатско Карађорђево, Раденковић, Марђелос, Шашинци, Моровић, Вогањ, Нештин, Уљма, Влајковац, Скореновац и Плочице);
- Учешће у поступцима експропријације (ради изградње акумулације „Србобран“ на реци Криваји и повезивање акумулације са каналом Хс ДТД „Бечеј–Богојево“, ради изградње насипа на левој обали реке Саве од Хртковаца до Јарка rkm 120+347 до rkm 123+350; ради изградње акумулације „Мали Иђош“ – поступак окончан у новембру 2019. године).
- Учешће у поступцима враћања одузете имовине;
- Прикупљање података за процену ванбилансне имовине ЈВП-а;
- Послови на уносу података у јединствену евиденцију непокретности у јавној својини које користи ЈВП „Воде Војводине“, а у складу са чланом 64. Закона о јавној својини и Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17);
- Достављање података Управи за имовину АПВ о парцелама које су у јавним књигама уписане као грађевинско земљиште са правом коришћења ЈВП-а, ради спровођења конверзије права коришћења у право својине оснивача;
- Припремљено је око 980 одговора на захтеве странака у вези са имовинско-правним питањима.

4.3. ОПШТИ ПОСЛОВИ

1. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПИСАРНИЦА)

У 2019. години писарница ЈВП „Воде Војводине“ је преко пописа аката завела и обрадила 56.214 аката улазне и излазне поште, док је у истом периоду отпремила 39.194 пошиљки. Сва примљена пошта је дневно ажурирана, најкасније 24 часа од пријема и разврставања.

2. ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Послови одбране у 2019. години обухватили су активности на ажурирању података и разради мера одбрамбених припрема, у складу са захтевима Регионалног центра Министарства одбране, а у вези са усклађивањем Плана одбране ЈВП „Воде Војводине“ са Планом одбране Републике Србије, као и наложених мера Инспектората одбране Министарства одбране.
- Послови физичко-техничког обезбеђења обухватили су активности у вези са спровођењем физичко-техничке заштите људи и објеката ЈВП „Воде Војводине“ и њиховим осигурањем, у складу са Правилником ЈВП „Воде Војводине“ који уређује ову област, као и израду Процене ризика угрожености објеката у којима се спроводе послови физичко-техничког обезбеђења. Континуирано је вршен надзор и контрола рада службеника обезбеђења и испуњавање уговорних обавеза.
- За послове физичко-техничког обезбеђења објеката у 2019. години закључен је уговор са „Safe“ д.о.о. Нови Сад, чија вредност је 45,6 милиона динара (са ПДВ-ом).

3. ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

- Одржавана је стална комуникација са органима Сектора за ванредне ситуације и достављани су тражени извештаји и анализе.
- Припремана је подлога за реанализу Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа и обједињене Процене ризика за ЈВП „Воде Војводине“, као и њихово усклађивање са новим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018).
- Израђени су Планови заштите и спасавања за радне јединице Озаци и Сомбор, као организационих делова Предузећа у саставу Сектора за хидросистем ДТД.
- Припремала се подлога за израду Планова заштите и спасавања за Радне јединице Зрењанин и Нови Бечеј
- Припрема се План и програм обуке повереника и заменика повереника Цивилне заштите, као и набавка прописаних униформи.

4. ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА

- Уговор о осигурању водних објеката, имовине и запослених у ЈВП „Воде Војводине“ за 2019. годину закључен је са ДДОР Нови Сад, са годишњом премијом осигурања од 17,85 милиона динара динара (са порезом);
- Штете су уредно пријављиване и наплаћене;
- У 2019. години наплаћено је 6,73 милиона динара на основу штетних догађаја и учешћа у позитивном техничком резултату.

5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Одржавање пословног простора (седиште Предузећа, Документациони центар Никола Мирков, Централни магацин, Едукативни центар Јегричка) врши „Стандард ДТД“ Нови Сад. Вредност извршене услуге одржавања пословног простора за период јануар–децембар 2019. године износила је 33,51 милиона динара (са ПДВ-ом).

5. ВОЗНИ ПАРК

Редовно су састављани месечни извештаји о стању возила са посебно исказаним трошковима за свако појединачно возило и констатацијом о његовој исправности.

Сва возила ЈВП „Воде Војводине“ су у периоду јануар–децембар 2019. године прешла укупно 1,94 милиона km, а потрошено је 40,2 милиона динара за куповину горива.

Трошкови одржавања возила (редовни сервис, поправке, замена и куповина нових гума) за период јануар – децембар 2019. године износе 7,78 милиона динара.

6. ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР „ИНЖЕЊЕР НИКОЛА МИРКОВ“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

У Документационом центру „Инж. Никола Мирков“ у 2019. години вршени су текући послови:

- Стручно одржавање архиве и класификација регистратурског материјала, стварање и организација дигиталне фото и видео грађе, дигитализација VHS документације;
- Уређивање стручне библиотеке Предузећа;

- Стручно вођење кроз поставку Музеја;
- Реализација набавки услуга: Дигитализација техничке документације (2,5 милиона динара), Одржавање гасних котларница и гасних уређаја (279,2 хиљада динара), одржавање централног грејања (490 хиљада динара);
- Одржавање зграде Документационог центра: одржавање зеленила, замена покварених брава, поправка аларма, поставка фотографија, фарбање фонтане.

4.4. ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

4.4.1 ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Од 01.01.2011. године делатност ЈВП „Воде Војводине“ финансира се у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон), који јавна водопривредна предузећа оставља без сопствених прихода. Основни извор финансирања делатности ЈВП „Воде Војводине“ су средства од накнада за воде која се евидентирају у Буџетском фонду за воде АП Војводине и као таква, по овом закону, чине јавни приход, а не приход јавног водопривредног предузећа, као што је било предвиђено раније важећим Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 46/91, 53/93 и 54/96).

Овакав начин финансирања доводи у питање правни положај Предузећа које треба да послује у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, а што није могуће, јер је буџетским финансирањем Предузеће сведено на статус установе.

Према Закону о водама, послови од општег интереса из члана 150. став 1. тач. 1) овог закона, које ЈВП обавља у оквиру своје делатности, финансирају се средствима из буџета Републике Србије, буџета АП Војводине, накнада за воде, концесионих накнада и осталих извора (члан 151. став 1. Закона), а наведена средства могу да се користе само за намене утврђене тим законом (члан 151. став 3. Закона). Овде Закон о водама јасно упућује на наменски карактер средстава од накнада за воде.

Од 01.01.2019. године, накнаде за воде, као и сва питања у вези утврђивањем и плаћањем ових накнада, регулисани су посебним законом - Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018, 49/209 и 86/2019 - усклађени дин. изн.). Овим законом није предвиђен наменски карактер средстава од накнада за воде (осим опште одредбе да приходи остварени од накнада за воде на територији АП Војводине, припадају буџету АП Војводине). Ступањем на снагу тог закона, нису престале да важе горе наведене одредбе (члана 151.) Закона о водама, у погледу наменског карактера средстава од накнада за воде. Ова неусаглашеност у законима, односно правна празнина у погледу одређивања намене сваке појединачне накнаде за воде (како су предвиђале раније важеће одредбе Закона о водама, у делу о накнадама за воде) може да представља додатни проблем у обезбеђивању средстава за потребе финансирања послова од општег интереса из надлежности овог јавног водопривредног предузећа, када од 01.01.2019. године више не постоји законска обавеза да се наплаћена средства од накнада за воде утроше за одређене намене.

Досадашњи проблеми у финансирању послова од општег интереса из члана 150. став 1. тач. 1) Закона о водама, а нарочито послова заштите од штетног дејства вода, јасно су показали да без одређивања наменског карактера прихода од накнада за воде нема сигурног начина финансирања ових послова.

Чланом 16. и 17. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, утврђено је да АП Војводина надлежности у области водопривреде врши као поверене, а чланом 8. став 3. истог закона прописано је да средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија. Сагласно томе, потребно је да надлежни покрајински органи предузму мере да Република Србија обезбеди средства за Покрајински буџет, ради спровођења заштите од штетног дејства вода, као поверене надлежности.

4.4.2 ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Према члану 42. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) добра од општег интереса, у које, између осталих, спадају и водни објекти и водно земљиште у јавној својини, не улазе у капитал јавног предузећа.

У оснивачком акту, пословним књигама и АПР-у уписана вредност основног неновчаног капитала ЈВП „Воде Војводине“ обухвата и водне објекте и водно земљиште хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, као добра од општег интереса која по закону не могу бити основни капитал јавног предузећа.

ЈВП „Воде Војводине“ је још у току 2015. године код надлежних органа АП Војводине иницирало усклађивање оснивачког акта са Законом о јавној својини, а од Министарства финансија је затражило мишљење у вези са применом наведене законске одредбе. На упућену иницијативу и захтев, ЈВП „Воде Војводине“ није добило одговор. Због тога су и у 2019. години водни објекти на којима Предузеће има право управљања, исказани као основни капитал Предузећа.

4.4.3 УПИС ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКТА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

ЈВП „Воде Војводине“ је пред Републичким геодетским заводом и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде, покренуло решавање питања уписа водног земљишта и водних објеката у катастар непокретности.

Да би водно земљиште могло да се упише у катастар непокретности потребно је да, у складу са чланом 11. став 4. Закона о водама, министар надлежан за послове водопривреде ближе пропише начин одређивања граница овог земљишта. Како овај пропис још увек није донет, не постоји правни основ да надлежни покрајински орган донесе посебне одлуке којим би се одредиле границе водног земљишта, а на основу којих би се извршиле одговарајуће промене у катастру непокретности. Наведено има за последицу да катастар непокретности не садржи податке о водном земљишту, као посебној врсти земљишта, већ се оно и даље води као остало земљиште или пољопривредно земљиште. Посебан проблем представља земљиште које је у природи водно и за чије издавање у закуп је, сходно Закону о водама, надлежно ЈВП „Воде Војводине“, а које јединице локалне самоуправе издају у закуп у складу са Законом о пољопривредном земљишту, јер се исто земљиште у катастру непокретности води као пољопривредно. Негативне последице овако неусклађеног стања не огледају се само у изостанку закупнине, као прихода ЈВП „Воде Војводине“ већ и у чињеници да јединице локалне самоуправе издају у закуп и принаспски појас, који се, као саставни део насипа, не може користити у обрадиве сврхе.

Проблематика уписа водних објеката првенствено се односи на усклађивање постојећег стања у катастру непокретности (према коме канали, насипи и бране нису уписани као објекти већ као земљиште посебне намене) са важећим прописима (Законом о државном премеру и катастру и Законом о водама). С тим у вези, инициране су измене и допуне Закона о водама и предложено је доношење одговарајућих подзаконских аката из области одржавања катастра непокретности, којима би се предвидела могућност аутоматског преноса водних објеката из А листа непокретности (где су се водили као земљиште посебне намене) у В лист непокретности (где ће бити уписани као објекти). На овај начин смањено би се број поступака озакоњења водних објеката, као и трошкови спровођења промена правног статуса водних објеката у катастар непокретности.

5. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ


5.1 ПРИХОДИ

Приходи су повећања економских користи током обрачуноског периода у облику прилива или повећања имовине или смањења обавеза, која имају за резултат пораст капитала који не представља прираст на основу доприноса власника капитала.

ЈВП „Воде Војводине“ је у 2019. години остварило приходе у износу од 4.538.912.000 динара, и то:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. пословни приходи | 4.289.788.000 динара; |
| 2. финансијски приходи | 48.739.000 динара; |
| 3. остали приходи | 200.385.000 динара; |

Укупно:	4.538.912.000 динара
----------------	-----------------------------



Графикон 5.1: Структура прихода остварених у 2019. години

Табела бр. 5.1.1: Упоредни преглед прихода

(000 динара)

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО 2018.	ПЛАНИРАНО 2019.	ОСТВАРЕНО 2019.	ИНДЕКС	
				ОСТВАРЕНО 2019. : ОСТВАРЕНО 2018.	ОСТВАРЕНО 2019. : ПЛАНИРАНО 2019.
Пословни	5.148.929	5.154.568	4.289.788	0,83	0,83
Финансијски	48.144	98.500	48.739	1,01	0,49
Остали	223.969	148.050	200.385	0,89	1,35
Укупно:	5.421.042	5.401.118	4.538.912	0,84	0,84

5.1.1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

ЈВП је у 2019. години остварило пословне приходе у износу од 4.289.788.000 динара, што представља 94,51% укупних прихода. Њихова структура је:

- приходи од накнада 70.000 динара (0,01%);
 - приходи од посебних услуга 46.462.000 динара (1,08%);
 - приходи од продаје производа (дрва, трава, трска, песак, земља) 23.871.000 динара (0,56%);
 - приходи од продаје услуга (риболовне дозволе и др.) 33.514.000 динара (0,78%);
 - приходи од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета), донације из фондова ЕУ 4.070.701.000 динара (94,89%);
 - други пословни приходи (закуп посл. простора, рефундације) 115.170.000 динара (2,68%);
- Свега пословни приходи: 4.289.788.000 динара (100%).**

5.1.1.1 ПРИХОДИ ОД НАКНАДА

Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019), од 01.01. 2019. престале су да важе одредбе Закона о водама и то од члана 153. до 183. и од члана 191. до члана 195. којим су биле прописане накнаде за воде. Новим одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, прописани су послови од општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и плаћање водних накнада.

Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања ЈВП „Воде Војводине“ је да се накнада за одводњавање утврђује на другачији начин, односно да се утврђује на основу врсте и класе земљишта.

Одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења набројаних накнада, а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског фонда за воде АПВ, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АПВ. Наплаћена средства од накнада, на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.

У 2019. години приходе од накнада утврђених у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91...54/96), чинила је обрачуната или наплаћена накнада из претходног периода закључно са 2010. годином, и то на следећи начин:

1. **Пословни приход од накнада** у износу од 69.947,10 динара, чини га наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица у 2019. години за које је решење издала Пореска управа и односи се на неизмирене обавезе из претходних година закључно са 2010. годином.
2. **Финансијски приход од накнада** износи 19.667.644,39 динара и чини га обрачуната камата за доспеле, а неизмирене обавезе.
3. **Остали приходи од накнада** износе 78.504.372,60 динара, а чине га наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатава.

Табела бр. 5.1.1.1: Наплата накнада у 2019. години

НАКНАДЕ УПЛАЋЕНЕ НА РАЧУН ЈВП		ИЗНОС
1.	Накнада за одводњавање од на основу решења ЈВП	63.428.986,37
2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	69.947,10
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	19.885.850,94
4.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	610.675,98
Укупно:		83.995.460,39

ОБРАЧУН И НАПЛАТА НАКНАДА - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

Обрачун и наплата накнада евидентираних у Буџетском фонду за воде АПВ извршена је у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, а у складу са одредбама истог Закона, Јавном водопривредном предузећу поверавају се послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра, накнаде за коришћење водних објеката и система, као и послови обрачуна и задужења правних лица и физичких лица, обвезника плаћања накнаде за одводњавање, и члана 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, висина накнада се утврђује годишње, на основу годишњег усклађивања индекса потрошачких цена.

У циљу повећања ефикасности наплате накнада закључено је укупно 1.167 Споразума о одлагању плаћања дуга у вредности 54.450.494,32 динара од тога 1.136 споразума у износу од 42.671.006,99 динара се односи на физичка лица, а 14 споразума у износу од 10.751.308,78 динара односи се на правна лица. Обвезници су уложили укупно 2.201 жалбу на решења о утврђивању накнада у 2019. години, а решено је укупно 4.548 жалби, и то су жалбе из претходних година.. По структури, 2.000 жалби се односи на решења за накнаду за одводњавање за физичка лица, а 201 жалба упућена је на остале накнаде.

ЈВП „Воде Војводине“ је у 2019. години издало укупно 11.365 решења за утврђивање накнада, 314 уговора и вансудских поравнања о закупу у износу од 83.334.038,20 динара; у укупном износу од 1.578.265.619,84 динара и то:

Накнада за одводњавање за правна лица

1. За период 2011-2018. године у 2019. години за правна лица издато је 4.824 решења у износу од 563.637.379,73 динара;
2. за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године за 2019. годину за правна лица издата су 5486 решења у износу од 567.065.197,80 динара,
3. за накнаду за одводњавање од правних лица издато је укупно 10312 решења у износу од 1.130.702.577,53 динара.

Накнада за одводњавање за физичка лица

На основу члана 89. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години је издавала решења за физичка лица за накнаду за одводњавање. Издато је укупно, укупно 711.675 решења. Разрез за 2019. годину био је **1.984.170.036,16** динара

Накнаде за коришћење водних објеката и система

1. За период 2011-2018. године у 2019. години издато је 68 решења у износу од 26.058.699,55 динара;
2. за 2018. годину издато је 154 коначних решења у 2019. години (разлика у односу на аконтативна решења за 2018. годину износи +3.382.960,40 динара);
3. укупан број издатих решења за 2019. годину је 290 у износу од 350.241.881,56 динара.

Накнада за коришћење водног добра - водног земљишта

1. За период 2011-2018. године у 2019. години издато је 543 решења у износу 13.986.639,55 динара;
2. за период 01.01.2018-31.12.2018. године склопљено је 314 уговора у износу од 83.334.038,20 динара.

На основу члана 78. и 97. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, обрачун накнаде за воде и задужење обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду врши надлежни орган аутономне покрајине за територију аутономне покрајине. У складу са Уговором бр. IV-51/554 од 27.04.2019. године закљученим између АП Војводине - Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП обавља послове обрачуна накнаде и задужења накнаде обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра из члана 75. и 94. Закона о накнадама за коришћење јавних добара и накнаде за испуштenu воду за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

У циљу повећања ефикасности наплате накнада издато је 12.987 обавештења, закључено је 1167 Споразума о одлагању плаћања дуга у износу од 54.450.494,32 динара.

У 2019. години издато је укупно 1.343 решења у износу од 874.752.608,08 динара и то:

Накнада за коришћење вода

Укупан број издатих решења у 2019. годину је 875 у износу од 704.923.209,92 динара.

Накнада за испуштenu воду

Укупан број издатих решења у 2019. годину је 468 у износу од 169.829.398,16 динара.

Табела бр. 5.1.1.2: Структура наплате накнада у 2019. години по врстама накнада

НАПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ У 2019. ГОДИНИ		2019.
1.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	26.535.539,02
2.	Накнада за одводњавање од правних лица	727.584.081,71
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	353.006.166,49
4.	Приходи од давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката	4.371.610,49
5.	Приходи од давања у закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката)	35.580.843,48
Укупно:		1.147.078.241,19
НАПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ У 2019. ГОДИНИ (ЧЛ. 78. и 97. ЗАКОНА)		2019.
1.	Накнада за коришћење водног добра	489.868.726,64
2.	Накнада за испуштenu воду	88.002.129,43
3.	Накнада за извађен материјал из водотока (шљунак и песак)	51.079.329,96
Укупно		628.950.186,03
НАПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ У 2019. ГОДИНИ (ЧЛ. 88. ЗАКОНА)		2019.
1.	Накнада за одводњавање од физичких лица	1.447.401.901,32
Укупно све накнаде:		3.223.438.817,45

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА

Приходи из Буџета, остварени су у износу од **4.070.701.000** динара, а чине их:

1. приходи из Буџетског фонда за воде АПВ.....2.932.651.000 динара;
2. приходи из Буџета Републике Србије 33.628.000 динара;
3. приходи из Буџета АПВ – Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.132.302.000 динара;
4. приходи из Буџета општина417.826.000 динара;
5. приходи из Буџета АПВ – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 1.620.000 динара;
6. приходи по основу условљених донација.....538.021.000 динара;
7. приходи за инвестиционе послове – фонд Абу Даби..... 14,653.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИХ УСЛУГА

Приходи остварени по основу вршења услуга издавања водних аката и по основу вршења услуга стручног надзора - Абу Даби Фонд износе 46.462.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА

Приходи који су резултат продаје шумских сортимената, траве, трске, песка и земље, остварени су у износу од 23.871.000 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА

Приходи од продаје услуга остварени у износу 33.514.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (28.779.000 динара) и приходе од осталих услуга (4.735.000 динара).

ПРИХОДИ КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу 12.994.000 динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији и приказани су у табели пословних расхода (конто 62).

Приходи настали услед промене вредности залиха у износу од 86.000 динара. Ови приходи настали су због повећања вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе расадник).

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Други пословни приходи остварени су у износу од 115.170.000 динара, а чине их приходи од закупа водног земљишта (87.864.000 динара), приходи од издавања у закуп пословног простора (480.000 динара) и остали пословни приходи (26.826.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

5.1.2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у износу од 48.739.000 динара, што чини 1,08 % укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 19.678.000 динара и приходи од камата на ависта депозите у износу од 29.019.000 динара;
- приходи од курсних разлика у износу од 42.000 динара;

5.1.3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу од 200.385.000 динара што чини 4,41 % укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме и материјала 2.006.000 динара;
- наплаћених отписаних потраживања 45.204.000 динара;
- прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика 25.000 динара;
- прихода од смањења обавеза 2.499.000 динара;
- прихода од укидања дугорочних резервисања 668.000 динара;
- осталих непоменутих прихода 22.124.000 динара;
- приходи од усклађивања вредности 122.694.000 динара;
- остали ванредни приходи 5.165.000 динара.

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2019. годину дат је у табели у наставку.

Табела бр. 5.1: Приходи ЈВП „Воде Војводине“

(000 динара)

Класа Бр. 5.1. Приходи ЈБП Воде Војводине								(000 динара)
КОНТО БР.	РЕД. БР.	ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО 2018.	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕНО 2019.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	
1	2	3	4	5	6	7		
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.148.929	5.154.568	4.289.788	0,83	0,83	
614		Приходи од продаје производа и услуга	119.762	213.841	103.917	0,87	0,49	
61401	1	Приходи од накнада	8.151	48.563	70	0,01	0,00	
61402	1	Приходи од посебних услуга	75.519	78.558	46.462	0,62	0,59	
61402	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	32.108	38.000	26.922	0,84	0,71	
61402	1.2	Приходи од стручног надзора – фонд Абу Даби	43.411	30.558	19.540	0,45	0,64	
61402	1.3	Услуге трећим лицима-пловни багер	0	10.000	0	0,00	0,00	
61403	2	Продаја производа	12.275	43.100	23.871	1,94	0,55	
614030	2.1	Шумарство	10.955	41.500	20.449	1,87	0,49	
614031	2.2	Трава, трска, песак, земља	1.320	1.600	3.422	2,59	2,14	
61404	3	Продаја услуга	23.817	43.620	33.514	1,41	0,77	
614044	3.1	Риболовне дозволе	23.657	43.120	28.779	1,22	0,67	
614046	3.2	Остале услуге	160	500	4.735	29,59	9,47	
64	6	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	5.003.431	4.764.727	4.070.701	0,81	0,85	
6401	6.1	Буџетски фонд за воде АПВ	3.199.744	3.404.464	2.932.651	0,92	0,86	
6402	6.2	Из буџета општина - суфинансирање	632.683	423.040	417.826	0,66	0,99	
6407	6.3	Буџетски фонд за воде РС	16.201	487.000	33.628	2,08	0,07	
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	0	0	0	0,00	0,00	
6408	6.5	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	1.440	0	1.620	1,13	0,00	
6408	6.6	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	0	0	0	0,00	0,00	
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из Буџета АПВ	453.002	110.000	132.302	0,29	1,20	
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	0	1.500	0	0,00	0,00	
6407	7.1	Фонд Абу Даби -инвеститорски трошкови	34.882	22.918	14.653	0,42	0,64	
641	7.2	Условљене донације	665.479	315.805	538.021	0,81	1,70	
65	8	Други пословни приходи	25.736	176.000	115.170	4,48	0,65	
650	8.1	Закуп пословног простора	814	1.000	480	0,59	0,48	
650	8.2	Закуп водног земљишта	0	150.000	87.864	0,00	0,59	
659	8.3	Остали пословни приходи	24.922	25.000	26.826	1,08	1,07	
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	48.144	98.500	48.739	1,01	0,49	
662	1	Приходи од камата	48.144	98.000	48.697	1,01	0,50	
663	2	Приходи од курсних разлика	0	500	42	0,00	0,08	
669	3	Остали финансијски приходи	0	0	0	0,00	0,00	
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	223.969	148.050	200.385	0,89	1,35	
670	1	Продаја расходоване опреме	1.815	2.000	225	0,12	0,11	
673	2	Продаја материјала	0	0	1.781	0,00	0,00	
675	3	Наплаћена отписана потраживања	40.857	80.000	45.204	1,11	0,57	
676	4	Приходи по основу уговорене заштите од пожара	17	50	25	1,47	0,50	
677	5	Приходи од смањења обавеза	11.625	1.000	2.499	0,21	2,50	
678	6	Приходи од укидања дугорочних резервисања	740	0	668	0,90	0,00	
679	7	Остали непоменути приходи	40.476	15.000	22.124	0,55	1,47	
68	8	Приходи од усклађивања вредности	125.547	50.000	122.694	0,98	2,45	
69	9	Остали ванредни приходи	2.892	0	5.165	1,79	0,00	
		СВЕГА ПРИХОДИ:	5.421.042	5.401.118	4.538.912	0,84	0,84	

5.2 РАСХОДИ

Расходи су смањења економских користи током обрачунског периода у облику одлива или смањења имовине или настанка обавеза, која имају за резултат смањење капитала које не представља смањење по основу расподеле власницима капитала.

ЈВП „Воде Војводине“ је у 2019. години остварило расходе у износу од 4.510.369.000 динара, и то:

1. пословни расходи	4.477.419.000 динара;
2. финансијски расходи	2.271.000 динара;
3. остали расходи.....	22.485.000 динара;
4. расходи по основу обезвређења имовине.....	8.194.000 динара;
Укупно:	4.510.369.000 динара.

РАСХОДИ ОСТВАРЕНИ У 2019. ГОДИНИ



Графикон 5.2: Структура расхода остварених у 2019. години

У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2018. и 2019. години и планираних за 2019. годину.

Табела бр. 5.2.1: Упоредни преглед расхода

(000 динара)

Расходи	Остварено 2018.	Планирано за 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
				Остварено 2019./ Остварено 2018.	Остварено 2019./ планирано 2019.
Пословни	5.216.589	5.303.618	4.477.419	0,86	0,84
Финансијски	485	1.000	2.271	4,68	2,27
Остали	31.887	16.000	22.485	0,71	1,41
По основу обезвређења имовине	143.949	80.000	8.194	0,06	0,10
Укупно:	5.392.910	5.400.618	4.510.369	0,84	0,84

5.2.1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години остварило **пословне расходе** у износу од 4.477.419.000 динара, што је 99,27% укупних расхода, а чине их:

- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ у износу од 273.396.000 динара, чине 6,06% укупних расхода, а у њих спадају:
 - трошкови осталог материјала (41.000.000 динара),
 - трошкови горива и енергије (213.447.000 динара),
 - трошкови резервних делова (3.490.000 динара) и
 - трошкови једнократног отписа алата и инвентара (15.459.000 динара).
- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварени у износу од 666.022.000 динара (14,77%), а њихова структура је приказана у табелама Приказ расхода и Трошкови запослених у 2019. години.
- ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА у износу од 2.712.019.000 динара (60,13%), у чијем саставу су:
 - Трошкови транспортних услуга које чине трошкови ПТТ марака и телефонских разговора, трошкови превоза и претовара, остварени су у износу од 45.581.000 динара;
 - Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране извођача радова), који су остварени у износу од 2.612.110.000 динара, а њихова структура је приказана у табели бр. 5.2.1.1;
 - Трошкови закупнина износе 239.000 динара;
 - Трошкови сајмова износе 1.068.000 динара;
 - Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 4.279.000 динара;
 - Трошкови истраживања износе 3.785.000 динара;
 - Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл., остварени су у износу од 44.957.000 динара.
- ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА су остварени у износу од 508.818.000 динара, а у њиховом саставу су:
 - трошкови амортизације 495.602.000 динара,
 - трошкови резервисања за обнављања природног богатства 72.000 динара и резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 13.144.000 динара
- НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (без пореза и доприноса) су остварени у износу од 325.140.000 динара у чији састав улазе трошкови:
 - трошкови непроизводних услуга220.275.000 динара;
 - трошкови репрезентације 3.505.000 динара;
 - трошкови премија осигурања17.633.000 динара;
 - трошкови платног промета 2.374.000 динара;
 - трошкови чланарина 2.425.000 динара;
 - остали нематеријални трошкови78.928.000 динара.
- ТРОШКОВИ ПОРЕЗА остварени су у износу од 5.104.000 динара.

5.2.2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су остварени у износу од 2.271.000 динара (0,05)% од укупних расхода, а односе се на:

- расходе камата 89.000 динара;
- негативне курсне разлике 1.328.000 динара;
- остали финансијски расходи 854.000 динара.

5.2.3 ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи су остварени у износу од 22.485.000 динара што је (0,50%) од укупних расхода, а односе се на:

- губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 593.000 динара;
- мањкове 21.000 динара;
- расходе по основу директног отписа потраживања 5.000 динара и
- остале непоменуте расходе 21.866.000 динара.

5.2.4 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 8.194.000 динара што је 0,18% од укупних расхода, а односе се на:

- обезвређење дугорочних хартија од вредности 21.000 динара;
- обезвређења потраживања по основу накнада 3.596.000 динара;
- исправку грешака из ранијих година 4.577.000 динара.

Табела бр. 5.2: Расходи ЈВП „Воде Војводине“

(000) динара

Табела бр. 5.2: Расходи ЈВГГ Воде Војводине			Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	индекс 5:3	индекс 5:4
Кто бр.	Ред. бр.	ВРСТА РАСХОДА					
	1	2	3	4	5	6	7
	I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.216.589	5.303.618	4.477.419	0,86	0,84
62		Приходи од активирања учинака и робе	7.399	0	12.994	1,76	0,00
630		Повећање вредности залиха	1.078	0	86	0,08	0,00
631		Смањење вредности залиха	0	0	0	0,00	0,00
51		Трошкови материјала	266.109	265.632	273.396	1,03	1,03
512	1	Трошкови осталог материјала	44.160	50.191	41.000	0,93	0,82
513	2	Трошкови горива и енергије	210.852	201.420	213.447	1,01	1,06
514	3	Трошкови резервних делова	3.755	5.400	3.490	0,93	0,65
515	4	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	7.342	8.621	15.459	2,11	1,79
52		Трошкови зарада и накнада зарада и остала лична примања	637.161	725.890	666.022	1,05	0,92
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	501.056	548.870	528.062	1,05	0,96
521	2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	90.191	96.875	91.106	1,01	0,94
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	66	3.800	66	1,00	0,02
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	88	100	88	1,00	0,88
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	753	1.000	764	1,01	0,76
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.929	2.912	2.912	0,99	1,00
529	8	Остали лични расходи	42.108	72.333	43.024	1,02	0,59
53		Трошкови производних услуга	3.469.742	3.018.223	2.712.019	0,78	0,90
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	78.630	49.936	45.581	0,58	0,91
532	3	Трошкови услуга одржавања	3.350.443	2.913.347	2.612.110	0,78	0,90
533	4	Трошкови закупнина	219	300	239	1,09	0,80
534	5	Трошкови сајмова	1.056	1.068	1.068	1,01	1,00
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	7.453	5.052	4.279	0,57	0,85
536	7	Трошкови истраживања	3.720	10.212	3.785	1,02	0,37
539	8	Трошкови осталих услуга	28.221	38.308	44.957	1,59	1,17
54		Трошкови амортизације и резервисања	517.576	512.000	508.818	0,98	0,99
540	1	Трошкови амортизације	485.403	480.000	495.602	1,02	1,03
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	1.526	2.000	72	0,05	0,04
545	3	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	6.824	5.000	13.144	1,93	2,63
549	4	Остала дугорочна резервисања	23.823	25.000	0	0,00	0,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	328.331	771.873	325.140	0,99	0,42
550	1	Трошкови непроизводних услуга	234.856	241.645	220.275	0,94	0,91

Кто бр.	Ред. бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	индекс 5:3	индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7	
551	2	Трошкови репрезентације	2.729	6.588	3.505	1,28	0,53
552	3	Трошкови премија осигурања	15.536	21.600	17.633	1,13	0,82
553	4	Трошкови платног промета	2.337	2.000	2.374	1,02	1,19
554	5	Трошкови чланарина	2.714	3.000	2.425	0,89	0,81
559	6	Остали нематеријални трошкови	70.159	497.040	78.928	1,12	0,16
555		Трошкови пореза	6.147	10.000	5.104	0,83	0,51
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	485	1.000	2.271	4,68	2,27
562	1	Расходи камата	271	500	89	0,33	0,18
563	2	Негативне курсне разлике	214	500	1.328	6,21	2,66
569	3	Остали финансијски расходи	0	0	854	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.887	16.000	22.485	0,71	1,41
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	9.854	500	593	0,06	1,19
574	2	Мањкови	254	200	21	0,08	0,11
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	105	300	5	0,05	0,02
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи	21.674	15.000	21.866	1,01	1,46
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	143.949	80.000	8.194	0,06	0,10
580	1	Обезвређење биолошких средстава	1.734	0	0	0,00	0,00
582	2	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	86.033	0	0	0,00	0,00
583	3	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности	19.746	0	21	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	29.666	80.000	3.596	0,12	0,04
589	5	Обезвређење остале имовине	162	0	0	0,00	0,00
592	6	Расходи, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака ранијих година	6.608	0	4.577	0,69	0,00
		СВЕГА РАСХОДИ:	5.392.910	5.400.618	4.510.369	0,84	0,84

ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА

Табела бр. 5.2.1.1: Трошкови услуга одржавања остварени у 2019. години

КОНТО БР.	ВРСТА РАСХОДА	ОСТВАРЕНО У 2019.
532	Трошкови услуга одржавања	2.612.109.932
5320, 5321, 5322	Одржавање некретнина, постројења и опреме	39.895.217
5323	Трошкови неге и заштите шума	16.555.015
5324	Трошкови одржавања Хс ДТД	95.462.627
5325	Трошкови одржавања - одводњавање	1.051.540.612
5325	Трошкови одржавања - суфинансирање	579.051.682
5326	Трошкови ХМО	53.890.832
5327	Трошкови међународне сарадње у области вода	8.619.356
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	502.064.198
53283	Санација објеката за одбрану од поплава	155.068.356
53284	Инвестиционо одржавање водопривредних објеката	56.902.159
53285	Пројекат ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА	31.230.611
53286	Реконструкција заштитних шума	11.439.911
53288	Трошкови санација и реконструкција водних објеката	10.389.356

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Табела бр. 5.2.1.2: Трошкови запослених у 2019. години

(у динарима)

Р. БР.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАН 01.01- 31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2019.	ИНДЕКС РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01-31.12.2019. : ПЛАН 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	391.951.347	378.824.729	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	548.869.937	528.062.323	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	645.745.481	619.168.727	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	486	475	0,98
4.1.	- на неодређено време	446	437	0,98
4.2.	- на одређено време	40	38	0,95
5	Накнаде по уговору о делу	3.800.000	66.456	0,02
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	8	2	0,25
7	Накнаде по ауторским уговорима	100.000	87.850	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	1.000.000	763.789	0,76
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	75	71	0,95
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.911.595	2.911.595	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	25.600.000	21.761.549	0,85
20	Дневнице на службеном путу	19.000.000	11.928.670	0,63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.341.861	4.537.782	0,62
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.712.267	2.141.451	0,20
23	Број прималаца	45	9	0,20
24	Јубиларне награде	4.320.915	4.167.492	0,96
25	Број прималаца	58	57	0,98
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.918.000	1.356.865	0,71
28	Стипендије	850.000	875.237	1,03
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.589.840	2.563.408	0,99

Позиције на редним бројевима 1, 2, 3 и 17. представљају износе пре умањења средстава уплаћених у буџет Републике Србије према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата („Сл. гласник РС“ број 116/2014, 95/2018)

5.3 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ - ТРОШКОВИ И УЛАГАЊА

5.3.1 ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА И УКУПНА УЛАГАЊА У ОПРЕМУ, МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОСТАЛА ДОБРА НЕОПХОДНА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ

Табела бр. 5.3.1.1: Трошкови функционисања ЈВП „Воде Војводине“ финансирани средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2019.

ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ				
Р. Б.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СА ПДВ	РЕАЛИЗАЦИЈА СА ПДВ	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	ОСТАЛА ДОБРА	117.652.800,00	78.172.620,16	66,44%
	УСЛУГЕ	274.074.000,00	178.906.313,79	65,30%
	РАДОВИ	3.000.000,00	819.360,00	27,31%
	План набавки и ЈВП за 2019.	394.726.800,00	257.898.293,95	65,34%
	Проценат реализације Уговора о ЈН у току 2019.	233.678.265,60		
	Проценат реализације уговора у 2020.	161.048.534,40		
	Трошкови функционисања осим плана набавки	34.396.734,40	49.177.949,51	142,97%
	Трошкови пореза	4.350.199,20	5.987.034,70	137,63%
	Трошкови комуналних услуга	10.000.000,00	13.071.127,81	130,71%
	Трошкови платног промета	1.646.535,20	2.021.000,00	122,74%
	Трошкови чланарина привредна комора	2.400.000,00	1.962.900,00	81,79%
	Накнада штете трећим лицима, судски спорови	16.000.000,00	26.135.887,00	163,35%
	Укупно трошкови функционисања ЈВП-а	268.075.000,00	307.076.243,46	114,55%
	Укупна улагања у опрему, механизацију и остала добра неопходна за функционисање ЈВП-а приказана у табели 5.3.1.2	68.258.000,00	29.883.125,68	43,78%
	Укупно трошкови функционисања ЈВП-а, осим зарада и трошкова издавања водних решења за физичка лица	336.333.000,00	336.959.369,14	100,19%
	Трошкови зарада	725.890.000,00	671.428.492,35	92,50%
	трошкови издавања водних решења за физичка лица	50.000.000,00	72.120.981,52	144,24%
	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈВП	1.112.223.000,00	1.080.508.843,01	97,15%

Табела бр. 5.3.1.2: Укупна улагања у опрему, механизацију и остала добра неопходна за функционисање ЈВП-а која се финансирају средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину

Р. Б.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СА ПДВ	РЕАЛИЗАЦИЈА СА ПДВ	% РЕАЛИЗАЦИЈЕ
	ПЛАН НАБАВКИ ЈВП ЗА 2019.	68.258.000,00	29.883.125,68	43,78%
	ОПРЕМА	34.070.000,00	12.969.373,69	38,07%
	МЕХАНИЗАЦИЈА	26.268.000,00	9.075.351,99	34,55%
	ОСТАЛА ДОБРА	7.920.000,00	7.838.400,00	98,97%

5.3.2 УКУПНИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

У табели бр. 5.3.2.1 дат је приказ плана и реализације, као и структура сопствених прихода ЈВП „Воде Војводине“, а у табели бр. 5.3.2.2 расхода који се финансирају овим средствима.

Табела бр. 5.3.2.1: Планирани и остварени сопствени приходи ЈВП „Воде Војводине“ за 2019. годину 000 динара

Р. Б.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН	РЕАЛИ-ЗАЦИЈА	% РЕАЛИ-ЗАЦИЈЕ
1.	Приходи од накнада по Закону о водама до 31.12.2010.	48.563	70	0,14%
2.	Приходи од посебних услуга:	68.558	46.462	67,77%
2.1	1) приходи од издавања водних аката	38.000	26.922	70,85%
2.2	2) приходи од стручног надзора над радовима које финансира Абу Даби фонд	30.558	19.540	63,94%
3.	Приходи од продаје производа и услуга	96.720	57.385	59,33%
4.	Други пословни приходи (од закупа и рефундације режијских трошкова и закупа водног земљишта)	176.000	115.170	65,44%
5.	Финансијски приходи	98.500	48.739	49,48%
6.	Остали приходи (наплаћена отписана потраживања по основу накнада (из периода пре 2010. године)	148.050	200.385	135,35%
7.	Приходи од вршења инвеститорских права над радовима које финансира АДФ	22.918	14.653	63,94%
	Укупно приходи:	659.309	482.864	73,24%

Табела бр. 5.3.2.2: Трошкови функционисања финансирани сопственим средствима ЈВП 000 динара

Р. Б.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН	РЕАЛИ-ЗАЦИЈА	% РЕАЛИ-ЗАЦИЈЕ
	Трошкови амортизације и резервисања	512.000	508.818	99,38%
	Трошкови амортизације	480.000	495.602	103,25%
	Трошкови резервисања за обнављање шума	2.000	72	3,60%
	Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.000	13.144	262,88%
	Трошкови резервисања за судске спорове	25.000	0	0,00%
	Расходи по основу обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана	80.000	8.194	10,24%
	Финансијски расходи	1.000	2.271	227,10%
	Трошкови пореза	5.650	5.863	103,77%
	Трошкови платног промета	353	353	100,00%
	Набавка материјала и услуга	59.806	59.949	100,24%
	Укупно расходи	658.809	587.469	89,17%

5.4 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2019. години ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је остварило нето добитак у висини од 3.638.000 динара.

- Приходи 4.538.912.000 динара;
- Расходи 4.510.369.000 динара;
- Бруто добитак (пре опорезивања)..... 28.543.000 динара;
- Одложени порески расход периода -24.905.000 динара;

Нето добитак **3.638.000 динара.**

У табели у наставку дат је упоредни преглед пословних резултата за 2018. и 2019. годину (остварени и планирани).

Табела бр. 5.4.1: Упоредни преглед пословних резултата (000 динара)

	ОСТВА- РЕНО 2018.	ПЛАН 2019.	ОСТВА- РЕНО 2019.	ИНДЕКС	
				ОСТВАРЕНО 2019./ ОСТВАРЕНО 2018.	ОСТВАРЕНО 2019./ ПЛАНИРАНО 2019.
Приходи	5.421.042	5.401.118	4.538.912	0,84	0,84
Пословни	5.148.929	5.154.568	4.289.788	0,83	0,83
Финансијски	48.144	98.500	48.739	1,01	0,49
Остали	223.969	148.050	200.385	0,89	1,35
Расходи	5.392.910	5.400.618	4.510.369	0,84	0,84
Пословни	5.216.589	5.303.618	4.477.419	0,86	0,84
Финансијски	485	1.000	2.271	4,68	2,27
Остали	31.887	16.000	22.485	0,71	1,41
По основу обезвређења имовине	143.949	80.000	8.194	0,06	0,10
БРУТО ДОБИТАК	28.132	500	28.543	1,01	57,09

5.5 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Обавеза ЈВП „Воде Војводине“ је доследна примена Закона о јавним предузећима у процесу реализације годишњег програма пословања и финансијског плана за 2019. годину. У реализацији програма пословања неопходно је поштовање економске и фискалне политике Владе којима је дефинисано исказивање показатеља за мерење ефикасности пословања и за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, кроз релевантне индикаторе на основу којих је могуће пратити напредак у пословању предузећа. Ови индикатори су основа за оцењивање резултата рада менаџмента и запослених.

У оквиру Уредбе Владе Републике Србије 05 број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године, којом су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, предвиђено је израчунавање индикатора, од којих неке ЈВП „Воде Војводине“ неће моћи адекватно да искаже, због тога што је 89,68% прихода остварено из Буџетског фонда за воде АПВ и других буџетских извора, тако да приход од продаје производа и услуга чини мали део укупних прихода. Стога је приказане индикаторе потребно разматрати уз уважавање специфичности делатности и начина финансирања Предузећа.

У наставку су дати обрасци биланса стања и биланса успеха са скраћеним обимом података и извештај о токовима готовине. Стављањем у однос позиција из ових финансијских извештаја добијени су предметни индикатори.

Обрасци финансијских извештаја у прописаној (пуној) форми дати су у прилозима:

- Прилог бр. 7: Биланс стања на дан 31.12.2019. (страна 84, 85 и 86 Извештаја);
- Прилог бр. 9: Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019. (страна 87 и 88 Извештаја).

Табела бр. 5.5.1.1: Биланс стања на дан 31.12.2019.

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	АОП	2018.	
			ПЛАН	РЕАЛИ- ЗАЦИЈА
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	47.438.000	46.985.208
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	49.000	45.963
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	46.707.000	46.103.254
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019	677.000	793.216
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	5.000	42.775
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0034		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	13.500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.222.097	1.772.907
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ	0044	367.597	138.556
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	35.000	110.667
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.000	16.635
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800.000	1.479.995
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.500	27.054
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	48.673.814	48.758.332
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	85.000.000	86.790.383
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	41.202.795	41.136.292
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.364.329	14.364.329
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	217	217
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.111	4.111
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29.400.000	29.348.766
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.423	26.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	4.149	6.400
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК	0421	2.563.588	2.560.837
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	86.703	122.408
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	86.703	116.775
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432	0	5.633
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.200.000	4.159.613
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.184.316	3.340.019
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	31.826
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	60.093	47.615
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	6.655
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.000	2.152
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.098.173	3.251.720
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	48.673.814	48.758.332
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	85.000.000	86.790.383

Табела бр. 5.5.1.2: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.

(у хиљадама динара)

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			ПЛАН	РЕАЛИ- ЗАЦИЈА
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.154.568	4.289.788
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	213.841	103.917
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.764.727	4.070.701
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	176.000	115.170
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	5.303.618	4.477.419
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		12.994
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		86
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.212	59.949
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	201.420	213.447
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	725.890	666.022
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.018.223	2.712.019
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	480.000	495.602
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32.000	13.216
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	781.873	330.244
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	149.050	187.631
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	98.500	48.739
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	98.000	48.697
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	42
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	2.271
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		854
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	1.328
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	97.500	46.468
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	50.000	43.087
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80.000	3.617
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98.050	152.133
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.000	22.485
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	500	27.955
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		588
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	500	28.543
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	75	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		24.905
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	425	3.638
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		

Табела бр. 5.5.1.3: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
		ПЛАН	РЕАЛИ-ЗАЦИЈА
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.690.200	4.158.944
1. Продаја и примљени аванси	3002	400.000	230.884
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100.000	59.922
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.190.200	3.868.138
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.580.700	4.210.107
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.760.690	3.434.236
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	720.000	704.342
3. Плаћене камате	3008	10	54
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100.000	71.475
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	109.500	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		51.163
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	500	2.245
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	500	2.245
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	360.000	317.254
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	360.000	317.254
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	359.500	315.009
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.690.700	4.161.189
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.940.700	4.527.361
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	250.000	366.172
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.050.000	1.847.464
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	500	46
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	1.343
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	800.000	1.479.995

Табела бр. 5.5.1.4: Индикатори за мерење ефикасности пословања

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5.489.010	6.556.467	6.267.556	5.154.568
Реализација	4.153.188	4.419.359	5.148.929	4.289.788
Реализација/План (%)	76%	67%	82%	83%

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	6.042.111	6.772.791	6.482.986	5.303.618
Реализација	4.489.462	4.642.444	5.216.589	4.477.419
Реализација/План (%)	74%	69%	80%	84%

у 000 динара

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5.945.420	6.885.082	6.574.406	5.401.118
Реализација	4.608.666	4.759.605	5.421.042	4.538.912
Реализација/План (%)	78%	69%	82%	84%

у 000 динара

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	6.185.211	6.884.737	6.574.031	5.400.618
Реализација	4.584.753	4.727.319	5.392.910	4.510.369
Реализација/План (%)	74%	69%	82%	84%

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-553.101	-216.324	-215.430	-149.050
Реализација	-336.274	-223.085	-67.660	-187.631
Реализација/План (%)	61%	103%	31%	126%

у 000 динара

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-239.791	345	375	500
Реализација	1.417	3.688	28.132	3.638
Реализација/План (%)	-1%	1069%	7502%	728%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	466	486	486	486
Реализација	470	472	476	484
Реализација - план	4	-14	-10	-2

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	739.281	748.343	740.372	806.848
Реализација	733.317	757.675	700.532	776.447
Реализација/План (%)	99%	101%	95%	96%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година Реализација (текућа година)
EBITDA	503.719	479.953	510.432	484.138
Ликвидност	11,5713979	9,656004773	17,05621139	14,18684049
Дуг/капитал	0,192666793	0,186504821	1,860998538	0,181323112
Профитна бруто маргина	0,008252286	0,030045296	0,229347551	0,01701264
Економичност	0,925097038	0,951946647	0,987029839	0,958093938
Продуктивност	0,12825287	0,116951501	0,134052758	0,153885552

6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У 2019. години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 705.852.000 динара. Улагања су највећим делом финансирана средствима из Буџетског фонда за воде АПВ.

У табели у наставку дата је структура и вредност инвестиционих улагања у ЈВП „Воде Војводине“ извршених током 2019. године.

Табела бр. 6.1: Инвестициона улагања у сталну имовину ЈВП „Воде Војводине“ у 2019. години

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	ОСТВАРЕНО 2019.
Изградња водних објеката	434.724.000
Постројења, опрема и уређаји	162.290.000
Земљиште и шуме	89.930.000
Нематеријална улагања	18.908.000
Укупно:	705.852.000

7. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију појединачних програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања.

Током 2019. године је реализовано укупно **235** поступака јавних набавки од чега, 145 поступака јавних набавки велике вредности и 90 поступка јавних набавки мале вредности, у укупном износу од **2.536.608.734,38** динара без ПДВ (Табела бр. 7.1, Графикон бр. 7.1).

Табела бр. 7.1: Структура јавних набавки у 2019. години

ВРСТА ПОСТУПКА	БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА	ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ	УЧЕШЋЕ
1	2	3	4
Јавне набавке велике вредности	145	2.419.006.636,71	95%
Јавне набавке мале вредности	90	117.602.097,67	5%
Укупно:	235	2.536.608.734,38	100%

СТРУКТУРА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ




Графикон бр. 7.1: Структура јавних набавки у 2019. години

Посматрано по предмету набавке, у структури укупне вредности јавних набавки (велике и мале вредности), у 2019. години, доминирају радови са 80 % (Табела бр. 7.2, Графикон бр. 7.2).

Табела бр. 7.2: Структура јавних набавки у 2019. години према предмету

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ВРСТИ ПРЕДМЕТА	БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО БЕЗ ПДВ	УЧЕШЋЕ
1	2	3	4
1. Добра	39	259.365.293,22	10,2%
2. Услуге	83	239.861.582,12	9,5%
3. Радови	113	2.037.381.859,04	80,3%
Укупно:	235	2.536.608.734,38	100%

СТРУКТУРА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕМА ПРЕДМЕТУ

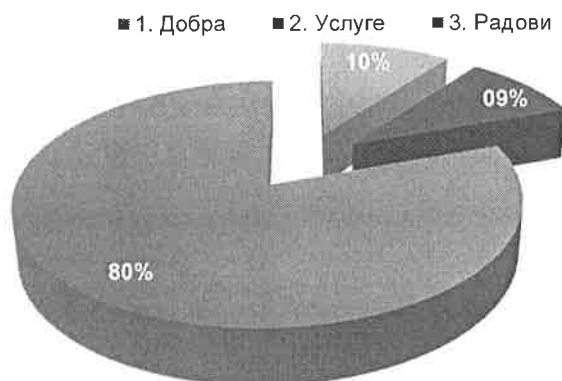

Графикон бр. 7.2: Структура јавних набавки у 2019. години према предмету

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ


У 2019. години, спроведено је 10 поступака јавних набавки велике вредности добара, 23 поступка јавних набавки велике вредности услуга и 112 поступака јавних набавки велике вредности радова, што укупно износи **145** поступака, односно **2.419.006.636,71** динара без ПДВ.

Код јавних набавки велике вредности највећи број спроведених поступака се односио на набавке радова (Табела бр. 7.3, Графикон бр. 7.3).

Табела бр. 7.3: Структура јавних набавки велике вредности у 2019. години по предмету

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ	БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО БЕЗ ПДВ	УЧЕШЋЕ
1	2	3	4
1. Добра	10	216.205.006,67	9%
2. Услуге	23	166.102.571,00	7%
3. Радови	112	2.036.699.059,04	84%
Укупно:	145	2.419.006.636,71	100%

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

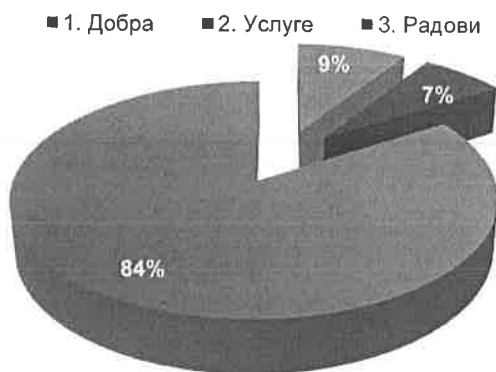

Графикон бр. 7.3: Структура јавних набавки велике вредности у 2019. години по предмету

Током 2019. године, било је укупно 247 отварања понуда, уз присуство 74 понуђача. Добили смо 317 понуда, од чега за јавне набавке велике вредности (отворени поступак, преговарачки поступак) 180 понуда и за јавне набавке мале вредности (изнад 500.000,00 до 5.000.000,00 динара без ПДВ) 137 понуда.

Укупна вредност реализованих јавних набавки (велике и мале вредности) је износила **2.536.608.734,38** динара без ПДВ, што укупно представља 52 % од износа плана јавних набавки за 2019. годину (4.920.518.143,45 динара без ПДВ).


У 2019. години, код јавних набавки велике вредности од 145 спроведених, 56 је реализовано у отвореном поступку, а 89 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (Табела бр. 7.4, Графикон бр. 7.4).

Табела бр. 7.4: Јавне набавке велике вредности у 2019. години по врсти поступка

Јавне набавке велике вредности - по врстама поступака	Број спроведених поступака	Укупно реализовано поступака без ПДВ	Учешће
1	2	3	4
Отворени поступак	56	530.310.476,86	22%
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (чл. 36. ЗЈН)	89	1.888.696.159,85	78%
Укупно:	145	2.419.006.636,71	100%

Преговарачке поступке без објављивања позива за подношење понуда смо спроводили на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке, за радове на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водних јединица, као и за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општина/градова.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ПО ВРСТИ ПОСТУПКА

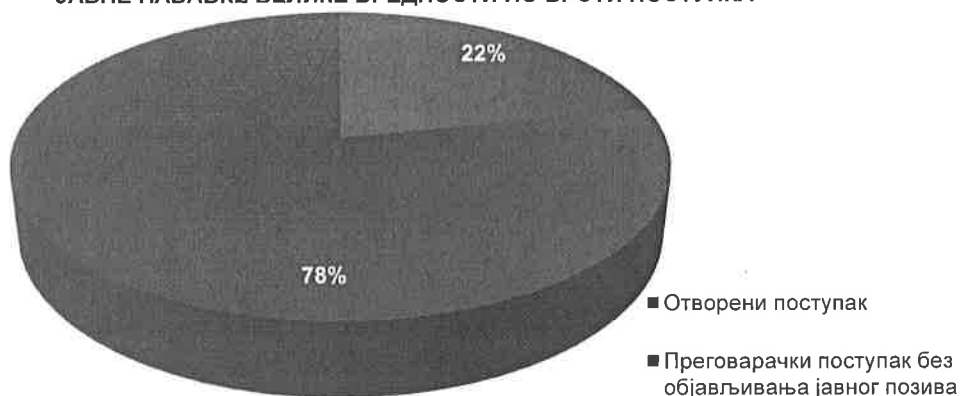

Графикон бр. 7.4: Јавне набавке велике вредности у 2019. години по врсти поступка

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У периоду од 01.01- 31.12.2019. године реализовано је 90 поступака јавних набавки мале вредности. И по вредности и по броју поступака, предњаче набавке услуга. (Табела бр. 7.5, Графикон бр. 7.5).

Структура спроведених јавних набавки мале вредности је следећа:


- Добра 18 поступака;
- Услуге 41 поступак;
- Радови 3 поступка.

Укупна вредност реализованих поступака јавних набавки мале вредности у 2019. години је 84.959.003,30 динара без ПДВ.

Табела бр. 7.5: Структура јавних набавки мале вредности у 2019. години по предмету

Јавне набавке мале вредности по врсти предмета	Број спроведених поступака	Укупно реализовано без ПДВ	Учешће
1	2	3	4
1. Добра	29	43.160.286,55	36,7%
2. Услуге	60	73.759.011,12	62,72%
3. Радови	1	682.800,00	0,58%
Укупно:	90	117.602.097,67	100,00%

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ

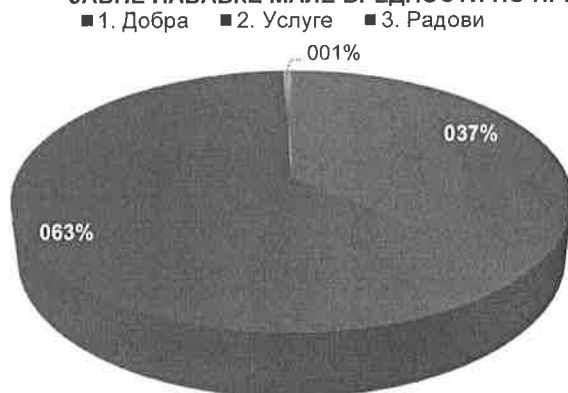

Графикон бр. 7.5: Структура јавних набавки мале вредности у 2019. години по предмету


За оцену успешности спроведених поступака јавних набавки, користи се показатељ исхода поступака, који показује колико је поступака јавних набавки успешно окончано, закључењем уговора, а колико је обустављено или у целини поништено од стране Наручиоца или Републичке комисије за заштиту права понуђача.

У 2019. години од укупног броја започетих поступака, 235 је окончано успешно (око 95%), док је 12 поступака обустављено, из разлога што није пристигла ни једна понуда (Табела бр. 7.6, Графикон бр. 7.6).

Табела бр. 7.6: Успешност спровођења јавних набавки у 2019. години

Исход поступака јавних набавки	Број поступака велике вредности	Број поступака мале вредности	Укупно	Учешће
Успешно спроведени	145	90	235	94,76%
Обустављени	7	5	12	4,84%
Поништени у целини	1	-	1	0,40%
Укупно:	153	95	248	100%

ИСХОД ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ

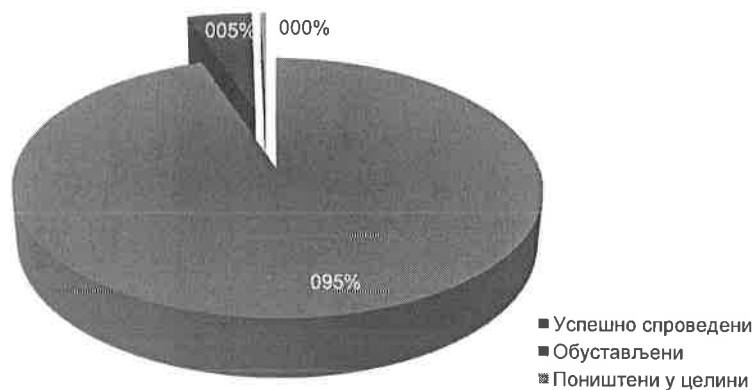

Графикон бр. 7.6: Преглед исхода јавних набавки у 2019. години

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

У периоду од 01.01-31.12.2019. године евидентирано је 175 поступака набавки на које се Закон не примењује. Основ за изузеће од прописаног законског поступка за јавне набавке, је у већини случајева то, да су такве набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности, односно чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара без ПДВ.

Табела бр. 7.7: Набавке у 2019. години на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Основ за изузеће по Закону о јавним набавкама	Укупан број закључених уговора/наруџбеница	Укупна вредност закључених уговора/наруџбеница
1	2	3
7.1.1) - Набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;	5	67.861.062,09
7.1.2а) - Набавке које се спроводе у складу са правилима утврђеним од стране међународних организација;	6	108.176.636,83
7.1.14) - Правне услуге и то: услуге заступања од стране адвоката: - у поступку арбитраже или споразумног решавања спорова, ... - у поступцима пред судовима или другим органима јавне власти у земљи;	1	1.900.000,00
39.2. - Набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности.	163	32.304.325,92
Укупно:	175	210.242.024,84

8. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И ПРОТОКОЛ

8.1 ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Највећи део активности у области односа с јавношћу и протокола, односи се на протоколарне, и активности у очувању и подизању угледа ЈВП „Воде Војводине“.

Комуникација са медијима и обвезницима накнаде за одводњавање за физичка лица, заједно са припремом све захтевнијих одговора разним државним органима и институцијама, грађанима и невладиним организацијама, писање различитих саопштења и информација, организовање обилазака терена (локација радова) за представнике републичких и покрајинских органа власти и медија, припрема штампаног, едукативног и промотивног материјала, одржавање и ажурирање сајта и Фејсбук странице, представљају свакодневне активности организационог дела задуженог за односе с јавношћу и протокол.

У току 2019. године ЈВП „Воде Војводине“ представило се и на сајамским манифестацијама, заједно са покрајинским секретаријатима учествовали смо на Међународном пољопривредном сајму у мају и сајму „Лорист“ у октобру.

У намери да на најбољи начин промовишемо значај водопривреде, а по могућности и привучемо средства за обнову водних објеката који представљају изузетно значајно индустријско наслеђе у Војводини, урадили смо један дужи и шест краћих филмова о најзначајнијим хидротехничким објектима.

Током 2019. године у медијима је забележено око 800 објава у вези са ЈВП „Воде Војводине“. Већина објава била је позитивног тоналитета следеће по учесталости биле су неутралне објаве, док је негативних било најмање, свега петнаестак. Негативне објаве углавном су се односиле на помор рибе у каналу код Србобрана, који се због испуштања непречишћених отпадних вода, догодио почетком новембра. Најзаступљеније теме биле су решења за накнаду за одводњавање, финансирање система за наводњавање из Абу Даби фонда, помор рибе у каналу код Србобрана и Регата Воде Војводине.

У наведеном периоду веб сајт Предузећа www.vodevojvodine.rs преко претраживача Гугл, посетило је више од 45.000 корисника интернета. Рекордна посета, са више од 5.600 кликова, забележена у августу. У то време достављено је највише решења обвезницима накнаде за одводњавање. На веб сајт постављене су 72 вести о активностима Предузећа, објављени су билтени одбране и сви документи о пословању у складу са законским прописима. Официјелну Фејсбук страницу „Воде Војводине“ прати више од 900 корисника ове друштвене мреже. На „Јутјуб“ каналу *VodeVojvodine* објављено је шест видео записа, од којих највећу гледаност има документарни филм „Четрдесет година од изградње Хидросистема ДТД“.

У Служби за односе с јавношћу и протокол, ради и особа овлашћена за приступ информацијама од јавног значаја. На основу Закона о доступности информацијама од јавног значаја, примљено је 19 захтева. На све захтеве одговорено је у предвиђеном законском року.

8.2 ОДНОСИ С КОРИСНИЦИМА

Преузимање послова задуживања накнаде за одводњавање за физичка лица од Пореске управе од 01.01.2017. године, изазвало је много недоумица и проблема, како обвезницима ове накнаде, тако и ЈВП „Воде Војводине“.

Оваква ситуација захтева континуирану комуникацију и излагање у сусрет питањима и захтевима обвезника, што је посао Корисничког центра ЈВП.

Највише обраћања Корисничком центру, телефоном или мејлом (и више стотина дневно), бележи се у месецима када се шаљу решења. Међутим, због великог броја жалби, примедби, недоумица, нејасноћа и издавања потврда о измиреним обавезама, оваква ситуација траје током целе године.

Посебан проблем представљају неажурирани подаци у Катастру који служе као основ за издавање решења.

Сем питања у вези са свим врстама накнада, највише обраћања корисничком сервису, односе се на стање каналске мреже и одбрамбених линија, закуп водног земљишта, рибокрађу, бесправну сечу шуме, загађење водотока.

9. ПРИЛОЗИ

Приликом израде Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину коришћене су подлоге у виду табеларних и графичких прилога, које су дате у наставку.

Табела бр. 9.1: Списак прилога Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину

Р. Б.	НАЗИВ ПРИЛОГА	СТРАНА
1	Извршени радови на редовном одржавању система за одводњавање у 2019. години	72, 73
2	Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2019. години	74
2.1	Програм радова на одржавању Хс ДТД у 2019. годину уз ангажовање трећих лица	75
3	Преглед извршених радова на редовном одржавању заштитних водних објеката у 2019. години	76
4	Трошкови одбране од поплава	77
5	Регулационо-санациони радови изведени у 2019. години	78
5.1	Регулационо-санациони радови по Програму за 2018. годину изведени у 2019. години	78
6	Преглед парничних поступака у 2019. години	79-83
7	Биланс стања на дан 31.12.2019.	84-86
8	Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019.	87, 88

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ



Прилог бр. 1: Извршени радови на редовном одржавању система за одводњавање у 2019. години

Р. Б.	Опис позиције рада	Јединица мере	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ				ИЗВРШЕНО I-III 2019.			ИЗВРШЕНО IV-XII 2019.			ИЗВРШЕНО I-XII 2019.		
			Јединица цена	Количина	Динара	Јединица цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара			
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ															
1	Инжењер за водни режим	час	1.135,61	10.759	12.217.592	1.135,61	2.747	3.119.134	8.209	9.322.224	10.956	12.441.358			
2	Деонични техничар	час	623,47	45.919	28.629.181	623,47	11.722	7.308.259	35.136	21.906.087	46.858	29.214.345			
3	Хидролог за подземне воде	час	623,47	5.336	3.326.756	623,47	1.358	846.728	4.073	2.539.237	5.431	3.385.965			
4	Хидротехничар за катастар објеката	час	623,47	4.458	2.779.717	623,47	1.131	705.144	3.397	2.117.926	4.528	2.823.070			
5	Референт за геодетске послове	час	979,74	5.336	5.227.774	979,74	1.360	1.332.535	4.071	3.988.276	5.431	5.320.811			
6	Инжењер за мелiorације	час	979,74	8.409	8.238.779	979,74	2.153	2.109.292	6.432	6.301.445	8.585	8.410.737			
7	Машински инжењер зацрпне станице	час	979,74	8.279	8.111.744	979,74	2.129	2.085.465	6.359	6.229.923	8.487	8.315.398			
8	Механичар хидромашинских постројења	час	623,47	20.325	12.671.818	623,47	5.218	3.253.166	15.582	9.714.908	20.800	12.968.074			
9	Руководиоц црпне станице	час	623,47	199.372	124.302.755	623,47	48.547	30.267.698	145.601	90.778.167	194.149	121.045.865			
10	Инжењер за електроопрему	час	979,74	6.070	5.947.394	979,74	1.547	1.515.746	4.632	4.538.400	6.179	6.054.146			
11	Потонски електричар	час	623,47	10.569	6.589.245	623,47	2.890	1.677.134	8.064	5.027.974	10.754	6.705.108			
12	Хидроградјевински радници	час	367,40	176.091	64.695.925	367,40	44.962	16.519.011	134.871	49.551.631	179.833	66.070.642			
13	Израда елабората: а) Билтени б) Катастар објеката	час	367,40	176.091	10.197.695	367,40	44.962	16.519.011	134.871	49.551.631	179.833	66.070.642			
СВЕГА I					292.936.376			73.293.906		219.701.443		292.995.349			
II РЕДОВНИ РАДОВИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ															
1	Измјуљивање канала багером са стандардном руком max дохват/max дубина ископа 8м/5м	м3	118,13	287.324	33.941.582	108,21	35.239	3.813.216	153.114	18.087.395	188.353	21.900.611			
2	Измјуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	м3	200,69	140.824	28.261.967	184,58	41.508	7.651.627	133.453	26.782.746	174.962	34.444.373			
3	Измјуљивање канала - машински	час	7678,27	889	6.829.800	7.033,78	107	752.615	821	6.300.365	928	7.052.980			
4	Измјуљивање канала - ручно	м3	598,86	1.796	1.075.552	598,86	77	46.286	437	261.971	515	308.257			
5	Разастирање нових депонија	м3	84,71	324.408	27.480.631	77,94	52.325	4.078.249	197.270	16.710.760	249.596	20.789.008			
6	Разастирање старих депонија	м3	84,71	122.246	10.355.450	77,94	17.654	1.375.925	61.775	5.232.953	79.429	6.608.879			
7	Утовар и транспорт	м3	604,05	22.735	13.733.363	551,04	5.569	3.068.620	16.730	10.105.706	22.299	13.174.326			
Специфично					1.900.000			549.234		4.593.840		5.143.074			
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА															
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,18	4.465.885	5.269.745	1,04	140.729	146.358	3.159.400	3.728.092	3.300.129	3.874.451			
	Уклањање биљ. вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м	м2	7,75	952.890	7.384.894	6,96	52.545	365.713	7.054.210	8.323.968	7.106.755	8.689.681			
	Уклањање биљ. вег. - трава коса површина преко 1,5 м	м2	3,00	1.172.805	3.518.415	2,65	197.510	523.402	575.891	4.463.152	773.401	4.986.554			
	Уклањање биљ. вег. - трска коса површина преко 1,5 м	м2	15,50	1.206.062	18.693.955	13,93	251.280	3.500.328	6.304.628	18.913.884	6.555.908	22.414.212			
	Уклањање биљ. вег. - шибље равна површина и коса до 1,5 м	м2	6,00	392.032	2.352.192	5,31	64.944	344.854	156.271	2.422.207	221.216	2.767.061			
	Уклањање биљ. вег. - шибље коса површина преко 1,5 м	м2	23,26	198.234	4.610.924	20,89	49.839	1.041.127	1.291.767	7.750.603	1.341.606	8.791.730			
	Уклањање биљ. вег. са корпом за изношење	м2	21,31	1.212.751	25.843.726	19,77	254.942	5.040.196	1.261.016	26.872.252	1.515.958	31.912.448			
9	Машинско кошење - пловном косачицом	м2	1,90	389.999	740.998	1,90									
10	Ручно кошење	м2	5,34	549.664	2.935.207	5,25			384.326	2.052.301	384.326	2.052.301			
11	Субзирање вегетације - хемијским путем	м2	2,45	9.603.280	23.528.036	2,45	355.331	870.560	10.580.483	25.922.184	10.935.814	26.792.744			
12	Ручно сечење шибља и багремца	м2	15,31	239.144	3.661.292	15,31	3.105	47.537	154.620	2.367.226	157.725	2.414.763			
13	Машинско тапуирање багремца и шибља преко Ø 5 цм	м2	33,2	821.215	27.264.352	30,18	233.716	7.053.540	821.633	27.278.231	1.055.349	34.331.770			
14	Машинско тапуирање багремца и шибља до Ø 5 цм	м2	22,65	1.612.601	36.525.416	20,59	947.219	19.503.244	1.876.579	42.504.525	2.823.799	62.007.770			
Специфично					11.488.950			7.262.317		29.793.084	0	37.055.401			
СВЕГА II					297.366.445			67.044.950		290.467.445		357.512.395			
III ПОСЕБНИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ -															
1	Објекти на каналској мрежи														
2	Устава - грађевински део				33.417.926			8.134.920		30.658.040		38.792.960			
3	Зграде црпних станица				3.843.496			1.817.169		1.728.774		3.545.943			
4	Зграде чуварица и машиниста				9.940.072			2.373.619		3.690.298		6.063.916			
5	Далеководи				2.157.869			587.282		2.849.121		3.436.403			
6	Трафо станице				240.851					325.059		325.059			
СВЕГА III					782.308			115.139				115.139			



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. Б.	Опис позиције рада	Јединица мере	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ			ИЗВРШЕНО I-III 2019.			ИЗВРШЕНО IV-XII 2019.			ИЗВРШЕНО I-XII 2019.		
			Јединична цена	Количина	Динара	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Количина	Динара	Динара
7	Зграде осталих функција				1.152.299									0
8	Остали објекти				766.742									0
	- ОПРЕМА -													
	МАШИНСКИ ДЕО													
9	Стабилна црна постројења (машински део)				28.260.627			12.715.724		16.610.379			29.326.103	
10	Мобилна црна постројења (машински део)				2.668.294			830.396		642.087			1.472.483	
11	Устава - машински део				4.127.357			2.968.648		2.608.447			5.577.095	
	ЕЛЕКТРО ДЕО									0				
12	Далеководи				3.153.482			403.466		610.370			1.013.836	
13	Кабловски водови				666.527					615.755			615.755	
14	Тrafo станице				7.768.857			1.935.207		6.624.342			8.559.549	
15	Црпне станице				8.864.716			8.655.178		7.996.516			16.651.694	
16	Устава и остали објекти				180.708			-		0			0	
17	Радио и телефонски везе				2.124.609			554.299		1.461.399			2.015.698	
18	Мерни уређаји				493.477			-		0			0	
	- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -									0				
19	Стабилна црна постројења				28.056.333			4.056.184		19.749.327			23.805.511	
19a	Утрошак електричне енергије				87.000.000			12.760.058		76.884.628			89.644.686	
20	Мобилна (покр.) црна постројења				6.458.348			34.740		881.131			915.871	
	СВЕГА III				232.124.897			57.942.030		173.935.671			231.877.701	
	IV РАД ВАН НОРМАТИВА													
1	Одржавање акумулација				4.217.266			484.643		2.681.506			3.166.149	
	СВЕГА IV				4.217.266			484.643		2.681.506			3.166.149	
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ													
1	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				169.107.063			7.253.391		67.242.061			74.495.452	
2	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				45.000.000			12.761.341		28.672.447			41.453.788	
	СВЕГА V				214.107.063			20.034.732		95.914.508			115.949.240	
	VI ОСТАЛИ ТРОЈКОВИ													
1	Накнаде штете							-						
2	Осигурање водопривредних објеката							-						
3	Амортизација водопривредних објеката				8.333.334			4.320.326		2.601.301			6.921.627	
4	Хитне интервенције				8.333.334			4.320.326		2.601.301			6.921.627	
	СВЕГА VI													
	VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА													
1	Одржавање дела хидросистема				20.855.017			1.725.963		18.959.774			20.685.737	
	СВЕГА VII				20.855.017			1.725.963		18.959.774			20.685.737	
	УКУПНО I-VII				1.069.940.397			224.846.549		804.261.649			1.029.108.197	
	ПДВ 20%				213.988.079			44.969.310		160.852.330			205.821.639	
	ПРОГРАМ СА ПДВ				1.283.928.476			269.815.858		965.113.978			1.234.929.837	

Прилог бр. 2: Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2019. години

РЕД. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ЈЕД. МЕРЕ	ЈЕДИН. ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1	Водећи инжењер за послове машинства	час	1.224,68	1.776	2.175.031,68
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1.135,61	5.328	6.050.530,08
3	Главни инжењер за послове машинства	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
5	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.135,61	1.381	1.568.277,41
6	Главни инжењер за пловидбу	час	1.135,61	1.776	2.016.843,36
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	979,74	0	0,00
8	Самостални инжењер за послове машинства	час	979,74	1.776	1.740.018,24
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	979,74	0	0,00
10	Самостални техничар за грађевинске послове	час	623,47	222	138.410,34
11	Самостални техничар за пловидбу	час	623,47	1.776	1.107.282,72
12	Самостални референт за геодетске послове	час	623,47	1.776	1.107.282,72
13	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	623,47	1.776	1.107.282,72
14	Деоничарски техничар	час	623,47	23.088	14.394.675,36
15	Погонски техничар	час	623,47	8.880	5.536.413,60
16	Каналски радник	час	367,40	39.960	14.681.304,00
СВЕГА 1					55.657.038,95
2. Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				8.017.894,08
2	Преводнице				11.072.827,20
2	Хидрочвор				39.308.536,56
2	Црпне станице				6.090.054,96
5	Остали објекти				3.321.848,16
6	Електрична енергија				29.570.446,71
СВЕГА 2					97.381.607,67
УКУПНО I					153.038.646,62
II. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Измужење канала пловном механизацијом	m ³	362,70	257.219,11	93.293.370,22
2	Осигурање обала филтер пластиком	m	1.343,85	0,00	0,00
3	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	m	66,10	150,00	9.915,00
4	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	m ²	4.102,00	0,00	0,00
5	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	m ²	2.495,82	0,00	0,00
6	Равнање инспекционе стазе	m ²	0,61	988.527,00	603.001,47
7	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	m ²	1,36	5.418.692,20	7.369.421,39
8	Кошење трске на обалама канала механизацијом	m ²	3,00	1.428.524,00	4.285.572,00
9	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	m ²	23,29	843.598,00	19.647.397,42
10	Сечење шибља на обалама канала ручно	m ²	15,06	191.545,00	2.884.667,70
11	Сечење дрвећа Ф-10-20cm на обалама канала	ком.	346,85	2.316,00	803.304,60
12	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	m ²	1,72	269.360,00	463.299,20
13	Хирбицидисање растиња на облогама	m ²	5,12	122.622,00	627.824,64
14	Кошење подводног растиња пловном косачицом	m ²	1,90	3.590.690,00	6.822.311,00
15	Кошење трске пловном косачицом	m ²	18,17	832.240,00	15.121.800,80
16	Чишћење облога канала ручно	m ²	17,74	37.650,00	667.911,00
17	Подмлађивање корпарске врбе	m	55,76	0,00	0,00
18	Кошење траве - ручно	m ²	4,55	454.265,00	2.066.905,75
СВЕГА 1.					154.666.702,19
2. Објекти					
1	Уставе				5.655.599,70
2	Преводнице				5.094.720,16
3	Црпне станице				2.117.635,28
4	Остали објекти				670.469,60
5	Помоћни гредни затварачи				0,00
6	Функционалне зграде				284.211,24
7	Гориво, потрошни материјал и остали трошкови				25.937.788,69
СВЕГА 2					39.760.424,67
3. Заштитни објекти					
1	Равнање круне насипа	m ²	0,61	53.000	32.330,00
2	Кошење траве механизацијом на насипима	m ²	1,36	1.516.333	2.062.212,88
3	Кошење траве у кориту механизацијом	m ²	1,09	535.030	583.182,70
4	Чишћење облога кејова	m ²	17,74	95.020	1.685.654,80
СВЕГА 3.					4.363.380,38
УКУПНО II					198.790.507,24
III. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1	Грађевински радови на Хс ДТД				23.991.072,86
2	Машинско кошење на Хс ДТД				8.428.374,52
СВЕГА 1					32.419.447,38
2. Објекти					
1	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				56.987.307,75
2	Машински радови на објектима Хс ДТД				14.895.338,67

РЕД. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ЈЕД. МЕРЕ	ЈЕДИН. ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
3	Електро радови на објектима Хс ДТД				11.748.674,29
	СВЕГА 2				83.631.320,71
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				0,00
	4. Непредвиђени радови и хитне интервенције				
1	Непредвиђени радови				0,00
2	Хитне интервенције грађевинским машинама				710.400,00
	СВЕГА 4				710.400,00
	5. Радови на суфинансирању са општинама				
	СВЕГА 5				12.000.000,00
	УКУПНО III				128.761.168,09
	V. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
1	Оскултација објекта на Хс ДТД				1.380.000,00
2	Услуге снимања, испитивања и анализе на ХС ДТД				0,00
3	Услуге стручног надзора				0,00
	УКУПНО IV				1.380.000,00
	VI. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	УКУПНО V				2.472.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)				484.442.321,95

Прилог бр. 2.1: Програм радова на одржавању Хс ДТД у 2019. годину уз ангажовање трећих лица

РЕД. БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДА	ИЗНОС
	I ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА	
	1.Канали	
1	Грађевински радови на Хс ДТД	23.991.072,86
2	Машинско кошење на Хс ДТД	8.428.374,52
	СВЕГА 1	32.419.447,38
	2.Објекти	
1	Грађевински радови на објектима Хс ДТД	56.987.307,75
2	Машински радови на објектима Хс ДТД	14.895.338,67
3	Електро радови на објектима Хс ДТД	11.748.674,29
	СВЕГА 2	83.631.320,71
	3.Функционалне зграде	
	СВЕГА 3	0,00
	4. Непредвиђени радови и хитне интервенције	
1	Непредвиђени радови	0,00
2	Хитне интервенције грађевинским машинама	710.400,00
	СВЕГА 4	710.400,00
	5. Радови на суфинансирању са општинама	
	СВЕГА 5	12.000.000,00
	УКУПНО III	128.761.168,09

Прилог бр. 3: Преглед извршених радова на редовном одржавању заштитних водних објеката у 2019. години

Гру- па	Р. Б.	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ (дин.)
I НАСИПИ						
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	7.192,000	1.135,61	8.167.307,12
	2	Деонични техничар	h	28.742,000	623,47	17.919.774,74
	3	Хидротехнички радник на насипу	h	107.424,000	367,40	39.467.577,60
	4	Шумарски референт	h	2.458,000	979,74	2.408.200,92
I.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m ²	1.061.858,460	0,610	647.733,66
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m ²	107.212.386,950	1,360	145.808.846,26
	3	Кошење траве на неприступачним теренима	m ³	295.880,000	4,630	1.369.924,40
	4	Кошење шибља, механизовано	m ²	1.838.704,860	1,700	3.125.798,26
	5	Сечење шибља, ручно	m ²	158.663,000	5,800	920.245,40
	6	Хербицидисање корова, рад	m ²	1.966.000,000	1,710	3.361.860,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m ²	204.600,000	5,120	1.047.552,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m ²	329.044,000	18,040	5.935.953,76
	9	Одржавање насипских капија	ком	102,000	1.939,220	197.800,44
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	868,000	30,000	26.040,00
	11	Заштита ШЗП	ha		0,00	0,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				22.051.246,50
УКУПНО I:						252.455.861,06
II РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ						
II.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	3.059,00	1.135,610	3.473.830,99
	2	Деонични техничар	h	9.232,00	623,470	5.755.875,04
	3	Хидротехнички радник на насипу	h	29.389,00	367,400	10.797.518,60
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m ²	4.624.929,30	1,180	5.457.416,57
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m ²	0,00	4,630	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m ²	263.658,70	1,700	448.219,79
	4	Сечење шибља, ручно	m ²	0,00	5,800	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m ²	0,00	1,900	0,00
	6	Хемијско третирање облоге	m ²	0,00	5,200	0,00
	7	Чишћење корита од наноса	m ³	250,00	577,030	144.257,50
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m ²	55.440,00	18,040	1.000.137,60
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m ²	0,00	2.513,860	0,00
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.939,220	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	0,00	30,000	0,00
	12	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	280,00	4.045,630	1.132.776,40
	13	Конт. сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	75,00	12.833,380	962.503,50
	14	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	7,50	27.833,500	208.751,25
	15	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећених рег. грађ.	ком	7,50	100.200,60	751.504,50
	16	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m ²		0	0,00
	17	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	18	Израда катастра водозахвата	ком	0,00	79.305,380	0,00
	19	Израда катастра водоиспуста	ком	0,00	97.417,190	0,00
	20	Снимање евиденционих профила	km	21,00	54.555,580	1.145.667,18
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				8.023.181,48
УКУПНО II:						39.301.640,40
III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА						
III.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	367,400	514.360,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	367,400	514.360,00
	3	Вежба	din.	43,00	13.010,000	559.430,00
	4	Моторни тегљач	din.	103,30	10.080,000	1.041.264,00
		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
III.2	1	Моторни тегљач	din.			0,00
УКУПНО III:						2.629.414,00
IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА						
IV.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоцац	h	271,00	1.135,610	307.750,31
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	623,470	168.960,37
	3	Теренско возило	km.	3.340,68	63,970	213.703,20

Гру-па	Р. Б.	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ (дин.)
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m ³	109,16	351,690	38.391,00
	2	Чишћење од муља ручно	m ³	5,00	1.469,600	7.348,00
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				
	5	Сечење шибља у кориту	m ²	1.500,00	6,010	9.015,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	270,540	27.054,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m ²	100,00	6,010	601,00
	8	Чишћење слапишта машински	m ³	0,00	351,690	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m ³	4,81	461,910	2.223,59
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				775.046,47
V		БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	787,00	1.135,61	893.725,07
	2	Техничар бране	h	1.341,00	623,47	836.073,27
	3	Радник металске струке	h	313,00	623,47	195.146,11
	4	Радник електро струке	h	0,00	623,47	0,00
	5	Хидротехнички радника задужен за бране	h	8.911,00	367,40	3.273.901,40
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m ²	173.941,82	1,25	217.427,28
	2	Кошење траве , ручно	m ²	182.894,70	5,25	960.197,18
	3	Сечење шибља, ручно	m ²	23.280,00	5,80	135.024,00
	4	Чишћење облога од растиња	m ²	31.944,00	18,04	576.269,76
	5	Ручно равнање круне бране	m ²	174,38	422,00	73.587,36
	6	Одрж. приступног пута по круни	m ²	689,26	338,87	233.569,12
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m ²	1.929,00	110,22	212.614,38
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m ²	0,00	2.364,45	0,00
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m ²	0,00	1.898,16	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				3.032.333,24
		УКУПНО V:				10.639.868,17
VI		ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			929.792,26
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Хс ДТД	дин.			0,00
	2	Босут	дин.			54.798,42
		УКУПНО VI:				984.590,68
		УКУПНО (I- VI):				306.786.420,78
		ПДВ 20% :				61.357.284,16
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				368.143.704,94

Прилог бр. 4: Трошкови одбране од поплава у 2019. години

Р. Б.	УЧЕСНИЦИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА	СПОЉНЕ ВОДЕ	УНУТРАШЊЕ ВОДЕ	УКУПНО:
		ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (01.01-31.12.2019)	ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (01.01-31.12.2019)	ТРОШКОВИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (01.01-31.12.2019)
1	2	3	4	5
1	„Западна Бачка“ Сомбор	54.127,99		54.127,99
2	„Дунав“ Бачка Паланка		4.095.113,50	4.095.113,50
3	„Сента“ Сента		729.705,50	729.705,50
4	„Шајкашка“ Нови Сад	661.550,15	12.983.124,38	13.644.674,53
5	„Горњи Банат“ Кикинда	104.967,94	521.236,85	626.204,79
6	„Средњи Банат“ Зрењанин	1.051.586,30	16.312.784,54	17.364.370,84
7	„Тамиш-Дунав“ Панчево	175.389,31	256.449,07	431.838,38
8	„Подунавље“ Ковин	290.246,99	2.590.993,26	2.881.240,25
9	„Ушће“ Бела Црква	76.630,56		76.630,56
10	„Галовица“ Земун	317.878,18	10.848.979,28	11.166.857,46
11	„Сава“ Шабац		8.591.278,86	8.591.278,86
12	ВПД „Хидросрем“ Ср. Митровица		1.933.819,09	1.933.819,09
	УКУПНО:	2.732.377,42	58.863.484,33	61.595.861,75

Прилог бр. 5: Регулационо-санациони радови изведени у 2019. години

Р. Б.	РЕКА СЕКТОР/ДЕОНИЦА	СТАЦИОНАЖА ЛОКАЦИЈЕ КОЈА СЕ САНИРА	ОПИС РАДОВА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (ДИН)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА I - XII	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.11.3. Дунав, леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске.	rkm 1344+973 - rkm 1344+953	Санација леве обале Дунава код Вајске од rkm 1344+973 до rkm 1344+953.	9.468.044,80	9.468.044,80	100%
2	Д.13.3.1. Тиса, Десни насип уз Тису од улива Чика до Макошког Брега.	km 107+260 - km 111+170 и km 88+250 - km 88+530	Санација деснообалног тиског насипа од km 107+260 до km 111+170 (Макош - Жути брег). Санација косине и круне насипа на коме су се појавиле бразготине уградњом недостајућег хумусног слоја. Санација круне насипа од km 88+250 до km 88+530 оштећеног од дубоких колотрага.	2.290.792,63	2.284.259,26	100%
3	С.2.3.5. Сава, Леви насип уз Саву код Сремске Раче.	km 154+500 - km 155+000	Санација левообалног савског насипа од km 154+500 до km 155+000 код Сремске Раче постављањем дренажног цевовода уз брањену ножицу насипа.	2.400.000,00	2.400.000,00	100%
4	Д.10.3.2. Нови Сад, Дунав десни насип уз динав код тврђаве - Петроварадин.	rkm 1254+250 - rkm 1254+100 и rkm 1255+107 - rkm 1254+970	Санација оштећене обалоутврде код Петроварадина на десној обали Дунава од rkm 1254+250 до rkm 1254+100 и од rkm 1255+107 до rkm 1254+970.	7.184.881,54	5.903.035,79	82%
5	Д.11.2.1. Дунав, леви насип уз Дунав од Вајске до Младенова	km 55+570 - km 59+200	Уређење принасипског појаса левообалног дунавског насипа код Плавне од km 55+570 до km 59+200.	11.344.599,43	11.344.599,43	100%
6	Д.14.1 Тиса, десни насип уз Тису од Ушћа Чика до Чуруга	km 64+350 - km 68+500	Уређење принасипског појаса деснообалног тиског насипа код Бечеја од km 64+350 до km 68+500.	2.915.386,02	2.915.386,02	100%
7	Д.20.3.2 и Д.20.4.1 Пловни Бегеј, леви и десни насип уз Пловни Бегеј од држ. границе до Клека Д.20.2.1 и Д.20.3.1, Стари Бегеј Леви и десни насип уз Стари Бегеј од државне границе до Јанковог Моста	km 3+300 - km 30+365 km 15+189 - km 17+800	Уређење насипа и принасипског појаса левообалног и деснообалног насипа на Пловном Бегеју од km 3+300 до km 30+365, на Старом Бегеју од km 15+189 до km 17+800.	12.482.529,65	12.482.529,65	100%
8	Д.16.1.4. и Д.16.2.1. Тиса, Леви насип уз Тису ЦС Вок до ушћа Златице и од ушћа Златице до ЦС Бочар - Иђош	km 120+900 - km 123+900 km 94+500	Уређење левообалног тиског насипа код Санада од km 120+900 до km 123+900, поправка круне насипа насипских рампи, и насипских капија. Санација бетонске облоге на небрањеној косини насипа у зони моста код Аде на 94+500.	4.500.000,00	4.500.000,00	100%
9	С.2.6. Брана Борковац и С.2.7. Брана Павловци	Водоток Борковац Водоток Кудош	Израда катодне заштите цевовода темељног испуста на Бранама „Борковац“ и „Павловци“. Санација оштећеног бетонског прелива на Брани „Борковац“. Постављање цевне дренаже у брањеном терену бране „Борковац“.	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
10	Д.15.2 Тиса, Десна обала Тисе од од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину	km 32+986 - km 33+265	Санација круне насипа л.о. Дунава од km 32+986 до km 33+265 - Друга Фаза (Калиште). Санација одводног цевовода некадашње парне црпне станице „Мошорин“	3.258.115,69	3.227.900,85	99%
УКУПНО:				58.844.349,76	57.525.755,80	98%

Прилог бр. 5.1: Регулационо-санациони радови по Програму за 2018. годину, изведени у 2019.

Р. Б.	РЕКА СЕКТОР/ДЕОНИЦА	СТАЦИОНАЖА ЛОКАЦИЈЕ КОЈА СЕ САНИРА	ОПИС РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (ДИН)	ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.12.3. Дунав, леви насип уз Дунав од државне границе до Кучке	km 0+000 - km 11+695	Радови на уређењу насипа уз Бајски канал почев од границе са Републиком Мађарском до улива Бајског канала у канал ОКМ Бездан- Бачки Брег, од km 0+000 до km 11+695.	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
2	Д.11.3. Дунав, леви насип уз Дунав од Богојева до Вајске.	rkm 1345+022 - rkm 1344+973	Санација леве обале Дунава код Вајске од rkm 1345+022 до rkm 1344+973.	22.381.955,20	22.381.955,20	100%
3	Д.15.2 Тиса, Десна обала Тисе од од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину Д.10.2.2 Дунав Леви насип уз Дунав од ушћа канала Н.Са. - Савино Село (ХС ДТД) до Ковиља	km 21+195 - km 27+972 и km 33+265 - km 34+610	Санација оштећене зидне облоге небрањене косине постојећег насипа на десној обали Тисе од km 27+130 до km 27+180 и од 27+802 до km 27+972. Санација круне насипа л.о. Дунава од km 33+265 до km 34+610 - Прва Фаза (Калиште)	15.006.127,26	12.572.951,40	84%
4	С.2.4.1 Брана Шидска Шидина С.2.5.1 Брана Мохарач	Водоток Шидина Водоток Мохарач	Брана са акумулацијом Шидска Шидина (Сот) и брана са акумулацијом Мохарач, санација и геодетско осматрање брана.	1.000.000,00	991.831,49	99%
УКУПНО:				40.388.082,46	37.946.738,09	94%



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Прилог бр. 6: Преглед парничних поступака у 2019. години

6.1 ПОСТУПЦИ ПРАВОСНАЖНО РЕШЕНИ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ

Р. БР.	ТУЖИЛАЦ	ТУЖЕНИ	БР. ПРЕДМЕТА	НАДЛЕЖНИ СУД	ПРЕДМЕТ СПОРА	ИСХОД ПОСТУПКА	ЗАСТУПАЊЕ	ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК
1.	Ђере Иштван из Бечеја	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 58362/10	Основни суд у Бечеју	Основ: накнада штете – поплава у 2010. год. Вредност спора: 5.972.917,70 дин. са 33К	Одбијен тужбени захтев тужилаца.	Дејана Спасојевић-Иванчић	
2.	Ловачко удружење Врбас и Јаребица	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-744/17	Привредни суд Нови Сад	Основ: накнада штете због утичућа дивљачи у каналу Вредност спора: 2.900.000,00 дин. са 33К	У корист тужилаца – пресудом усвојен тужбени захтев на износ од 2.300.000,00 динара за 33К од 6.5.2017. године и 600.000,00 динара са 33К од 28.11.2018. године	Дејана Спасојевић-Иванчић	
3.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ЈКП „Градско Зеленило“ Нови Сад	П-238/2018	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада трошкова за одржавање пословне зграде 2010.-2012. Вредност спора: 10.108.508,62 дин. са 33К	Усвојен тужбени захтев (7.246.121,54 динара са 33К)	Дејана Спасојевић-Иванчић	
4.	ЈП „Путеви Србије“ Београд	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П 1387/17	Привредни суд Нови Сад	Основ: стицање без основа – враћање накнаде за одвођавање због поништаја решења ЈВП-а Вредност спора: 115.120.400,09 дин.	Донета је првостепена пресуда којом је одбијен тужбени захтев. Другостепеном пресудом преимначне првостепена одлука у корист тужилаца.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Изјављена ревизија
5.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	Веселин Радловић и Ђорђе Десанка из Суботице	П 267/17	Виши суд Суботица	Основ: стицање без основа – враћање износа наплаћеног по пресуди која је поништена Вредност спора: 15.480.423,35 дин. са 33К	Донета је првостепена пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев на износ од 7.722.494,85 динара са 33К. Другостепеном пресудом усвојен тужбени захтев у целости.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Тужаоци изјавили ревизију.
6.	Ђорђе Вишекруна	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П1-30/17	Виши суд Нови Сад	Основ: злостављање на раду	10.01.2019. године решење којим се тужба сматра повученом.	Дејана Спасојевић-Иванчић	
7.	Саша Маријановић	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П1-66/17	Основни суд Сомбор	Основ: утврђење радног односа	Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев. Другостепеном пресудом потврђена првостепена пресуда. Писање ревизије у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	
8.	А.Д.ПД „Јединство“ Жабаљ	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1801/15	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете - поплава у 2006. год. Вредност спора: 56.666.020,00 дин. са 33К	Правноснажном пресудом тужбени захтев.	Игор Ерцег	Тужилац изјавио ревизију.
9.	Вучковић Бранислав из Кузмина	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1077/16	Основни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете – поплава у 2010. г. Вредност спора: 8.394.561,00 дин. са 33К	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	
10.	Иванишевић Ђорђе и Драган из Гајдобре	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 82/17	Основни суд у НС – Суд. јединица у Б. Паланци	Основ: накнада штете – поплава у 2010. г. Вредн. спора: 3.294.459,00 дин. са 33К	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	
11.	Агро&Migs ДОО Н. Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1031/13	Привредни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете – поплава у 2010. г. Вредн. спора: 40.775.123,00 дин. са 33К	Правноснажном пресудом тужбени захтев.	Игор Ерцег	Тужилац изјавио ревизију
12.	Светлик Јано из Ковачице	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.201/17	Основни суд Панчево, Судска јединица Ковачица	Основ: накнада штете због заузећа земљишта изградњом канала Вредност спора: 492.375,00 дин. са 33К	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	
13.	Чаковац Пантелија и др. из Новог Сада	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	П-42/14	Виши суд Нови Сад	Основ: накнада штете Вредн. спора: 150.000,00 евра у дин. противвредности са 33К	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. БР.	ТУЖИЛАЦ	ТУЖЕНИ	БР. ПРЕДМЕТА	НАДЛЕЖНИ СУД	ПРЕДМЕТ СПОРА	ИСХОД ПОСТУПКА	ЗАСТУПАЊЕ	ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК
14.	Алмаша Јожеф из Падеја	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	267/2015	Основни суд Кикинда С/Нови Кнежевац	Основ: стицање без основа – враћање накнаде за одводњавање за период 2005 – 2010. Вредн. спора: 400.000,00. дин. са 33к	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	
15.	Пауновић Саша из Оуака	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	П. 1213/13	Основни суд у Сомбору	Основ: накнада штете – поплава у 2010.г. Вредност спора: 2.000.000,00 динара	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Игор Ерцег	
16.	Миливој Релџин	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 22/13	Виши суд Зрењанин	Основ: тужба ради накнаде штете – одбрана од поплава 2006. године Вредн. спора: 29.981.168,09 . дин.	Правноснажном пресудом одбијен тужбени захтев.	Игор Ерцег	Тужилац изјавио ревизију
17.	Матија Балаш из Новог Сада	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 2188/13	Основни суд Нови Сад	Основ: утврђивање права својине Вредн. спора: 501.000,00 дин.	Одбијен тужбени захтев тужојца.	Тијана Живановић, дипл. правник	
18.	Ачански Милица из Бачке Тополе	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	6127/15	Основни суд Нови Сад	Основ: накнада штете због повреде проузроковане упадом у шахт Вредн. спора: 280.000,00. дин. са 33к	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Тијана Живановић, дипл. правник	Изјављена уставна жалба
19.	Пинтер Алберт из Новог Сада	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 7628/16	Основни суд Нови Сад	Основ: накнада штете – повреда на насипу Вредн. спора: 150.000,00. дин. са 33к	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев.	Тијана Живановић, дипл. правник	
20.	ПИ „Панонка“ доо Сомбор	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-1460/17	Основни суд у Сомбору	Основ: утврђивање недопустивости извршења Вредност спора: 103.515,72 динара	Правноснажном пресудом одбијен тужбени захтев тужојца	Тијана Живановић, дипл. правник	
21.	Жилић Фадил из Сенте	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-80/2017	Основни суд у Сенти	Основ: утврђивање -право својине на непокретностима Вредност спора: 20.000,00 динара	Правноснажном пресудом усвојен тужбени захтев тужојца	Тијана Живановић, дипл. правник	
22.	Јесетрић Ммоград из Салаш Нођаски	„Покрет горана“ из Сремске Митровице ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад ВД „Сава“ Шабац	П. 3/2017	Основни суд Сремска Митровица	Основ: накнада штете Вредност спора: 250.000,00 дин.	Правноснажном пресудом делимично усвојен тужбени захтев за пл. дуг од 4.481,62 и 1.823,00 дин. зск од 07.12.2018 год. и парнични трошкови 101.885,00 дин.	Радивој Марић Дипл.прав.	



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

6.2 ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ У ТОКУ

Р. БР.	ТУЖИЛАЦ	ТУЖЕНИ	БР. ПРЕДМЕТА	НАДЛЕЖНИ СУД	ПРЕДМЕТ СПОРА	СТАЊЕ ПОСТУПКА	ЗАСТУПАЊЕ	ПРОЦЕНА ИСХОДА
1.	ПП „Колут“ Колут	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 32/19	Виши суд у Сомбору	Основ: накнада штете и исплата тржишне вред. земљишта заузетог системом Плазовић Вредност спора: 521.150,00 € у динарској противвредности на дан исплате са 33К 2010.г. Основ: накнада штете – поплава у 39.798.236,19 дин. са 33К	Донета првостепена пресуда којом се одбија тужбени захтев. Поступак по жалби тужиоца у току.	Игор Ерцег	У корист ЈВП-а
2.	АД „Слога“ Руско Село	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 158/11	Привредни суд у Зрењанину	Основ: накнада штете – поплава у 2010.г. Вредност спора: 39.798.236,19 дин. са 33К	Првостепени поступак у току	Игор Ерцег	У корист тужиоца (делимично)
3.	Макитановић Јован из Кузмина	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 662/11	Основни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете – поплава у 2010.г. Вредност спора: 6.263.867,00 дин. са 33К	Донета првостепена пресуда којом се усваја тужбени захтев. Изјавили смо жалбу, другостепени поступак у току.	Игор Ерцег	У корист тужиоца (делимично)
4.	ЈП „Војводина шуме“ Нови Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 274/2016	Привредни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада за шумско земљиште заузето изградњом насипа Прогар – Кулиново Вредност спора: 26.534.021,08 дин. са 33К	Првостепени поступак у прекиду	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП-а
5.	Есаврић Serbia АД из Беле Цркве	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 117/2019	Привредни суд у Панчеву	Основ: стицање без основа – захтев за враћање накнаде за ододржавање за период 2007.- – 2010.г. Вредност спора: 1.067.864,00 дин. са 33К Основ: накнада штете Вредн. спора: 50.970.927,00	Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев. Другостепеном пресудом делимично преиначена првостепена пресуда у делу стицања без основа и у делу одбијен тужбени захтев а укинута у делу накнаде штете.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца у непресуђеном делу
6.	Даниловић Драшко из Кузмина	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1074/13	Основни суд у Ср. Митровици	Основ: накнада штете – поплава у 2010.г. Вредност спора: 8.573.430,00 дин. са 33К	Првостепеном пресудом делимично усвојен тужбени захтев. Изјавили смо жалбу, другостепени поступак у току.	Игор Ерцег	У корист тужиоца (делимично)
7.	Смиљанић Милан из Руме	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 405/2015	Основни суд Рума	Основ: накнада нематеријалне штете због утапања детета на Боркачком језеру. Вредност спора: 1.000.000,00 дин. са 33К	Првостепени поступак у току	Игор Ерцег	У корист ЈВП-а
8.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ВДП „Шајкашка“ Нови Сад	П. 677/2015	Привредни суд Нови Сад	Основ: накнада штете због крађе струје на чуварици. Вредност спора: 1.107.228,34 дин. са 33К	Првостепени поступак у је у прекиду.	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП-а
9.	Стаменић Мирослав из Ср. Митровице	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	25/2015	Виши суд Сремска Митровица	Основ: накнада штете због поплава у 2014. години. Вредност спора: 5.000.000,00 дин. са 33К	Поступак у прекиду због смрти тужиоца.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
10.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	„4 октобар“ ЈКП Дебељача	П. 1870/15	Привредни суд Нови Сад	Основ: наплата потраживања Вредност спора: 4.126.359,37 дин. са 33К	Донета је првостепена пресуда којом је усвојен тужбени захтев. Другостепеном пресудом усвојена жалба ЈВП. Поступак у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист ЈВП
11.	Пауновић Саша из Оџака	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и др.	П. 1202/18	Основни суд у Сомбору	Основ: накнада штете – поплава у 2015.г. Вредност спора: 1.200.000,00 динара	Првостепени поступак у току	Игор Ерцег	У корист тужиоца (делимично)
12.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	Задружни савез Војводине	П. 766/16	Привредни суд Нови Сад	Основ: наплата потраживања Вредност спора: 4.044.995,10 дин. са 33К	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП делимично
13.	Национални привредни оператер доо Нови Сад	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 1889/15	Привредни суд у Новом Саду	Основ: наплата потраживања – испорука пакета личних података правних лица у РС на превару Вредност спора: 392.000,00 дин. са 33К	Првостепени поступак у у прекиду до окончања кривичног поступка	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП

Р. БР.	ТУЖИЛАЦ	ТУЖЕНИ	БР. ПРЕДМЕТА	НАДЛЕЖНИ СУД	ПРЕДМЕТ СПОРА	СТАЊЕ ПОСТУПАКА	ЗАСТУПАЊЕ	ПРОЦЕНА ИСХОДА
14.	Петровић Светозар	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-67/17	Основни суд у Сремској Митровици	Основ: накнада штете – због пада стабла на чамцац Вредност спора: 90.000,00 динара са 33К	Донета је првостепена пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев на износ од 47.311,64 динара. У току је поступак по жалби ЈВП-а.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП
15.	Талпаи Валерија из Дебелаче	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-374/17	Основни суд у Панчеву	Основ: накнада штете - због плавлена парцела Вредност спора: 1.010.022,00 дин. са 33К	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
16.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ЈП „Електропривреда Србије“ Органак Колубара, Лазаревац	П 981/16	Привредни суд Нови Сад	Основ: тужба ради исплате – коришћење мобилних црпних агрегата у одбрани од поплава Вредност спора: 3.825.866,96 динара	Донета је првостепена пресуда којом је усвојен тужбени захтев. У току је поступак по жалби туженог.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП
17.	ЈП „Путеви Србије“ Београд	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П 703/2017	Привредни суд Нови Сад	Основ: стицање без основа – враћање накнаде за одводњавање наплаћене по решењу ЈВП-а које је поништено Вредност спора: 1.989.295,40 дин. са 33К	Донета је првостепена пресуда којом је одбијен тужбени захтев. у току је поступак по жалби ЈВП-а.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист тужиоца
18.	Бабић Зоран	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П1-74/17	Виши суд Нови Сад	Основ: злостављање на раду	Првостепеном пресудом одбијен тужбени захтев тужиоца. Поступак по жалби у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП
19.	Костић и др	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-1187/14	Основни суд Зрењанин	Основ: поништај уговора	Окончан поступак одбијањем тужбеног захтева. Одбијен захтев тужилаца за понављање правноснажног окончањог поступка.Поступак по жалби у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП
20.	Стечајна маса АД „Семе Тамиш“	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-267/2017	Привредни суд Панчево	Основ: ради утврђења	Првостепеном пресудом делимично усвојен тужбени захтев. Поступак по жалби у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
21.	Вукотић Александар	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-2455/18	Виши суд Зрењанин	Основ: накнада штете	Првостепени поступак у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
22.	Вукотић Милан	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-1615/17	Основни суд Зрењанин	Основ: утврђење права својине	Поступак по жалби у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист тужиоца
23.	ОЗЗ Агро-Петровец	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-767/2018	Привредни суд Нови Сад	Основ: накнада штете Вредност: 2.000.000,00 динара	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист ЈВП
24.	Александар Обрадовић	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-9887/17	Основни суд Нови Сад	Основ: накнада штете Вредност: 300.000,00 динара	Првостепеном пресудом делимично усвојен тужбени захтев у износу од 160.000,00 са 33К од 22.10.2019. године. Поступак по жалби у току.	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
25.	Стојанов Ана	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-71/18	Основни суд Панчево	Основ: накнада штете	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
26.	Аутономна Покрајина Војводине	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-26/19	Основни суд Бечеј	Основ: поништај уговора	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	У корист ЈВП
27.	Тихомир Јовановић	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П-717/19	Основни суд Рума	Основ: накнада штете Вредност спора: 73.995,10 динара	Првостепени поступак у току	Дејана Спасојевић-Иванчић	Делимично у корист тужиоца
28.	Новаковић Петар	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	2П.91/18	Основни суд у Кикинди	Основ: исплата потраживања; Вредност спора: 480.000,00 динара	У току је првостепени поступак.	Игор Ерцег	Делимично у корист тужиоца



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. БР.	ТУЖИЛАЦ	ТУЖЕНИ	БР. ПРЕДМЕТА	НАДЛЕЖНИ СУД	ПРЕДМЕТ СПОРА	СТАЊЕ ПОСТУПКА	ЗАСТУПАЊЕ	ПРОЦЕНА ИСХОДА
29.	Лалић Саболч, Кавило	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	12П.910/17-15	Основни суд у Суботици, Судска јединица у Бачкој Тополи	Основ: утврђење права својине на непокретности; Вредност спора: 2.200.000,00 динара	Донета првостепена пресуда којом је усвојен тужбени захтев, али су ЈВП Воде Војводине ослобођене обавезе плаћања трошкова поступка. Другостепени поступак у току.	Игор Ерцег	У корист тужиоца.
30.	Вотипка Стефан	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	1-6П.583/19	Основни суд у Вршцу, Судска јединица у Белој Цркви	Основ: фактичка експропријација; Вредност спора: 805.300,00 динара	Првостепени поступак у току.	Игор Ерцег	Делимично у корист тужиоца.
31.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	Живковић Бранислав	XXV-36-9-18	Градска управа за имовину и имовинско-правне односе	Основ: иселење из непокретности	Првостепени поступак у току.	Игор Ерцег	У корист ЈВП
32.	Панић Финка	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 87/2017	Основни суд у Бачкој Паланци	Основ: накнада штете Вредност спора: 360.700,37 динара, са 33К од 28.08.2014. године	Првостепени поступак у току	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
33.	Радишић Сава и др.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 334/2017	Основни суд у Зрењанину	Основ: чинида и др. – установљивање права службености на насиљу. Вредност спора: 1000,00 динара	Првостепеном пресудом одбијен тужбени захтев тужилаца. Предмет по жалби враћен првостепеном суду на поновно суђење	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
34.	ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, Огранак „Електродистрибуција Зрењанин“	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 154/2018	Привредни суд у Новом Саду	Основ: исплата (неовлашћена) потрошња електричне енергије Вредност спора: 1.107.228,34 динара са 33К од 30.09.2016. године па до коначне исплате	Првостепеном пресудом одбијен тужбени захтев тужиоца. Поступак по жалби у току.	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
35.	Данијела Андрић	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П. 8680/2019	Основни суд у Новом Саду	Основ: накнада штете Вредност спора: 1.337.947,10 динара, са 33К на износ од 653.813,52 динара од 02.03.2017. године	Првостепени поступак у току	Тијана Живановић, дипл. правник	У корист ЈВП
36.	Шуман Радован Јанковић Радмила Гавриловић Мирјана сви из Купинова	Република Србија, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.233/19	Основни суд у Руми	Основ: утврђење права својине Вредност спора: 200.000,00 динара	Првостепени поступак у току	Радивој Марић дипл.прав.	У корист ЈВП
37.	„Ател“ доо Гај у стечају	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.337/2018	Привредни суд у Панчеву	Основ: утврђење неоснованости пријаве потраживања у стечају Вредност спора: 6.027.024,21 динара	Првостепеном пресудом одбачена тужба, у току поступак по жалби.	Радивој Марић дипл.прав	У корист ЈВП
38.	„Тараш“ доо Тараш у стечају	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.48/2018	Привредни суд у Зрењанину	Основ: утврђење неоснованости пријаве потраживања у стечају Вредност спора: 7.948.251,14 дин	Првостепеном пресудом одбијен тужбени захтев у току поступак по жалби	Радивој Марић дипл.прав	У корист ЈВП
39.	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	ЈП Завод за изградњу града Нови Сад у ликвидацију	П.592/2018	Привредни суд у Новом Саду	Основ: утврђење оспореног потраживања у ликвидацији Вредност спора: 4.280.392,69 динара	Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев у целости, поступак по жалби	Радивој Марић дипл.прав	У корист ЈВП
40.	Марија Раденковић из Ниша	ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад	П.3533/2019	Основни суд Нови Сад	Основ: стицање без основа Вредност спора: 1.469,23 динара	Првостепени поступак у току	Радивој Марић дипл.прав	У корист ЈВП

Прилог бр. 7: Биланс стања на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			План	Реализација
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	47.438.000	46.985.208
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	49.000	45.963
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	49.000	45.963
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	46.707.000	46.103.254
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.700.000	7.613.578
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.900.000	34.573.431
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.900.000	2.647.150
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	7.000	6.162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.200.000	1.262.933
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	677.000	793.216
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	650.000	762.579
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	27.000	30.637
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	5.000	42.775
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	2.200	40.507
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.800	2.268
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	13.500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.222.097	1.772.907
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	367.597	138.556
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	13.260
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.597	3.761
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350.000	121.535
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.000	110.667
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			План	Реализација
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35.000	110.667
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.000	16.635
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800.000	1.479.995
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.500	27.054
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	48.673.814	48.758.332
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	85.000.000	86.790.383
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	41.202.795	41.136.292
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.364.329	14.364.329
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	14.352.168	14.352.168
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	12.161	12.161
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	217	217
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.111	4.111
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29.400.000	29.348.766
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.423	26.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.149	6.400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.649	2.762
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	3.638
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.563.588	2.560.837
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.563.588	2.560.837
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	86.703	122.408
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	86.703	116.775
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	11.000	11.028
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	50.000	84.071
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.000	20.973
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			План	Реализација
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	5.633
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		5.633
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.200.000	4.159.613
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.184.316	3.340.019
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	31.826
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.093	47.615
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	60.000	47.522
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	93	93
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	6.655
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.000	2.152
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.098.173	3.251.720
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	48.673.814	48.758.332
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	85.000.000	86.790.383

Прилог бр. 8: Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2018.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			План	Реализација
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.154.568	4.289.788
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	213.841	103.917
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	213.841	103.917
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.764.727	4.070.701
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	176.000	115.170
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	5.303.618	4.477.419
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		12.994
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		86
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64.212	59.949
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	201.420	213.447
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	725.890	666.022
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.018.223	2.712.019
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	480.000	495.602
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32.000	13.216
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	781.873	330.244
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	149.050	187.631
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	98.500	48.739
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	98.000	48.697
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	42
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	2.271
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	854
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		854
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	89

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2019.	
			План	Реализација
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	1.328
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	97.500	46.468
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	50.000	43.087
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	80.000	3.617
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98.050	152.133
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.000	22.485
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	500	27.955
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		588
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	500	28.543
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	75	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		24.905
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	425	3.638
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Директор
Славко Врнцић, дипл. инж. грађ.
